

REPORTE SEMANAL

PHILIPS

INFORME 02

contract
workplaces

Fecha Reporte	31/08/2017
Proyecto	Adecuación oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º Olivos
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernández

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra de adecuación de oficinas, que será equipada con: 63 puestos operativos (56 en islas de 8 y 7 puestos en una isla de 7), 4 meeting room de 4P, 1 meeting room de 6P, 1 meeting room de 12P, 1 meeting room de 8P, 4 salas Enclosed Worksetting, 3 breakouts space, 1 lounge, 1 coffee point, 1 kitchenette, 1 copy print, 2 sector lockers, 1 storage room, 3 TW 4P La oficina cuenta con 1 IT room, 1 Electric room, 1 WC men, 1 WC woman, 1 WC disable, 4 AC room

FOTOS Y DESCRIPCION



Emplacado 2º cara Enclosed Worksettings y Meeting Rooms + masillado
Instalación de canalizaciones en tabiques



Emplacado 2º cara tabiques Meeting Room + masillado
Instalación de canalizaciones en tabiques

Emplacado 2º cara tabiques Meeting Room + masillado
Instalación de canalizaciones en tabiques



Canalizaciones en tabiques de Meeting Rooms y colocación de refuerzos de madera

Canalizaciones en tabiques de Storage y colocación de refuerzos de madera

REPORTE SEMANAL

PHILIPS

INFORME 02

contract
workplaces

Fecha Reporte	31/08/2017
Proyecto	Adecuación oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º Olivos
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernández




Emplacado 2º cara tabiques Meeting Room



Emplacado 2º cara - colocación de aislaciones - instalación de refuerzos para Tv
Instalación de canalizaciones en tabique de recepción



Armado de nichos para iluminación en recepción

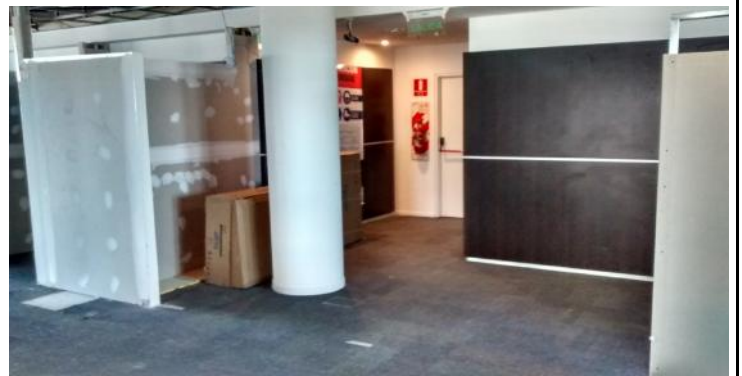

Masillado de tabiques Meeting Rooms y Tabique Lockers

REPORTE SEMANAL



INFORME 02



Fecha Reporte	31/08/2017
Proyecto	Adecuación oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º Olivos
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernández

TAREAS RELEVANTES EN CURSO Y PROXIMA SEMANA

Ítem	Detalle	Responsable
1	Continúa emplacado de tabiques 2º cara y masillado	Contract
2	Se realizó reunión de coordinación semanal (24/08/2017)	Contract/Turner & Townsend
3	Se programa para la próxima semana tareas de pintura	Contract
4	Continúa tendido de canalizaciones	Contract
5	Se demora armado de estructura de cielorrasos por interferencia con Rociadores	Contract
6		

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Envío de artefactos de iluminación	31/08/2017	Demora colocación	Philips
	Envío de equipamiento de línea	20/09/2017		Philips
	Envío de orden de compra	vencido	Demora pagos en curso y contrataciones	Philips
	Compras demoradas - Sujetas a ítem 3 de cronograma	vencido	Reprogramación de tareas por demora en compras	Contract / Philips
