





INFORME 5	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	
Fecha Reporte 26 de Junio de 2017 PROYECTO PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER UBICACIÓN Av. Corrientes 1516 Contacto Cliente: Gonzalo Slobozian Superficie 1132 m2		
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°		
2) FOTOS Y DESCRIPCION		
Cuarto piso.		
		
Obra civil: pared + zócalo para asiento de receptaculo. Reparaciones generales en oficina de recursos generales. Colocacion de revestimientos en baños		
		
Cieloraso de placa de roca de yeso: Cieloraso con buña en baño de hombres y mujeres. Ajustes en oficina de recursos humanos		
Tercer piso.		
		
Obra civil: Colocación de revestimientos en baño de mujeres.		
		
Instalación eléctrica: Tendido de UTP para todos los puestos nuevos, canalización mas cableado nuevo en sector baños, armado de rack con colocación pacheras nuevas.		
		
Pintura: reparaciones generales en oficina, masillado y enduido en comedor.		
		
Nivelación de piso técnico: nivelación general de piso técnico.		




Alfombra: instalación de alfombra en oficinas.

3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Instalación Sanitaria			Ante la negativa por parte del cliente de la propuesta para hacer el recambio en el tendido sanitario, existen determinados imponderados que son imposibles de dejar de lado. Para lo cual se va a presentar un nuevo presupuesto acompañado por un informe 5 que lo que transmite al cliente son determinadas modificaciones que son imposibles no realizar.	CONTRACT / PRISMA MEDIOS DE PAGO
2	Obra Civil			Se finalizará con la colocación de solados y revestimientos en 4to piso. Se realizará carpeta hidrofuga y revoques nuevos en baño de hombres.	
3	Instalación Sanitaria			Se aguarda definición de PRISMA MEDIOS DE PAGO, para continuar con la instalación en 3er piso	
4	Instalación Eléctrica			Se armarán los puestos nuevos el día martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de Junio, para poder certificarlos para la semana siguiente.	
5	Piso vinílico			Se colocará el piso vinílico en sector de enfermería.	
6	Zócalos			Se colocarán los zócalos en 4to piso y 3ro.	
7	Pintura			Se realizarán trabajos de Enduido y masillado en 3ro y 4to piso, junto con pintura de paredes en sector de oficinas, finalización de trabajos en 4to piso. Y trabajos en fin de semana en comedor para finalizar tareas.	
8	Armado de puestos nuevos			Se armarán los puestos nuevos el día martes 27 de Junio	

4) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	22-may	0%	0%
1	29-may	3%	2%
2	05-jun	12%	12%
3	12-jun	33%	25%
4	19-jun	55%	47%
5	26-jun	73%	56%
6	03-jul	93%	
7	10-jul	100%	

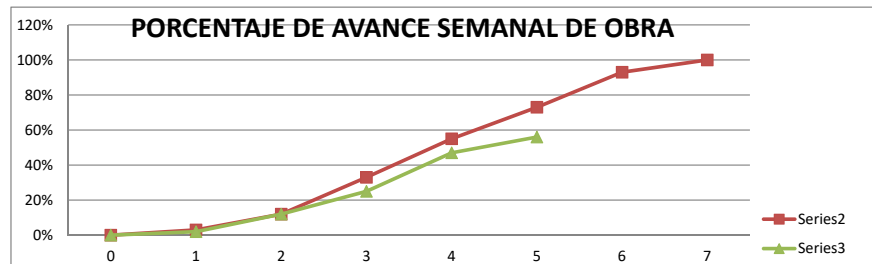

Nota: el avance real se ve afectado hasta tanto no se pueda avanzar con la instalación sanitaria

FIN DEL DOCUMENTO
