


INFORME 6	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	contract workplaces
Fecha Reporte 3 de Julio de 2017 PROYECTO PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER UBICACIÓN Av. Corrientes 1516 Contacto Cliente: Gonzalo Slobozian Superficie 1132 m2		
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°.2°,3°,4°		
2) FOTOS Y DESCRIPCION		
Cuarto piso.		
		
Obra civil: finalización de colocación en baño de caballeros, avance hasta conexión nueva de agua, dejando lugar para nueva acometida.		
		
Pintura: Pintura general de todos los ambientes, con masillado y Enduido más con dos manos de pintura en paredes. Dos manos de pintura sintética en carpinterías de metal.		
		
Iluminación y Electricidad: Colocación de tomas y teclas, junto con las nuevos plafones entregados por el Comitente		
Tercer piso.		
		
Obra civil: Colocación de revestimientos y colocación en baño de mujeres junto con carpeta hidrófuga y revoques en baño de hombres.		
		
Instalación eléctrica y cableado estructurado: Tendido y colocación de todos los puestos en oficinas (2 UTP, 2 TE, 2 TN por puesto) . Finalización de trabajos en baños y sector comedor.		
		
Pintura: Masillado y Enduido Y pintura en paredes y carpinterías de metal en sector de oficinas. Enduido y pintado de tabiques y carpinterías en sector comedor.		




Limpeza final: limpieza del sector oficinas.

3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516- TAREAS PREVISTAS SEMANA 3 Al 8 Julio

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Instalación Sanitaria			Ante la negativa por parte del cliente de la propuesta para hacer el recambio en el tendido sanitario, existen determinados imponderados que son imposibles de dejar de lado. Para lo cual se va a presentar un nuevo presupuesto acompañado por un informe 6 que lo que transmite al cliente con determinadas modificaciones imprescindibles de realizar.	CONTRACT / PRISMA MEDIOS DE PAGO
2	Obra Civil			Se continuará con la colocación en piso 3°, terminando con el baño de damas y continuando con el baño de hombres, una vez finalizados los trabajos anexos (anteriormente mencionados) de instalación sanitaria.	
3	Instalación Sanitaria			Se aguarda definición de PRISMA MEDIOS DE PAGO, para continuar con la instalación en 3er piso. Se adjunta informe Anexo Sanitario n°2 y presupuesto para aprobación de Prisma.	
4	Instalación Eléctrica			Certificación de puestos de oficinas, rotulado de puestos, terminaciones piso 3.	
5	Piso vinílico			Se colocará el piso vinílico en sector de enfermería.	
6	Zócalos			Se finalizará con el sector de enfermería.	
7	Pintura			Se finalizará los retoques en sector comedor, se pintará enfermería y sector de depósito de sistemas. Terminaciones generales en 4° piso	
8	Mesadas de Marmol			Colocación de mesadas en baños 4° y 3°.	
9	Vidrios			Colocación de mamparas y espejos en baños de 4° y 3°.	

4) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	22-may	0%	0%
1	29-may	3%	2%
2	05-jun	12%	12%
3	12-jun	33%	25%
4	19-jun	55%	47%
5	26-jun	73%	56%
6	03-jul	85%	71%
7	10-jul	100%	

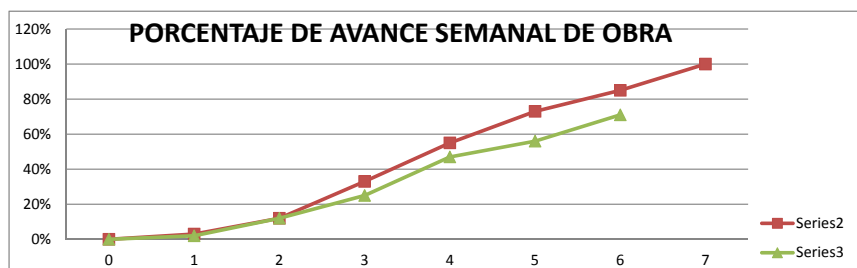

Nota: el avance real se ve afectado hasta tanto no se pueda avanzar con la instalación sanitaria

FIN DEL DOCUMENTO
