



INFORME 7	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	
Fecha Reporte 10 de Julio de 2017 PROYECTO PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER UBICACIÓN Av. Corrientes 1516 Contacto Cliente: Gonzalo Slobozian Superficie 1132 m2		
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°, 2°, 3°, 4°		
2) FOTOS Y DESCRIPCION		
Cuarto piso.		
		
Obra civil: colocación de estructura porta termo tanque, colocación de pre marco para ventana del sector.		
		
Pintura. terminaciones generales.		
		
Iluminación y Electricidad: Colocación de puesto en oficina de recursos humanos.		
Tercer piso.		
		
Obra civil: Colocación de revestimientos y colocación en baño de hombres junto con terminaciones y pastina en baño de mujeres.		
		
Instalación eléctrica y cableado estructurado: Tendido y colocación de puesto de enfermería y deposito de sistemas más certificación de todos los puestos de 3° y 4°		
		
Pintura: preparación de paredes más pintado en, enfermería sector de acopio de sistemas y baño de mujeres. Retoques generales en sector comedor.		



Limpieza final: limpieza general más ubicación de cajoneras en cada puesto.

HITOS Y DEADLINES


Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	Entrega pisos 1 y 2 libres de ocupación	15/07/2017		Prisma tiene programada mudanza sab. 15 julio	PRISMA
	Inicio etapa 2 (pisos 1 y 2)	17/07/2017	26/09/2017	La etapa 2 según cronograma iniciaba lun 10 julio, se evaluará la posibilidad de recuperar la semana de desfasaje en el inicio de manteniendo entrega provisoria 26 sept.	CONTRACT

3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516

Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
1	Instalación Sanitaria			Dada la aceptación de PRISMA CALL CENTER, el día viernes 7 del Julio, desde el día lunes 10 de Julio se comenzará con los adicionales presentados.	CONTRACT
2	Obra Civil			Se continuará con la colocación en piso 3°, terminando con el baño de hombres, una vez finalizados los trabajos de instalación sanitaria del adicional.	
3	Instalación Sanitaria			Se comenzará a trabajar en todos los trabajos del adicional presentado.	
4	Instalación Eléctrica			Colocación de cajas nuevas en sector comedor y baño de hombres en 3° piso.	
5	Piso vinílico			Se colocará el piso vinílico en sector de enfermería.	
6	Zócalos			Se finalizará con el sector de enfermería.	
7	Pintura			Se finalizará los retoques en sector enfermería y sector de guardado de sistemas, se pintará el baño de hombres. Terminaciones generales en 4° piso,	
8	Mesadas de Mármol			Colocación de mesadas en baños	
9	Vidrios			Colocación de espejos en baños de 4° y 3°.	

4) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	22-may	0%	0%
1	29-may	3%	2%
2	05-jun	12%	12%
3	12-jun	33%	25%
4	19-jun	55%	47%
5	26-jun	73%	56%
6	03-jul	85%	71%
7	10-jul	100%	85%
8	17-jul		

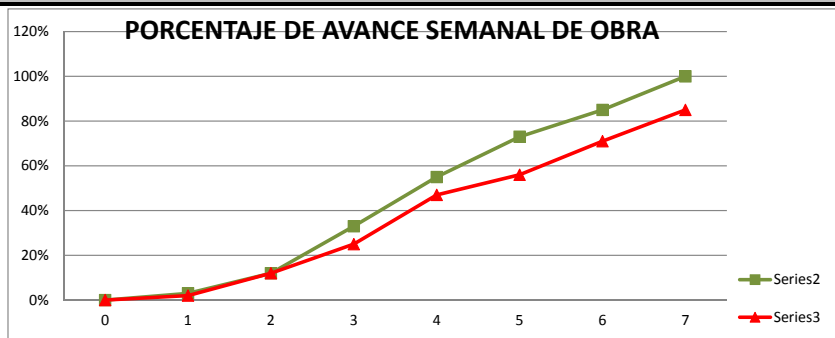

Nota: el desfasaje está dado por los trabajos referentes a la instalación sanitaria, aprobados el viernes 7.

FIN DEL DOCUMENTO
