



INFORME 1		REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		contract workplaces	
Fecha Reporte: 18 de Junio de 2017					
PROYECTO		PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER			
UBICACIÓN		Av. Corrientes 1516			
Contacto Cliente:		Gonzalo Slobozian			
Superficie		1132 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
Primer y Segundo piso.					
					
Se comienzan tareas de revoque en baños					
					
Se realiza adecuación de instalación sanitaria para mochilas, se colocan desplazadores de inodoros, la instalación sanitaria para minitorios se					
					
Se termina el 100% de las tareas de demolición.					
					
Se avanzan tareas de desmonte de instalaciones existentes bajo piso.					
3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516					
Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1					
TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA					
Status	Rubros			Comentarios	Responsable
4	Obra Civil			terminar tareas de revoques en baños	N4

5	Obra Civil			Realizar carpeta en baños	N4
6	Instalación Eléctrica			canalizaciones en paredes de mampostería y tabiques.	SIMEC
7	Durlok			Ejecución de estructuras y empaque de primera cara	Hr
8	Pintura			Comenzar tareas de preparación en carpinterías y tabiques existentes.	Ghalu.

4) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	04-ago	0%	0%
1	11-ago	3%	3%
2	18-ago	12%	
3	25-ago	33%	
4	01-sep	55%	
5	08-sep	73%	
6	15-sep	93%	
7	22-sep	100%	

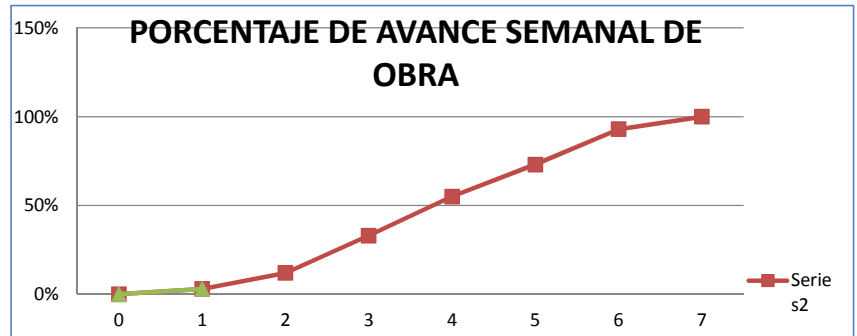

Nota: el avance real se ve afectado por la definición de la instalación sanitaria. A partir de esta semana se retoma el plan original.

FIN DEL DOCUMENTO
