

INFORME 1	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	contract workplaces
------------------	--	--------------------------------

Fecha Reporte	18 de Agosto de 2017
PROYECTO	PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER
UBICACIÓN	Av. Corrientes 1516
Contacto Cliente:	Gonzalo Slobozian
Superficie	1132 m2

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°

2) FOTOS Y DESCRIPCION

Primer y Segundo piso.



Se realiza limpieza de bandejas ,y se avanza con cableado eléctrico, mas datos en piso 1.



Se realiza limpieza de bandejas ,y se avanza con cableado eléctrico, mas datos en piso 1.



Se avanza con revoques y carpeta en baños.



Se elevan tabiques en durlok y se masilla para recibir pintura.



Se elevan tabiques en durlok y se masilla para recibir pintura.


3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
--------	--------	--	--	-------------	-------------

1					
TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA					
Status	Rubros			Comentarios	Responsable
4	Obra Civil			Comenzar instalación de cerámicos en baños.	N4
5	Obra Civil			limpieza de obra y carga de volquetes.	N4
6	Instalación Eléctrica			Finalizar canalizaciones bajo piso.	SIMEC
8	Pintura			Realizar pintura de primera mano en piso 1.	Ghalu.

4) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	31-jul	0%	0%
1	07-ago	3%	20%
2	14-ago	12%	32%
3	21-ago	33%	66%
4	28-ago	55%	
5	04-sep	73%	
6	11-sep	93%	
7	18-sep	100%	

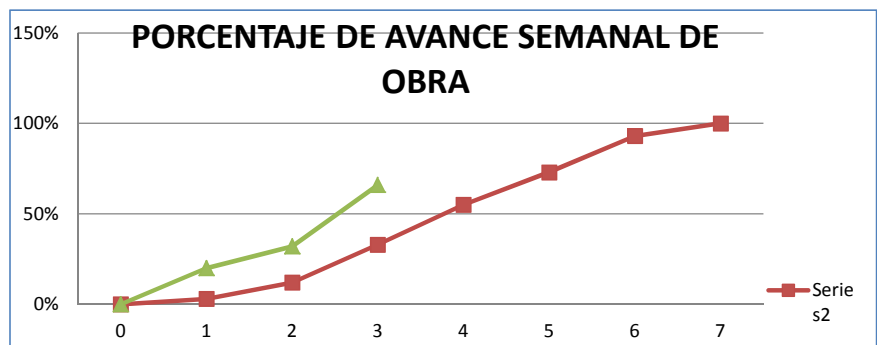

Nota: el avance real se ve afectado por la definición de la instalación sanitaria. A partir de esta semana se retoma el plan original.

FIN DEL DOCUMENTO
