

INFORME 4	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	contract workplaces
------------------	--	--------------------------------

Fecha Reporte	25 de Agosto de 2017	
PROYECTO	PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER	
UBICACIÓN	Av. Corrientes 1516	
Contacto Cliente:		
Superficie	1132 m2	

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°

2) FOTOS Y DESCRIPCION

Primer y Segundo piso.



Se avanza con revoques y carpetas .



Se comienza colocación de revestimiento en baños.



Se comienzan colocación de frentes vidriados.



Se comienza colocación de alfombras en el piso 1.

3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1					


TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
--------	--------	--	--	-------------	-------------

4	Mesadas en mármol			Medir mesadas.	Calello
5	Obra Civil			limpieza de obra y carga de volquetes.	N4
6	Obra Civil			Finalizar revestimiento en baños.	SIMEC
	Mobiliario de línea			Entrega piso 1.	Línea K
	Electricidad			Cableado de mobiliario.	Simec
8	Pintura			Realizar pintura de primera mano en piso 2.	Ghalu.

4) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	31-jul	0%	0%
1	07-ago	3%	20%
2	14-ago	12%	32%
3	21-ago	33%	66%
4	28-ago	55%	68%
5	04-sep	73%	
6	11-sep	93%	
7	18-sep	100%	

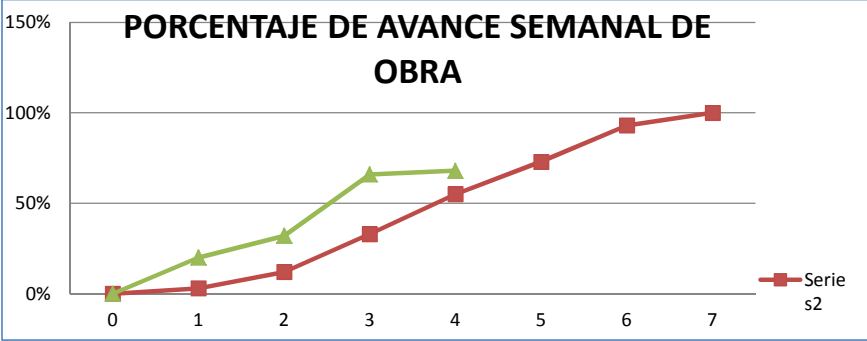

FIN DEL DOCUMENTO
