

|                  |                                          |                                |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>INFORME 5</b> | <b>REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA</b> | <b>contract<br/>workplaces</b> |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------|

|                   |                                     |  |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| Fecha Reporte     | 1 de Septiembre de 2017             |  |
| PROYECTO          | PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER |  |
| UBICACIÓN         | Av. Corrientes 1516                 |  |
| Contacto Cliente: |                                     |  |
| Superficie        | 1132 m2                             |  |

### 1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°

### 2) FOTOS Y DESCRIPCION

Primer y Segundo piso.



Se avanza con armado de puestos de trabajo



Se avanza con armado de puestos de trabajo en piso 1



Se Finaliza colocación de frentes vidriados.



Se avanza colocación de revestimientos cerámicos en baños.

### 3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516

| Status | Rubros |  |  | Comentarios | Responsable |
|--------|--------|--|--|-------------|-------------|
| 1      |        |  |  |             |             |
|        |        |  |  |             |             |


### TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA

| Status | Rubros |  |  | Comentarios | Responsable |
|--------|--------|--|--|-------------|-------------|
|--------|--------|--|--|-------------|-------------|

|   |                         |  |  |                                       |               |
|---|-------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Obra Civil              |  |  | Colocación de revestimientos          | N4            |
| 2 | Mesadas de mármol       |  |  | Instalación de mesadas                | Calello hnos. |
| 3 | Prisma                  |  |  | Entrega de mobiliario piso 2          | Prisma        |
| 4 | Colocación de alfombras |  |  | Terminar colocación piso 2            | FyG           |
| 5 | Electricidad            |  |  | Cableado de mobiliario, de piso 1.    | Simec         |
| 6 | Obra Civil              |  |  | Instalación de artefactos sanitarios. | N4            |

#### 4) AVANCE

| SEMANA | SEMANA | PREVISTO | REAL |
|--------|--------|----------|------|
| 0      | 31-jul | 0%       | 0%   |
| 1      | 07-ago | 3%       | 20%  |
| 2      | 14-ago | 12%      | 32%  |
| 3      | 21-ago | 33%      | 66%  |
| 4      | 28-ago | 55%      | 68%  |
| 5      | 04-sep | 73%      | 77%  |
| 6      | 11-sep | 93%      |      |
| 7      | 18-sep | 100%     |      |

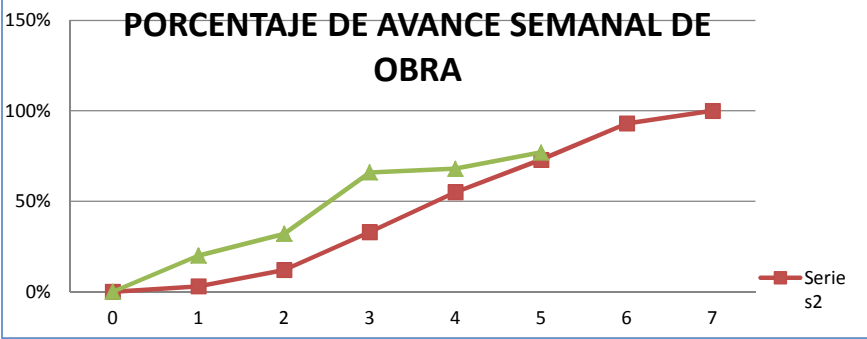

FIN DEL DOCUMENTO
