

INFORME 6	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	contract workplaces
------------------	--	--------------------------------

Fecha Reporte	8 de Septiembre de 2017	
PROYECTO	PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER	
UBICACIÓN	Av. Corrientes 1516	
Contacto Cliente:		
Superficie	1132 m2	

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°

2) FOTOS Y DESCRIPCION

Primer y Segundo piso.



Se avanza con colocación de ménsulas y pastina en baños



Se avanza con armado de puestos de trabajo en piso 2



Se reciben artefactos sanitarios.

3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1					


TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Obra Civil			Colocación de revestimientos	N4
2	Mesadas de mármol			Instalación de mesadas	Calello hnos.
3	Cableado y certificación de puestos.			Entrega de mobiliario piso 2	Simec

4	Colocación de alfombras			Terminar colocación piso 2	FyG
5	Electricidad			Cableado de mobiliario, de piso 1.	Simec
6	Obra Civil			Instalación de artefactos sanitarios.	N4

4) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	31-jul	0%	0%
1	07-ago	3%	20%
2	14-ago	12%	32%
3	21-ago	33%	66%
4	28-ago	55%	68%
5	04-sep	73%	77%
6	11-sep	93%	84%
7	18-sep	100%	

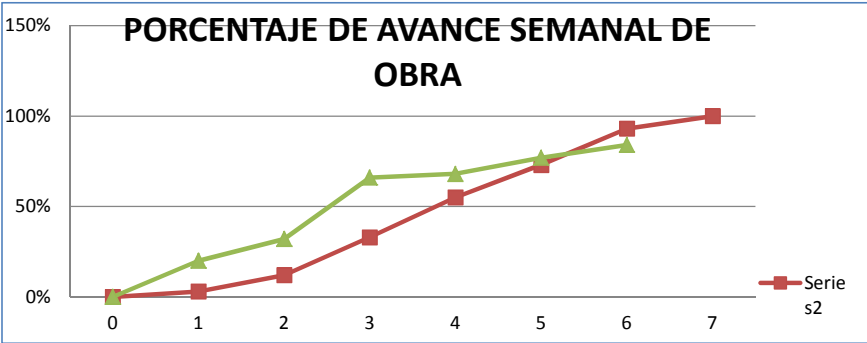

FIN DEL DOCUMENTO
