

INFORME 7	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	contract workplaces
------------------	--	--------------------------------


Fecha Reporte	15de Septiembre de 2017	
PROYECTO	PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER	
UBICACIÓN	Av. Corrientes 1516	
Contacto Cliente:	Gonzalo Slobocian	
Superficie	1132 m2	

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°

2) FOTOS Y DESCRIPCION

Primer y Segundo piso.



Se posicionan puestos de trabajo y cajoneras



Se avanza con armado de puestos y limpieza final



Se certifican puestos y colocan vertebras.

3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516


Status	Hitos			Comentarios	Responsable
	Firma recepción Provisoria Etapa 1 (pisos 3 y 4)	24/07/2017			Contract
	Firma recepción definitiva Etapa 1 (pisos 3 y 4)	07/09/2017		Demora dada por ausencia y posterior cambio de DO y enfocar en inicio recuperar tiempo Etapa 2 en curso (+ disponibilidad de cliente)	Contract
	Revisión interna	15/09/2017		Se realizó junto con levantamiento de pendientes.	Contract
	Recepción Provisoria	21/09/2017			
	Recepción Definitiva	05/10/2017		Confirmar fecha de mudanza del cliente	

4) TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Obra Civil			Colocación de revestimientos	N4
2	Frentes vidriados			Cambio de espejo	Im cristales
3	Electricidad			Cambio de artefactos en baños (A proveer por el cliente)	Prisma / Simec
4	Pintura			Pintura en baños.	Ghalu
5	Zócalos			Colocación de zócalos de MDF	FYG
6	Instalación sanitaria			Colocación de artefactos sanitarios.	N4

5) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	31-jul	0%	0%
1	07-ago	3%	20%
2	14-ago	12%	32%
3	21-ago	33%	66%
4	28-ago	55%	68%
5	04-sep	73%	77%
6	11-sep	93%	84%
7	18-sep	100%	95%

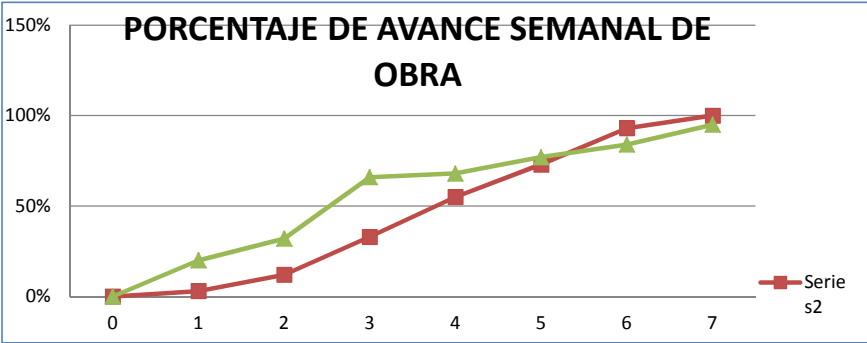

FIN DEL DOCUMENTO
