

REPORTE SEMANAL

PHILIPS

INFORME 07


contract
workplaces

Fecha Reporte	12/10/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra de adecuación de oficinas, que será equipada con: 63 puestos operativos (56 en islas de 8 y 7 puestos en una isla de 7), 4 meeting room de 4P, 1 meeting room de 6P, 1 meeting room de 12P, 1 meeting room de 8P, 4 salas Enclosed Worksetting, 3 breakouts space, 1 lounge, 1 coffee point, 1 kitchenette, 1 copy print, 2 sector lockers, 1 storage room, 3 TW 4P - La oficina cuenta con 1 IT room, 1 Electric room, 1 WC men, 1 WC woman, 1 WC disable, 4 AC room

FOTOS Y DESCRIPCION

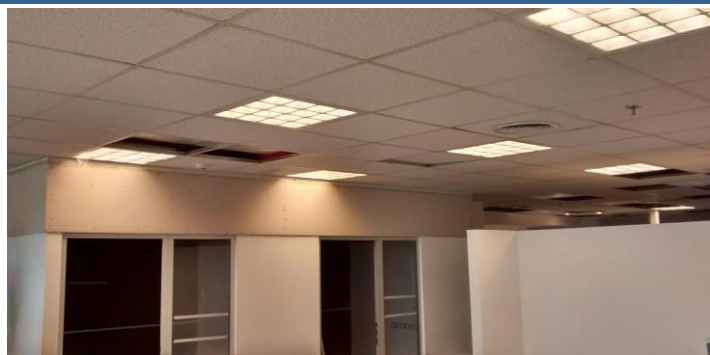

Cierre de tabiques sobredintel
Colocacion de refuerzos para frentes de cristal



Cierre de tabiques sobredintel



Cierre de tabiques sobredintel
Colocacion de frente de cristal en recepcion



INFORME 07



Fecha Reporte	12/10/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez



Cierre de tabiques sobredintel



Instalacion de muebles Lockers

REPORTE SEMANAL



INFORME 07



Fecha Reporte	12/10/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

TAREAS RELEVANTES EN CURSO Y PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Finaliza colocacion de cielorrasos desmontables	Contract
2	Continua colocacion de artefactos de iluminacion	Contract
3	Se instala cristal extraclear	Contract
4	Se realizó reunion de coordinacion semanal (12/10/2017)	Contract/Turner & Townsend
5	Continuan tareas de pintura en tabiques	Contract
6	Finaliza armado de puestos de trabajo - a la espera de muebles	Contract / PHILIPS
7	Inician tareas de parches de alfombra	Contract
8	Continua colocacion de zocalos	Contract
9	Continua cableado de puestos de trabajos	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Se reprograma finalizacion de obra por cierre de tabiques	23/10/2017		Contract
	Envio de diseños de Brandings y cartelerias	Vencido	Se envia a produccion grafica Manifiesto	Philips
	Envio de equipamiento de línea	27/9/2017	Comienza el armado el 27/09	Philips
