

Nombre Proyecto	Remodelación Oficina El Bosque 500, piso 7	Fecha	27-ago-12
Objetivo del Proyecto	Remodelación de un sector de la oficina del piso 7, de aprox. 365m2, para reubicar puestos de trabajo de la oficina del edificio Pacífico.	Preparado por:	Contract
Alcance del Proyecto	Demolición del sector a intervenir, tabiques de volcánita, vidrios y revestimientos de la oficina actual. Se realizarán 8 oficinas cerradas, 1 sala de reuniones para 10 personas, 1 sala de reuniones para 4 personas, 4 puestos ejecutivos tipo workstation, 2 nuevos baños, 1 file, y remodelación de baños existentes y kitchenette.	Reporte N°	6
Status del Proyecto	Nuevo tabique sala contigua a la sala de reuniones fue levantado en volcánita y cielos de la sala ajustados según último layout aprobado. Baños principales revestidos, grilla de cielorraso americano armada, instalaciones de eléctrica, extinción y clima avanzadas.	Status:	57,29%

Area = 365 m2

N° trabajadores= 14

Cronograma			
HITOS DEL PROYECTO	Duración	Comienzo	Fin
TRABAJOS PRELIMINARES	6 días	17-jul-12	24-jul-12
DEMOLICIÓN	9 días	17-jul-12	26-jul-12
TABIQUERIA DE VOLCOMETAL	18 días	24-jul-12	13-ago-12
CIELOS, VIGAS Y CENEFAS	21 días	03-ago-12	27-ago-12
PINTURA	34 días	27-jul-12	04-sep-12
ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO	45 días	20-jul-12	10-sep-12
SISTEMA DE CONTROL	37 días	28-jul-12	08-sep-12
CLIMA	39 días	20-jul-12	03-sep-12
SEGURIDAD	29 días	06-ago-12	07-sep-12
INSTALACIÓN SANITARIA	28 días	02-ago-12	03-sep-12
PAVIMENTOS	12 días	14-ago-12	27-ago-12
GUARDAPOLVO	5 días	28-ago-12	01-sep-12
TABIQUERIAS DE CRISTAL	14 días	18-ago-12	04-sep-12
PUERTAS	7 días	18-ago-12	27-ago-12
MOBILIARIO ESPECIAL	3 días	28-ago-12	30-ago-12
ASEO DE OBRA	4 días	06-sep-12	10-sep-12
ENTREGA DE OBRA	0 días	10-sep-12	10-sep-12
TOTAL	56 días	17-jul-12	10-sep-12

Hitos de la semana

Se definió nueva oficina gerente general, tabique de cierre y cielorraso.

Se definió ubicación panel madera con logo (en tabique en hall)

Se definió papel mural, tipo cortinas rollers, lustre de madera.

Avance de obra

Modificaciones oficina gerente general

Se habilitó baño mujeres

Revestimiento baños

Preparación pintura

Grilla de cielo americano

Proceso de Compras

según archivo adjunto

Objetivos próxima semana

Objetivos según cronograma

Avance de obra

Palmetas cielo americano

luminarias

alfombra modular

perfiles de cristales

Proceso de Compras

según archivo adjunto

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO:

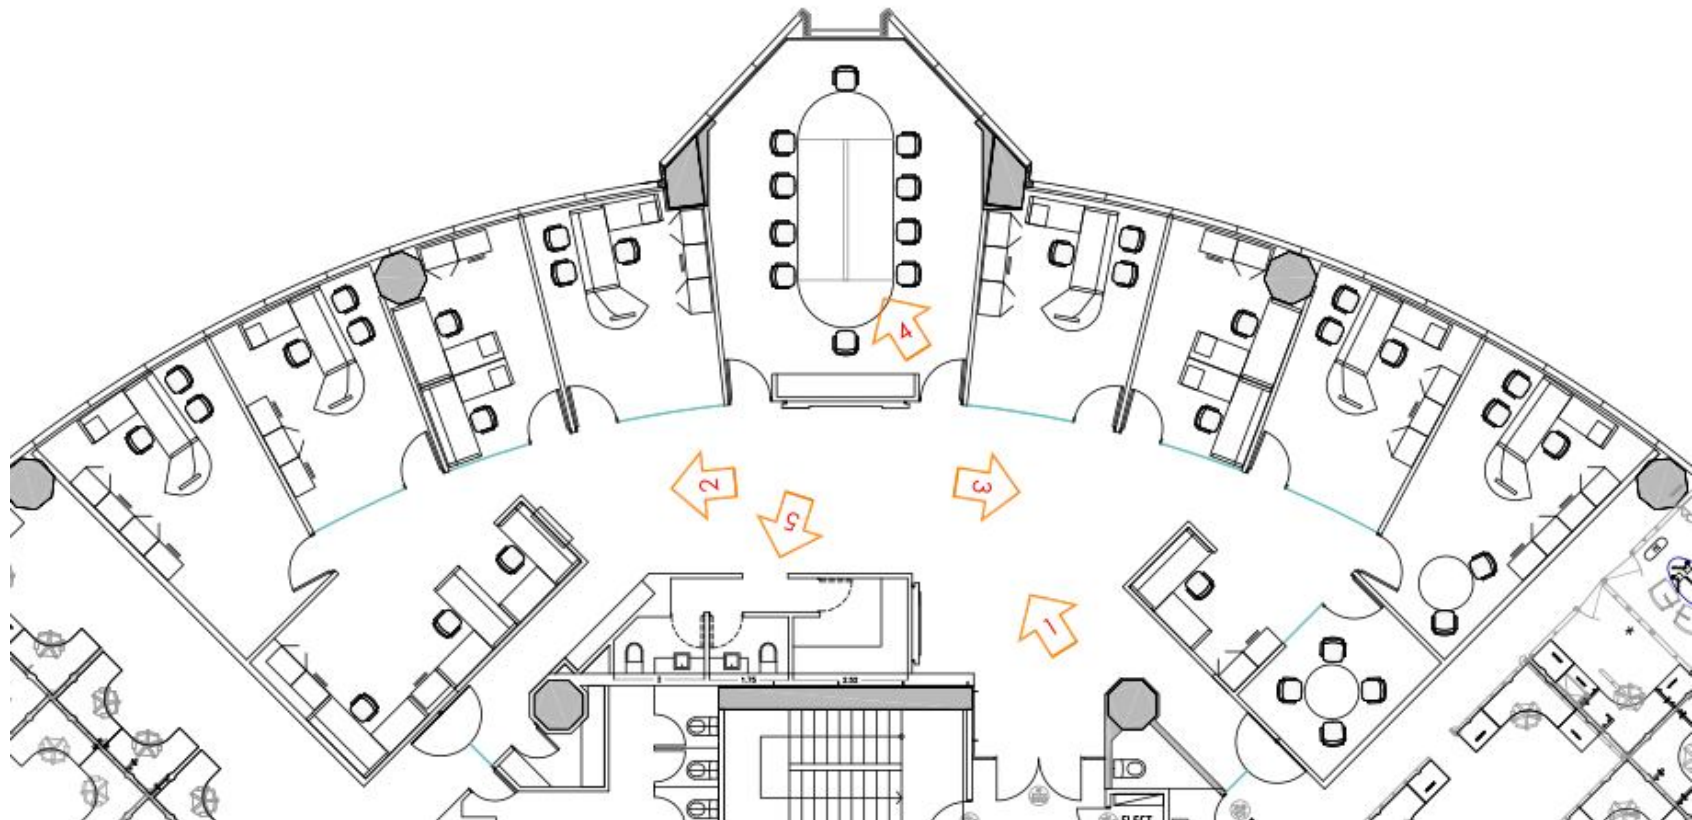




FOTO 1 – VISTA TABIQUE SALA DE REUNIONES



FOTO 2 – VISTA LATERAL IZQUIERDO



FOTO 3 – VISTA LATERAL DERECHO



FOTO 4 – VISTA PROA



FOTO 5 – VISTA ACCESO BAÑOS
