

REPORTE SEMANAL



INFORME 02



PEPSICO

Fecha Reporte	25/11/2016
Proyecto	Nuevas Oficinas PepsiCO
Ubicación	Cazadores de Coquimbo 2860. Vte Lopez.
Contacto Cliente:	Clara Quirno - Clara Dranco

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 3º de edificio Urbana 2
Se distribuyen 151 puestos operativos en Open Plan , se amplía el Coffee, Se agrega un mingitorio y una pileta en cada mesada en Sanitarios. Se agregan 2 cabinas telefónicas en sector Open lado Saenz Peña, se reorganizan todos los privados del sector de gerencia. Se reacondiciona el Server. Se agregan 3 cabinas telefonicas + 3 meetings informales en Open lado Ricardo Gutierrez.

FOTOS Y DESCRIPCION

Open listo p/coloc + renivelación de p. técnico	Reacondicionamiento para mesada c/ 4 piletas	Reacondicionamiento para 4 mingitorios
Piso técnico en plena etapa de desmonte	Acopio de equipamiento anterior en office lindero	Piso técnico en plena etapa de desmonte

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Desmonte de piso técnico
2	Mudanza de equipamiento a office lindero
3	Desmonte de vieja recepción
Item	Detalle de eventos especiales
1	Reiteramos el pedido de retiro de caja fuerte de la Sala de Reuniones detrás de la Recepción
2	Reiteramos el pedido de retiro de los equipos acopiados en sala lindera a recepción para poder terminar de desmontar
3	el porcentaje de avance de obra está demorado por el tardío ingreso de algunos gremios pero el mismo se va a normalizar en los próximos informes


TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Acopio de piso técnico nuevo	CONTRACT
2	Ajuste de bandejas por debajo de piso técnico a nuevo layout	CONTRACT
3	Ajuste de conductos AA según nuevo layout	CONTRACT
4	Desmonte de paneles divisorios y ejecución de cerramiento con Durlock para reemplazarlos.	CONTRACT
5	Desmonte de cielorraso y recolocación según nuevo layout	CONTRACT
6	Armado de cabinas telefónicas según nuevo layout	CONTRACT
7	Limpieza general	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	Reunión con IT	sin fecha	Coordinar tareas relacionadas al cableado estructurado	PEPSICO
2	Reunión con clientes	sin fecha	Definición de tipo de equipamiento para puestos	PEPSICO

5) AVANCE

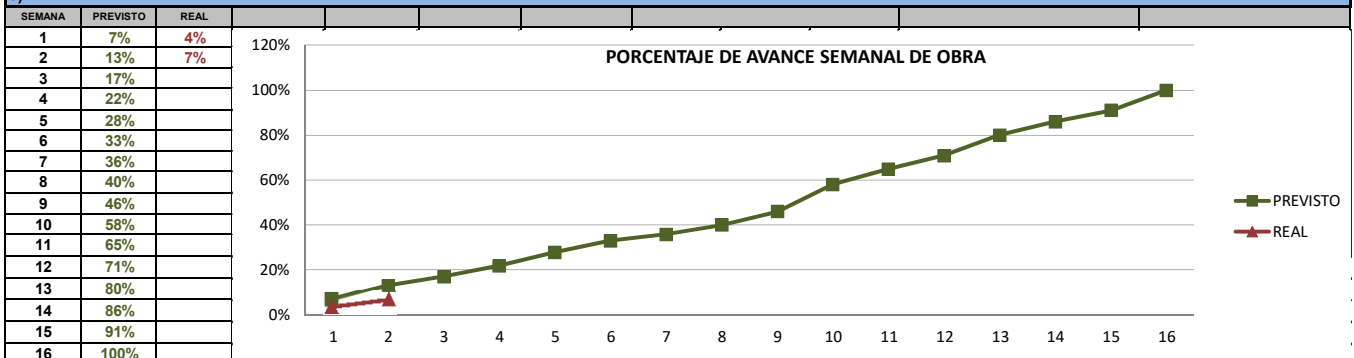

FIN DEL DOCUMENTO
