

REPORTE SEMANAL

contract
workplaces

INFORME 05



PEPSICO

Fecha Reporte	19/12/2016
Proyecto	Nuevas Oficinas PepsiCO
Ubicación	Cazadores de Coquimbo 2860. Vte Lopez.
Contacto Cliente:	Clara Quirno - Clara Dranco

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 3º de edificio Urbana 2
Se distribuyen 151 puestos operativos en Open Plan , se amplía el Coffee, Se agrega un mingitorio y una pileta en cada mesada en Sanitarios. Se agregan 2 cabinas telefónicas en sector Open lado Saenz Peña, se reorganizan todos los privados del sector de gerencia. Se reacondiciona el Server. Se agregan 3 cabinas telefonicas + 3 meetings informales en Open lado Ricardo Gutierrez.

FOTOS Y DESCRIPCION




Agua bajo piso técnico: motivo de demoras



Tesorería



Privados detrás de recepción

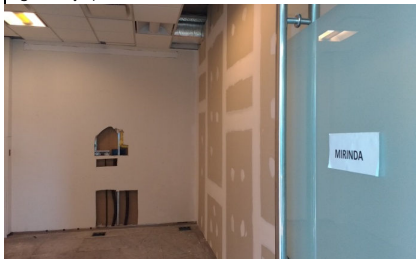

Sala Mirinda



Sector cabinas lado Saenz Peña



Cableado completo circ. Tomas

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Refuerzos para TV's según plano en privados + empaque de segunda cara en tabiques + encintado y masillado.
2	Armado de nuevo cielorraso en Recepción y privados
3	Inicio armado de nueva recepción
4	Cableado de circuitos en privados y puestos en Open
5	Ajuste de conductos AA a nuevo layout
6	Limpieza general
Item	Detalle de eventos especiales
1	El haber frenado la obra durante algunos días generó la casi total pérdida de la semana. Se retomó con plantel completo el lunes 19.12
2	Vuelvo a pedir que se defina el destino de la caja fuerte en el área de Recepción.


TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Recepción de tabiques e inicio de tareas de pintura	CONTRACT
2	Cableado de circuitos de iluminación	CONTRACT
3	Armado de cielorraso desmontable en sector Open	CONTRACT
4	Cableado de cable estructurado + armado de nuevo tablero	CONTRACT
5	Recolocación de difusores en nuevo cielorraso desmontable	CONTRACT
6	Recolocación de artefactos de iluminación en nuevo cielorraso desmontable	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	Agua debajo de piso técnico	12.12.16	Obra parada por 3 días. Se retomaron algunas tareas el día jueves 15.12	PEPSICO
2	Reunión con IT	sin fecha	Coordinar tareas relacionadas al cableado estructurado	PEPSICO

5) AVANCE

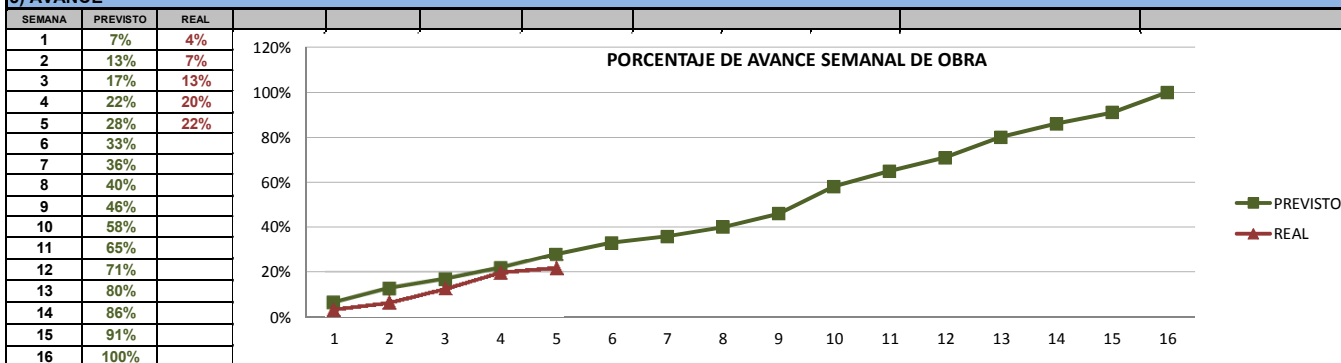

FIN DEL DOCUMENTO
