


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin						20
						X	J	V	S	D	
1		INICIO OBRA SEDGMAN	81 días	vie 18/03/11	jue 09/06/11						
2		FASE 1	12 días	vie 18/03/11	mar 29/03/11						
3		TRABAJOS PRELIMINARES	12 días	vie 18/03/11	mar 29/03/11						
4		Trazado para nivelación	1 día	vie 18/03/11	vie 18/03/11	0%					Trazado
5		Nivelación de losa solo 70% de la planta	12 días	vie 18/03/11	mar 29/03/11	0%					
6		Pasadas de losa con testiguera para electrificación de mobiliario	1 día	lun 28/03/11	lun 28/03/11						
7		Trazado y niveles	2 días	lun 28/03/11	mar 29/03/11						
8		Proyecto de seguridad	1 día	lun 28/03/11	lun 28/03/11						
9		Proyecto de clima	1 día	lun 28/03/11	lun 28/03/11						
10		FASE 2	48 días	dom 27/03/11	lun 16/05/11						
11		CIELOS	16 días	dom 27/03/11	lun 11/04/11						
12		Instalación de equipos Fan Coil	6 días	lun 28/03/11	sáb 02/04/11						
13		Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes debiles en cielo.	8 días	dom 27/03/11	dom 03/04/11						
14		Canalización y cableado de detección de incendio.	5 días	lun 28/03/11	vie 01/04/11						
15		Canalizaciones de alumbrado.	5 días	dom 27/03/11	jue 31/03/11						
16		Cableado de alumbrado	5 días	vie 01/04/11	mar 05/04/11						
17		Instalación de vigas de fierro	4 días	mié 30/03/11	sáb 02/04/11						
18		Red de agua para equipos de clima	5 días	dom 03/04/11	jue 07/04/11						
19		Prueba de presión para red de agua equipos de clima	1 día	vie 08/04/11	vie 08/04/11						
20		Aislación de cañerías de equipos de clima	3 días	sáb 09/04/11	lun 11/04/11						
21		Desagües para equipos de clima	3 días	dom 03/04/11	mar 05/04/11						
22		Instalación de ducto 30%	5 días	mar 05/04/11	sáb 09/04/11						
23		Instalación de red de extinción	9 días	mar 29/03/11	mié 06/04/11						
24		Prueba de presión en red de extinción	2 días	jue 07/04/11	vie 08/04/11						
25		TABIQUES VOLCOMETAL	45 días	mié 30/03/11	lun 16/05/11						
26		Estructuración de tabiques.	7 días	mié 30/03/11	mar 05/04/11						
27		Emplacado de primera cara	4 días	lun 04/04/11	jue 07/04/11						
28		Enlucido de yeso, atraque cielo y guardapolvo, primera cara	3 días	jue 07/04/11	sáb 09/04/11						
29		Estructura y empaque de vigas perimetrales	9 días	mié 06/04/11	jue 14/04/11						
30		Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y dato en tabiques.	5 días	mié 06/04/11	dom 10/04/11						

Proyecto: Sedgman INICIO Fecha: vie 01/04/11	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin						20
						X	J	V	S	D	
31		Instalación de refuerzos en tabiques	4 días	jue 07/04/11	dom 10/04/11						
32		Viga reforzada y dintel con nariz sobre tabiquería de cristal	9 días	vie 08/04/11	sáb 16/04/11						
33		Enlucido de yeso en dintel con nariz	5 días	vie 15/04/11	mar 19/04/11						
34		Estructura de cielo volcometal.	3 días	dom 17/04/11	mar 19/04/11						
35		Instalación de soporte de proyectores	1 día	mié 20/04/11	mié 20/04/11						
36		Estructura y empaque de tragados en cielo duro	3 días	mar 19/04/11	jue 21/04/11						
37		Emplacado de cielo duro.	2 días	mar 12/04/11	mié 13/04/11						
38		Enlucido de yeso en tragados de cielo duro	3 días	jue 14/04/11	sáb 16/04/11						
39		Emplacado de segunda cara	4 días	lun 11/04/11	jue 14/04/11						
40		Cableado de red eléctrica y corrientes débiles en tabiques	7 días	dom 10/04/11	sáb 16/04/11						
41		Cableado de termostatos	3 días	jue 14/04/11	sáb 16/04/11						
42		Enlucido yeso, atraque cielo y guardapolvo, segunda cara	4 días	jue 14/04/11	dom 17/04/11						
43		Huinchas, empaste y aparejo ambas caras	9 días	mié 13/04/11	jue 21/04/11						
44		Instalación de perfilería de aluminio.	3 días	dom 01/05/11	mar 03/05/11						
45		Instalación de puertas de corredera	5 días	jue 12/05/11	lun 16/05/11						
46		Instalación de soporte módulos de enchufes e interruptores	5 días	dom 17/04/11	jue 21/04/11						
47		Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral.	6 días	lun 25/04/11	sáb 30/04/11						
48		FASE 3	33 días	dom 01/05/11	jue 02/06/11						
49		CIELO MODULAR	33 días	dom 01/05/11	jue 02/06/11						
50		Estructuración de cielo modular.	5 días	dom 01/05/11	jue 05/05/11						
51		Instalación de luminarias.	5 días	vie 06/05/11	mar 10/05/11						
52		Instalación de rejillas de climatización.	4 días	sáb 07/05/11	mar 10/05/11						
53		Instalación de detectores de humo.	3 días	vie 06/05/11	dom 08/05/11						
54		Instalación de embellecedores de sprinklers.	2 días	sáb 07/05/11	dom 08/05/11						
55		Instalación de proyectores	1 día	jue 02/06/11	jue 02/06/11						
56		Instalación de palmetas de cielo.	5 días	mié 11/05/11	dom 15/05/11						
57		PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS	11 días	dom 01/05/11	mié 11/05/11						
58		Instalación de cubre junta en cambios de pavimento	1 día	dom 01/05/11	dom 01/05/11						
59		Instalación de porcelanato	4 días	lun 02/05/11	jue 05/05/11						
60		Instalación de piso flotante	3 días	lun 02/05/11	mié 04/05/11						

Proyecto: Sedgman INICIO Fecha: vie 01/04/11	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Página 2

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin						20
						X	J	V	S	D	
61		Instalación de alfombras.	5 días	vie 06/05/11	mar 10/05/11						
62		Cubierta de cartón en sector de alfombra	1 día	mié 11/05/11	mié 11/05/11						
63		CRISTALES	15 días	dom 01/05/11	dom 15/05/11						
64		Rectificación de medidas	1 día	mar 03/05/11	mar 03/05/11						
65		Instalación de cristales.	5 días	lun 09/05/11	vie 13/05/11						
66		Instalación de puerta templada.	4 días	jue 12/05/11	dom 15/05/11						
67		Instalación de pizarras de cristal templado.	3 días	dom 01/05/11	mar 03/05/11						
68		ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO	5 días	dom 22/05/11	jue 26/05/11						
69		Readecuación de tableros existentes.	5 días	dom 22/05/11	jue 26/05/11						
70		Trabajos en Rack.	5 días	dom 22/05/11	jue 26/05/11						
71		Certificación y rotulación.	1 día	jue 26/05/11	jue 26/05/11						
72		MOBILIARIO DE LINEA	12 días	lun 09/05/11	sáb 21/05/11						
73		Llegada a obra de mobiliario de línea	0 días	lun 09/05/11	lun 09/05/11						
74		Instalación de mobiliario de línea.	8 días	mié 11/05/11	mié 18/05/11						
75		Cableado por mobiliario(electricidad y cableado estructurado)	8 días	sáb 14/05/11	sáb 21/05/11						
76		MOBILIARIO ESPECIAL	5 días	jue 12/05/11	lun 16/05/11						
77		Instalación de mobiliario especial.	4 días	jue 12/05/11	dom 15/05/11						
78		Instalación de canalización y cableado	1 día	lun 16/05/11	lun 16/05/11						
79		FASE 4	14 días	vie 27/05/11	jue 09/06/11						
80		PINTURA	9 días	vie 27/05/11	sáb 04/06/11						
81		Pintura segunda mano.	6 días	vie 27/05/11	mié 01/06/11						
82		Instalación de film en cristales.	3 días	jue 02/06/11	sáb 04/06/11						
83		Instalación de logo corpóreo.	1 día	vie 03/06/11	vie 03/06/11						
84		LIMPIEZA DE OBRA	5 días	dom 05/06/11	jue 09/06/11						
85		Limpieza de Obra final.	4 días	dom 05/06/11	mié 08/06/11						
86		Entrega provisoria.	1 día	jue 09/06/11	jue 09/06/11						

Proyecto: Sedgman INICIO
Fecha: vie 01/04/11

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso





Resumen del proyecto




Fecha límite



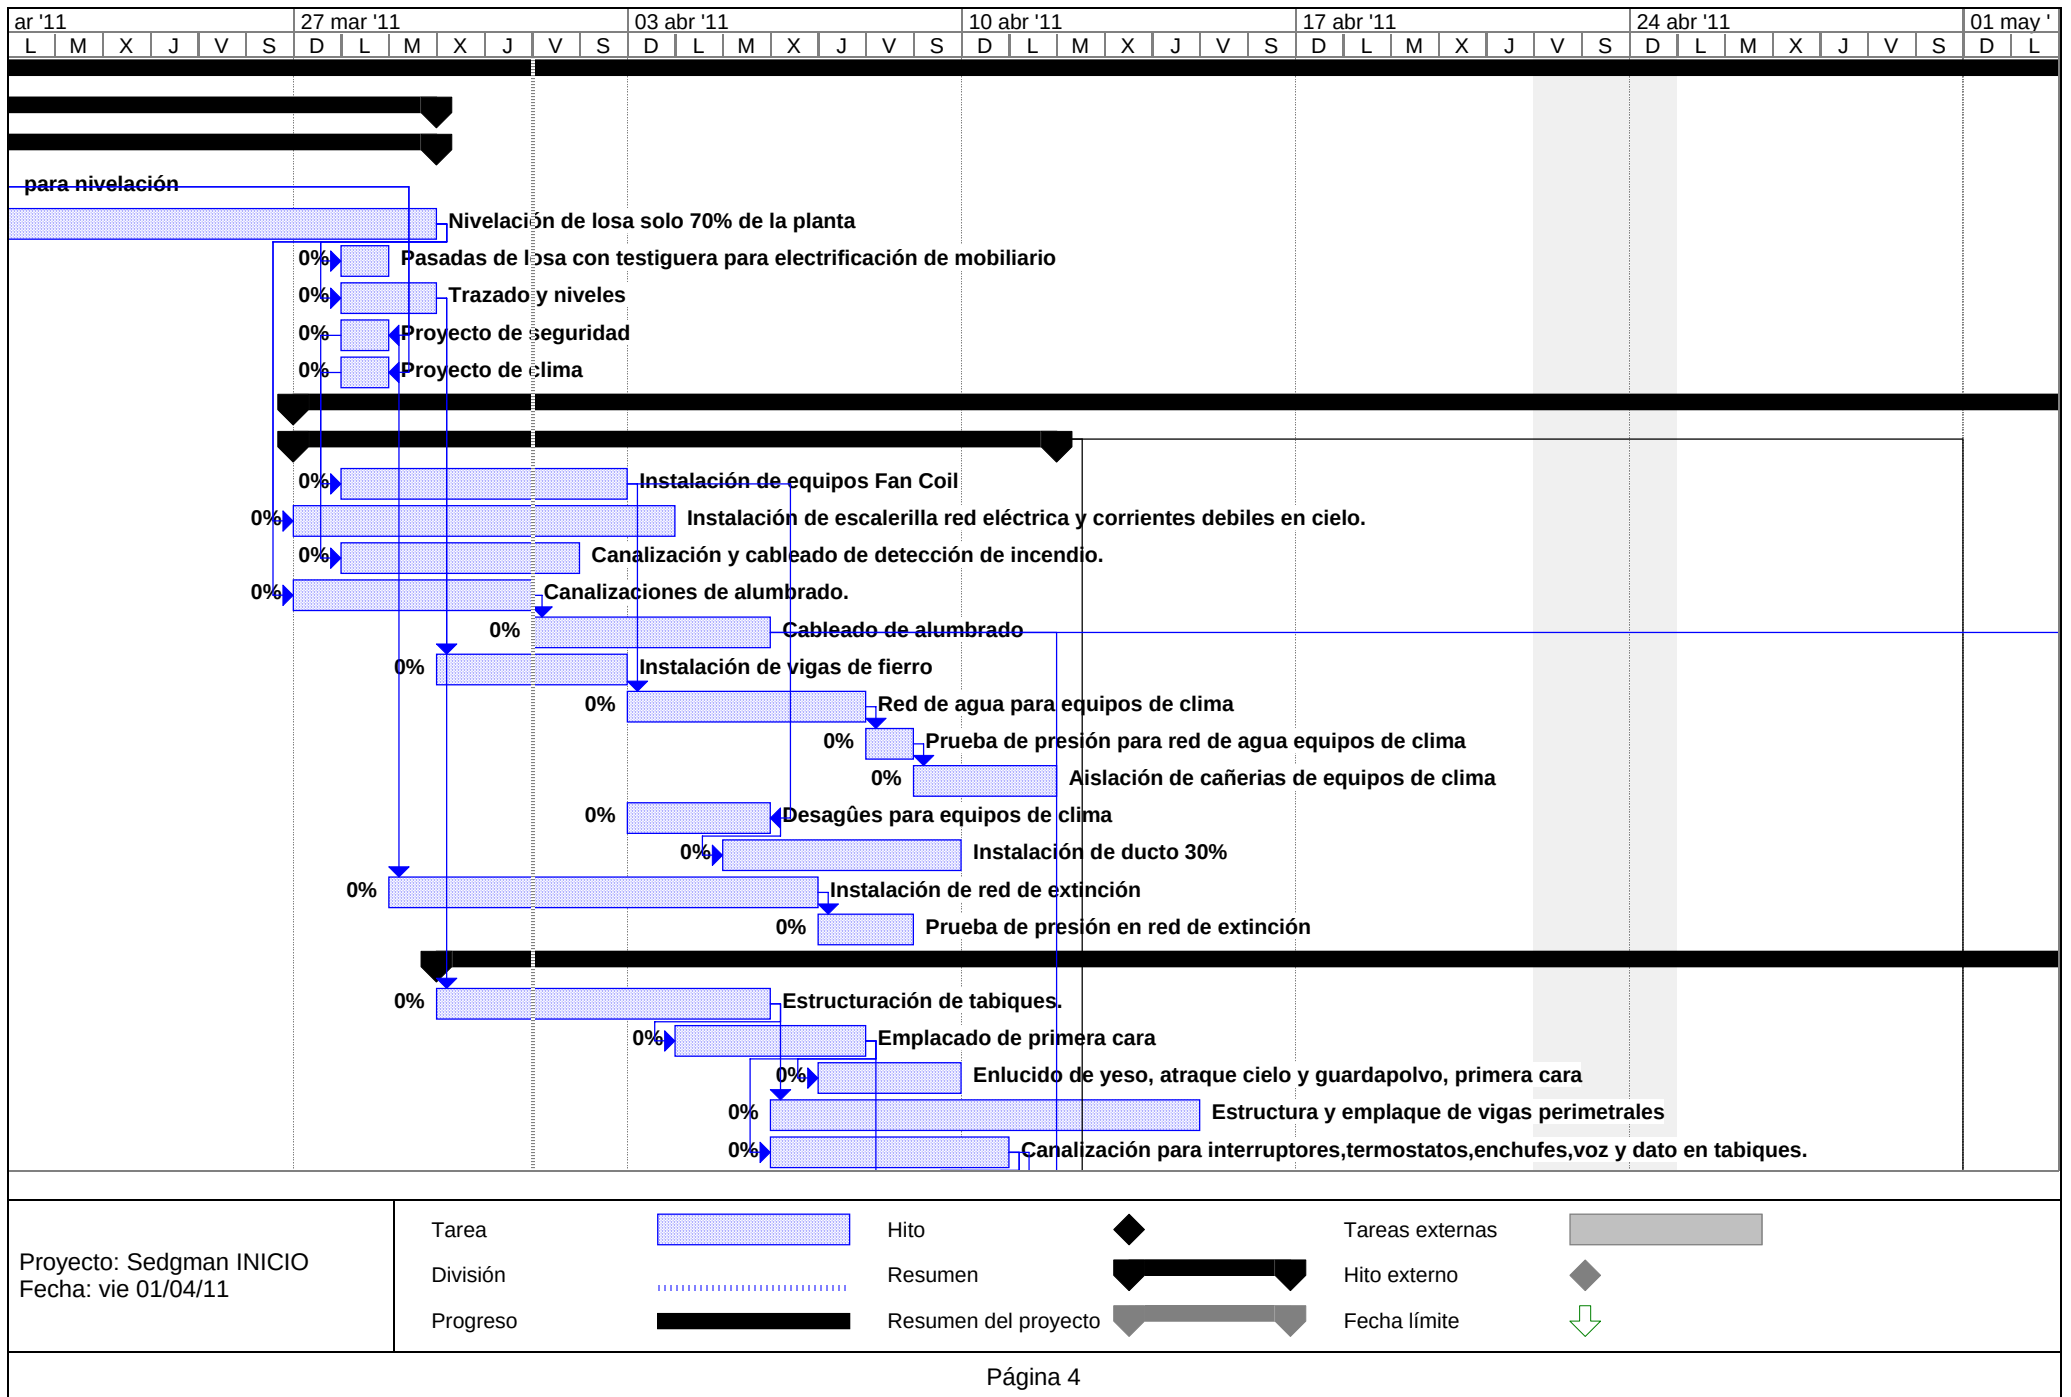

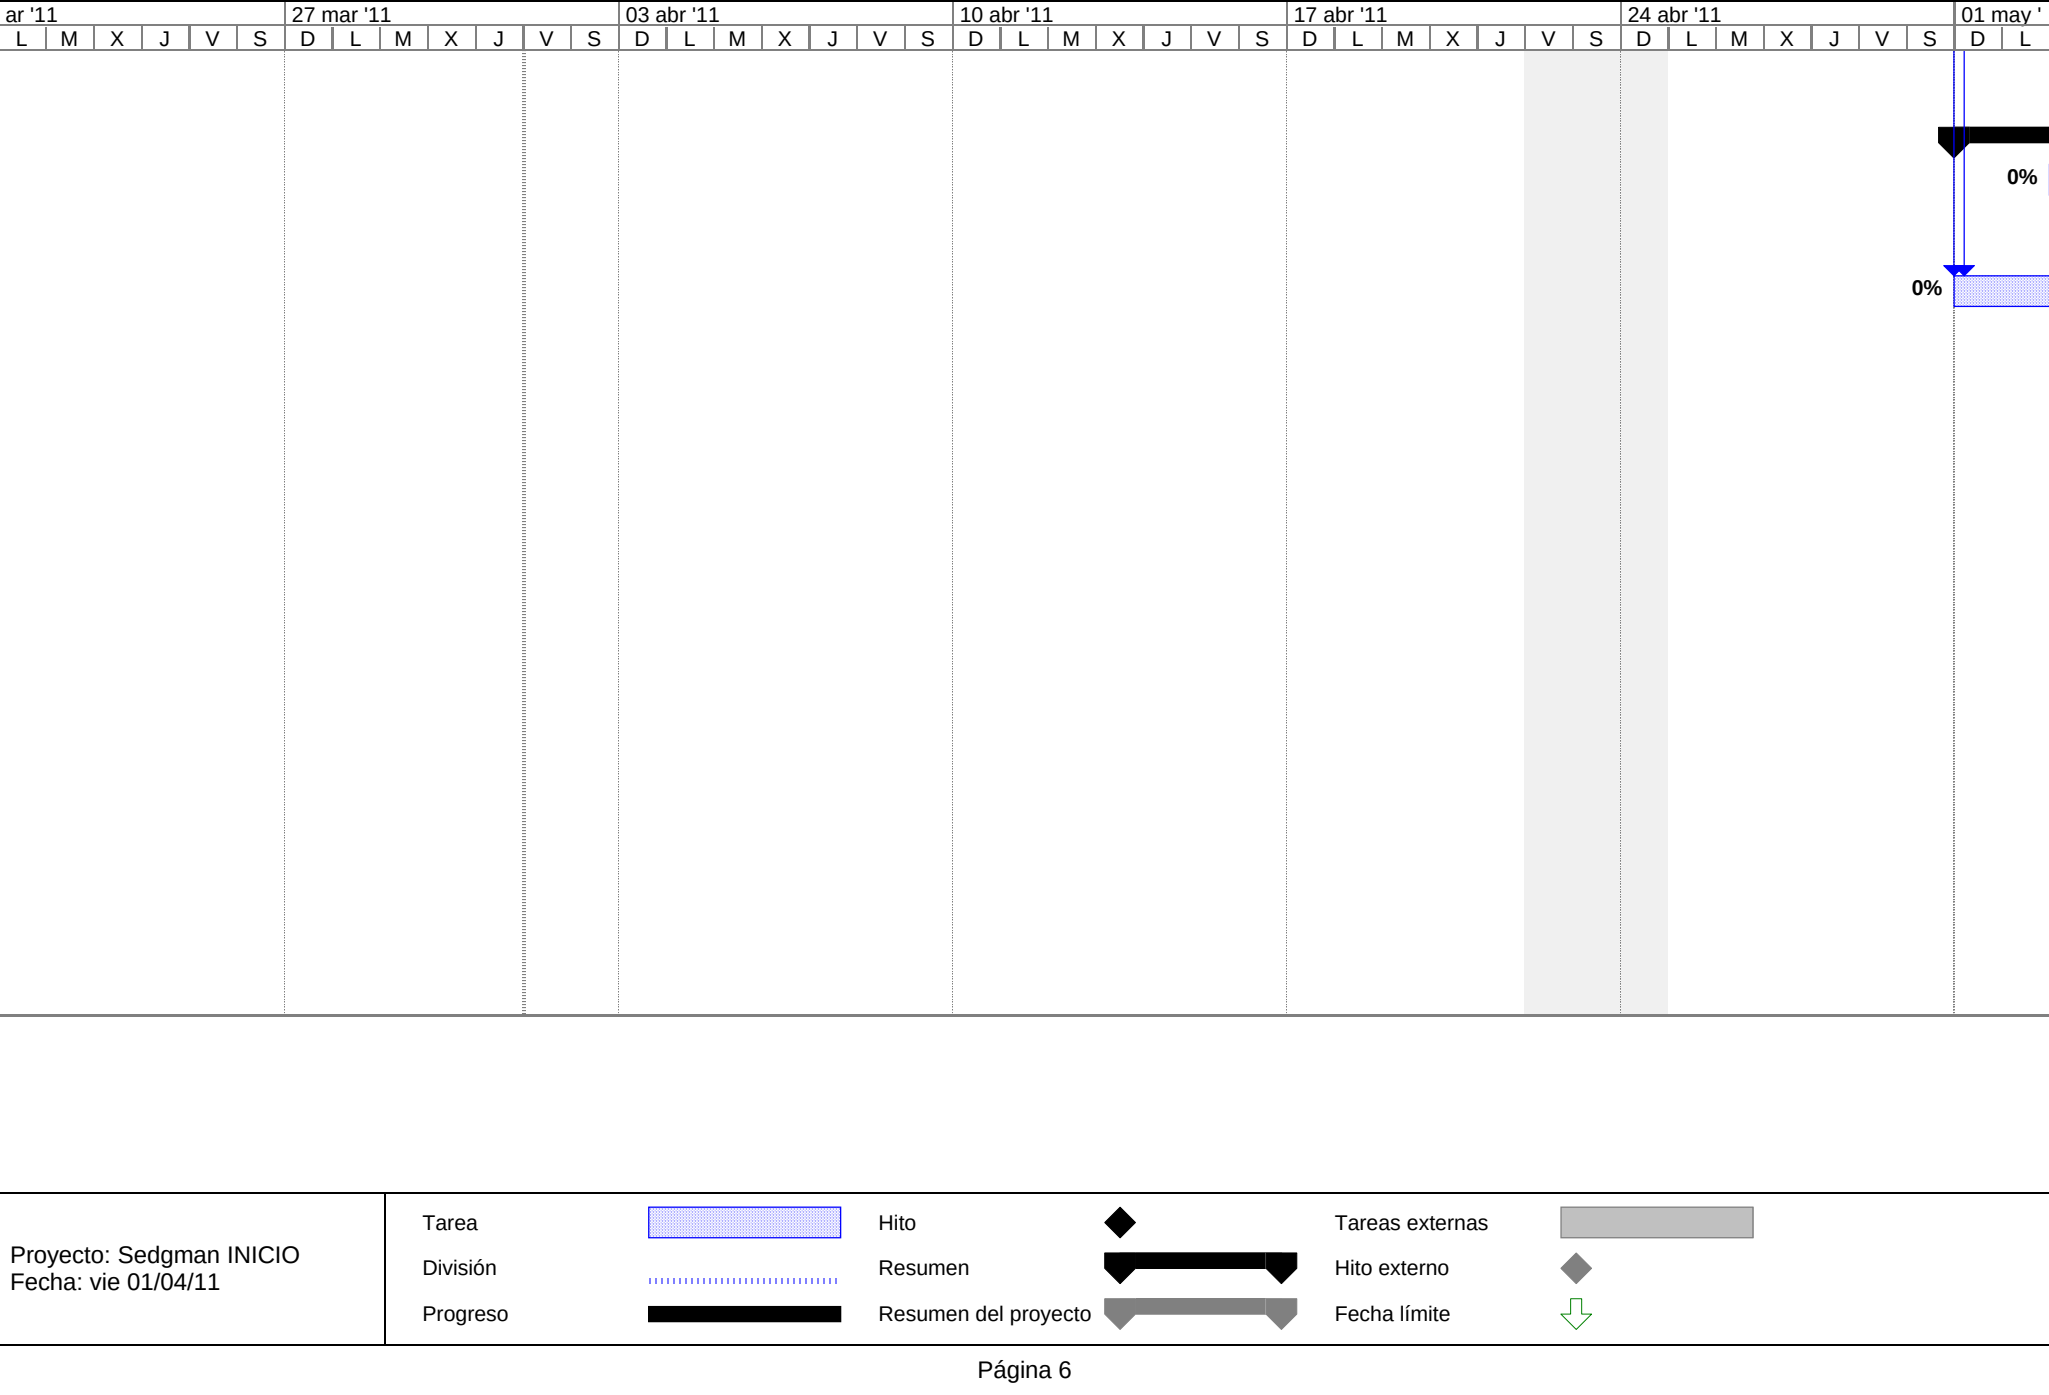

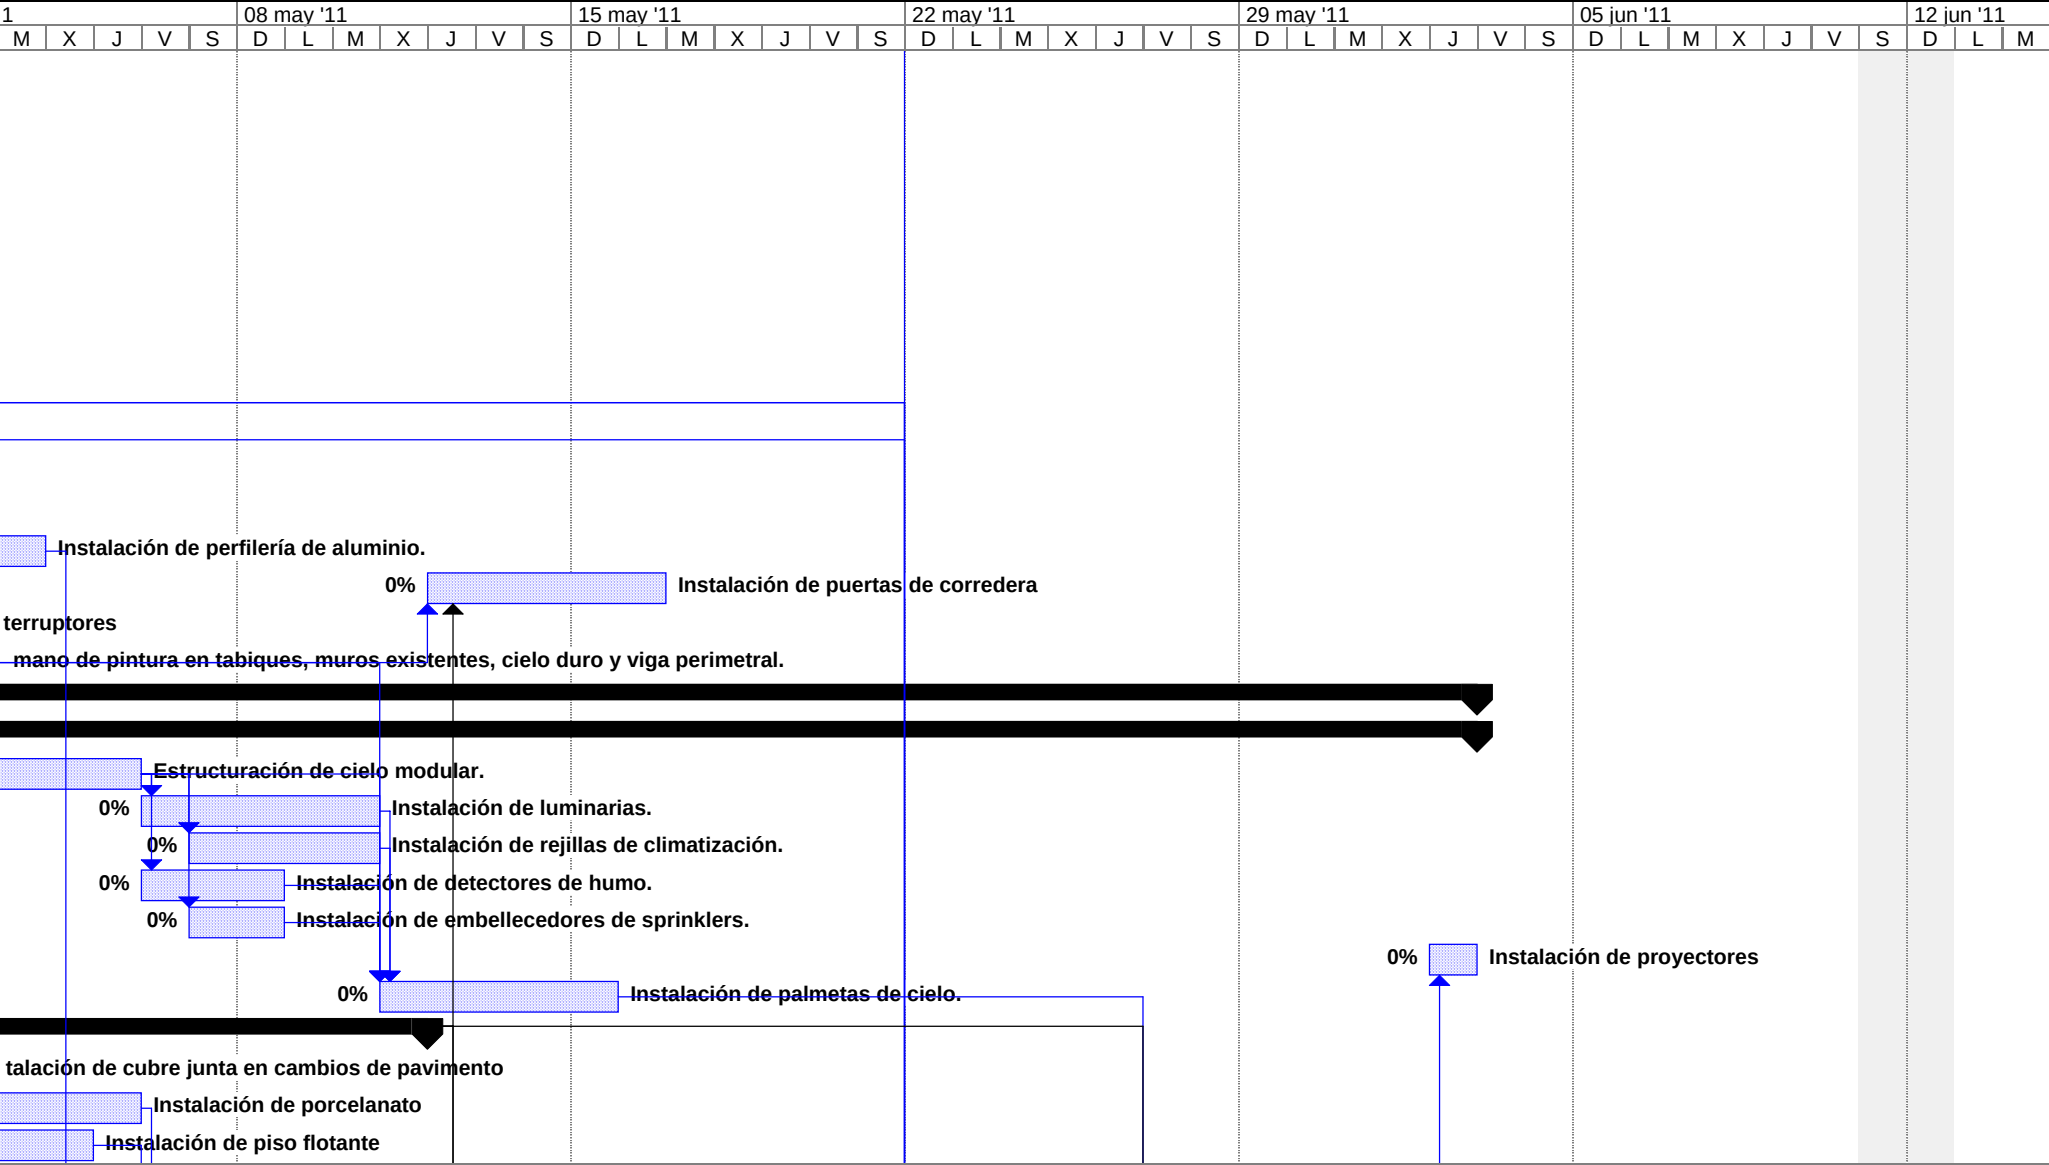

Proyecto: Sedgman INICIO Fecha: vie 01/04/11	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

