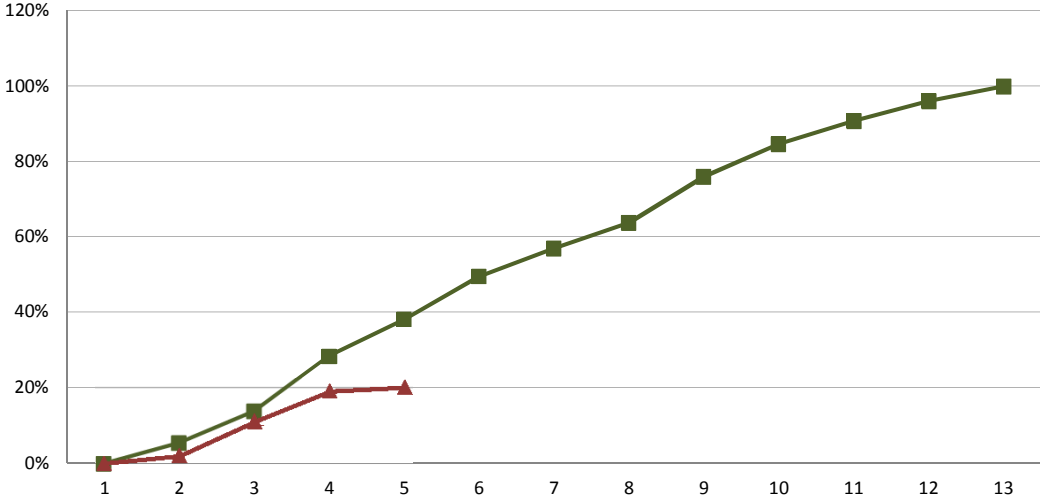


N° 04		REPORTE SEMANAL		contract workplaces	
Fecha Reporte		11/08/2015		AMC NETWORKS™ INTERNATIONAL	
PROYECTO		AMC Networks			
UBICACIÓN		Humboldt 1967 - PB, EP, 3P			
Contacto Cliente:		Marisa Piñeiro			
Superficie		1.800 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones.					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
					
PB: Estado general de la obra		PB: Canalizaciones y conductos		PB: Estructura de durlock	
					
EP: Canalizaciones multimedia		PB: Estado general de la obra		PB: Estado general de la obra	
3) TEMAS CRITICOS					
Item	Detalle				Responsable
1	EDESUR - Comienzo de trámite para T3				AMC
2	Aprobación de layout de PB + EP				AMC
3	Aprobación de terminaciones				AMC
4	Cronograma por etapas 3er piso				CONTRACT
4) HITOS Y DEADLINES					
Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
10					
SEMANA	PREVISTO	REAL	PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA  ■ PREVISTO ▲ REAL		
1	0%	0%			
2	5%	2%			
3	14%	11%			
4	28%	19%			
5	38%	20%			
6	49%				
7	57%				
8	64%				
9	76%				
10	85%				
11	91%				
12	96%				
13	100%				
FIN DEL DOCUMENTO					
