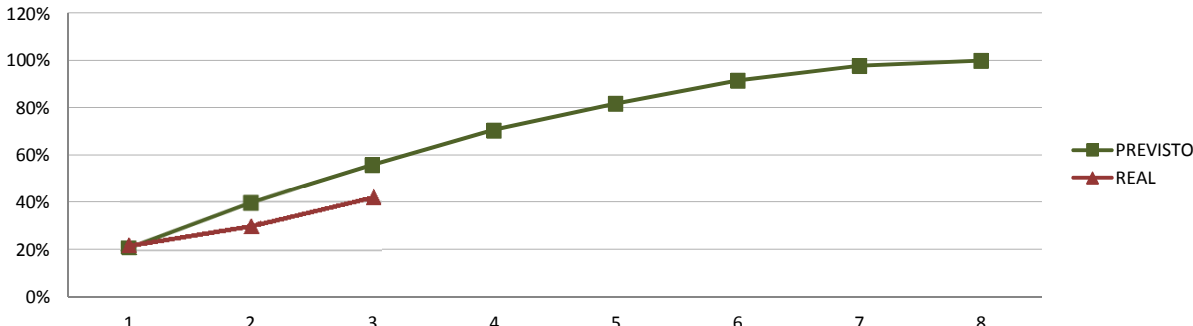


N° 08		REPORTE SEMANAL		contract workplaces	
Fecha Reporte		07/09/2015		AMC NETWORKS INTERNATIONAL	
PROYECTO		AMC Networks			
UBICACIÓN		Humboldt 1967 - PB, EP, 3P			
Contacto Cliente:		Marisa Piñeiro			
Superficie		1.800 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones.					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
					
3P: Primer etapa		3P: Primer etapa		PB: Estado general de la obra	
					
PB: Estado general de la obra		PB: Estado general de la obra		PB: Estado general de la obra	
3) TEMAS CRITICOS					
Item	Detalle				Responsable
1	Envío de adicionales, desvíos.				CONTRACT
2	Aprobación de adicionales				AMC
4) HITOS Y DEADLINES					
Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	Microcemento alisado	13/09/2015	24/09/2015		CONTRACT
	Pintura	27/08/2015	29/08/2015		CONTRACT
	Tapado de canalizaciones				CONTRACT
	Varilla de colocación como junta de dilatación				CONTRACT
10					
SEMANA	PREVISTO	REAL	PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA 		
6	21%	22%			
7	40%	30%			
8	56%	42%			
9	70%				
10	82%				
11	92%				
12	98%				
13	100%				
FIN DEL DOCUMENTO					
