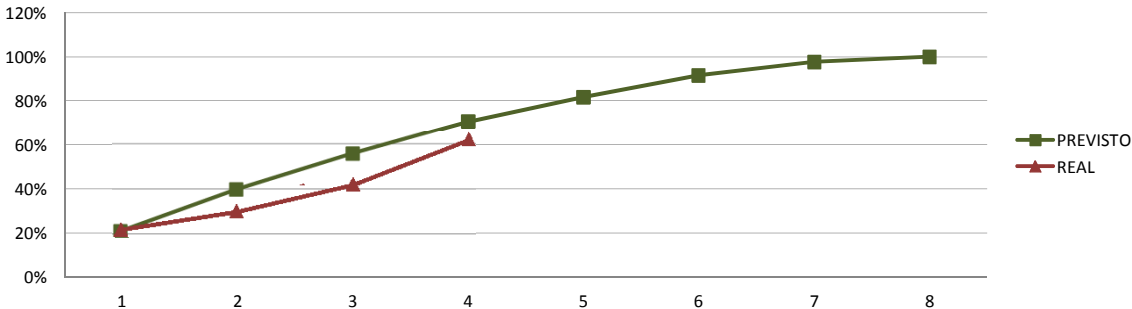


N° 09		REPORTE SEMANAL		contract workplaces	
Fecha Reporte16/09/2015				AMC NETWORKS INTERNATIONAL	
PROYECTO		AMC Networks			
UBICACIÓN		Humboldt 1967 - PB, EP, 3P			
Contacto Cliente:		Marisa Piñero			
Superficie:		1.800 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones.					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
					
3P: Primer etapa finalizada		3P: Demolición de deck y reparación de membrana		PB: Estado general de la obra, microcemento	
					
PB: Estado general de la obra, pintura		PB: Estado general de la obra		PB: Estado general de la obra	
3) TEMAS CRITICOS					
Item	Detalle				Responsable
1	Envío de adicionales electricos, desvíos.				CONTRACT
2	Aprobación de adicionales				AMC
3	Debido a la interrupción de las tareas de microcemento en horarios diurnos y la reprogramación de horarios extendidos se enviará el adicional				AMC
4) HITOS Y DEADLINES					
Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	Microcemento alisado	13/09/2015	24/09/2015	Se duplican los horarios de trabajo y horarios extensos	CONTRACT
	Pintura	27/08/2015	29/08/2015	Se incorpora mas personal	CONTRACT
	Piso vinílico	18/09/2015	21/09/2015	Se reprograma debido al retraso de pintura	CONTRACT
	Colocación de artefactos de iluminación	21/09/2015	25/09/2015	Tarea demorada por el microcemento alisado, se comienza en el día de h	CONTRACT
	Armado de puestos de trabajo y reubicacion CR	22/09/2015	26/09/2015	Tarea demorada por el microcemento alisado, se comienza en el día de h	CONTRACT
10					
SEMANA	PREVISTO	REAL	PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA 		
6	21%	22%			
7	40%	30%			
8	56%	42%			
9	70%	62%			
10	82%				
11	92%				
12	98%				
13	100%				
FIN DEL DOCUMENTO					
