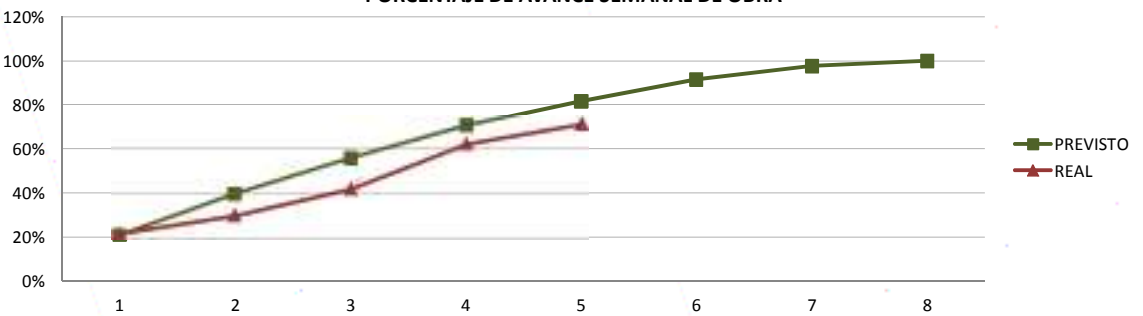


N° 10		REPORTE SEMANAL		contract workplaces	
Fecha Reporte		22/09/2015		AMC NETWORKS INTERNATIONAL	
PROYECTO		AMC Networks			
UBICACIÓN		Humboldt 1967 - PB, EP, 3P			
Contacto Cliente:		Marisa Piñeiro			
Superficie		1.800 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones.					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
					
3P: estado de la segunda etapa		EP: Estado general de la obra		3P: Estado general de la obra, segunda etapa.	
					
PB: Estado general de la obra, pintura		PB: Estado general de la obra		Microcemento previo al laqueado	
3) TEMAS CRITICOS					
Item	Detalle				Responsable
1	Envío de adicionales obra civil.				CONTRACT
2	Aprobación de adicionales				AMC
3	Habilitación. Confirmación de modificación en sanitarios exittentes				AMC
4) HITOS Y DEADLINES					
Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	Armado de Data Center	25/09/2015	29/09/2015	Se definirá si el armado de DC se realizará con los racks existentes	CONTRACT
	Provisión y colocación de alfombras	28/09/2015	30/09/2015	Se reprogramó debido a la instalación del microcemento alisado. Se refuera personal para realizarlo en menor tiempo	CONTRACT
	Provisión y armado de puestos existentes	28/09/2015	30/09/2015	La demora de esta tarea generará un atraso en el cableado del puesto	CONTRACT
	Cableado de puestos de trabajo	28/09/2015	03/10/2015	Se realizará en conjunto con la colocación de faceplates y periscopios	CONTRACT
	Muebles especiales	28/09/2015	30/09/2015	Se instalarán los muebles de guardado, recepción y coffe	CONTRACT
10					
SEMANA	PREVISTO	REAL	PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA 		
6	21%	22%			
7	40%	30%			
8	56%	42%			
9	70%	62%			
10	82%	71%			
11	92%				
12	98%				
13	100%				
FIN DEL DOCUMENTO					
