




INFORME 6	REPORTE INICIAL DE OBRA	contract workplaces			
Fecha Reporte 30/09/2016					
PROYECTO LA FARMACO					
UBICACIÓN Arias 1639 - Piso 5 - CABA					
Contacto Cliente: Nicolas Fernandez Cel: +54 9 011 4726 5100					
Superficie 500 m2					
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Nuevas oficinas.					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
					
Tabiquería y Cielorraso: armado de cajones, emplacado de 1° cara y recepción de instalaciones para emplacado de 2° cara (Ingreso y sector Arias). Cielorraso: a la espera de instalacion termomecanica. Cierre por sectores y cortinero.					
					
					
Tabiquería: armado de cajones, emplacado de 1° cara y recepción de instalaciones para emplacado de 2° cara (sector patio interno). Cielorraso: a la espera de instalacion termomecanica. Cierre por sectores y cortinero.					
					
Instalacion Eléctrica: cableado de bocas de iluminación, cableado de puestos por bandeja bajo piso. Albañilería: contrapiso y carpeta en local sanitario.					
3) TEMAS CRITICOS					
Item	Detalle	Responsable			
	Medidor, faltante.	La Fármaco			
	Listado de Pendientes en Acta de Recepcion Provisoria	Contract			
4) HITOS Y DEADLINES (Open Space)					
Status	Rubros	Inicio	Final	Comentarios	Responsable
	Inicio de Obra	12/08/2016	12/08/2016	100%	
	Alfombra, compra	17/08/2016	18/08/2016	100%	
	Piso de madera, compra	12/08/2016	30/08/2016	100%	
	Tabiquería, replanteo	22/08/2016	01/09/2016	100%	
	Tabiquería, pase de instalaciones-Cierre	29/08/2016	01/09/2016	100%	
	Tabiquería, traspaso a pintura	05/09/2016	13/09/2016	100%	

	Mobiliario de linea	12/09/2016	22/09/2016	100%	
	Cielorraso, cierre cielorraso continuo	14/09/2016	24/09/2016	100%	
	Cielorraso, cierre cielorraso desmontable	14/09/2016	23/09/2016	100%	
	Piso Técnico, nivelación final	29/08/2016	09/09/2016	100%	
	Cristales, medición	31/08/2016	01/09/2016	95%	IM Cristales
	Carpintería de madera, medición	31/08/2016	16/08/2016	100%	
	Mesada de baño, medición	31/08/2016	22/09/2016	100%	
	Artefactos de iluminación, provisión	07/09/2016	26/09/2016	90%	Quasar
	Data Center, recepción	13/09/2016	28/09/2016	85%	Simec
	AA, prueba de estanqueidad	13/09/2016	23/09/2016	100%	
	AA, puesta en marcha	22/09/2016	--	Pendiente por falta de medidor	La Farmaco

5) AVANCE

SEMANA	PREVISTO	REAL
0	0%	0%
1	8%	3%
2	22%	11%
3	37%	29%
4	57%	41%
5	73%	56%
6	87%	82%
7	100%	93%

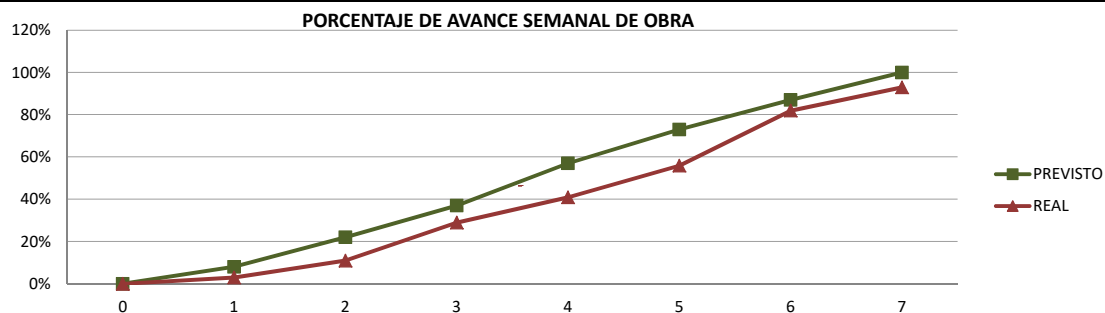

FIN DEL DOCUMENTO
