

R E P O R T E S E M A N A L

INFORME SEMANA 02

contract
workplaces

Fecha Reporte	05/11/2018
Proyecto	M&M Bomchil
Ubicación	Av. Corrientes 420, Capital Federal
Contacto Cliente:	

DESCRIPCION DEL PROYECTO


El proyecto consta del armado de puestos de trabajo y salas de reuniones con coffes y espacios de biblioteca y guardados. La obra esta comprendida en los pisos 3,4,5,7 y 8.

STATUS PROYECTO

FOTOS Y DESCRIPCION



Piso 8 se armó la estructura de cielorrasos y ajuste

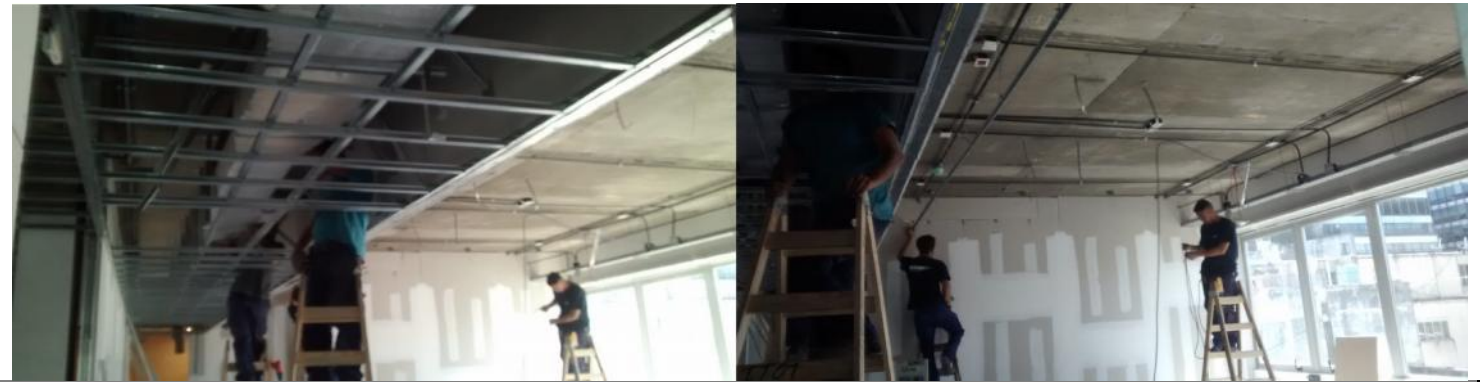

Piso 8 se masilló 1 cara y se desmontaron tachos de aire. Se demolieron los tabiques de este piso.

INFORME SEMANA 02

contract
workplaces



Piso 3 se avanzó con la estructura de los cielorrasos y se termino los tabiques



Se demolió tabique del piso 3 y se realizaron las canalizaciones. Piso 5 comenzaron a levantar la estructura de tabiques.



Se avanzó con los tabiques del piso 4 y 5

INFORME SEMANA 02



Se marcaron las canalizaciones del piso 4 y se avanzó en el piso 7 con estructura de tabiques

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
	Piso 8, se está terminando ajustes cielorrasos y 2 tabiques de muebles, se hizo limpieza y orden. Se terminó demolición.
	Piso 8 tiene demora en la parte eléctrica
	Piso 7, se comenzó a levantar tabiques y empaque de 1 cara, se terminó canalización y cableado iluminación. Se están terminando tareas de demolición.
	Piso 5, se comenzaron a levantar tabiques y empaque de una cara.
	Piso 4, se marco para canalización de piso y se avanza con tabiques.
	Piso 3 se terminó de levantar los tabiques y cielorrasos, se hicieron las canalizaciones para puestos en carpeta, se hicieron las canalizaciones en tabiques.

Item	Detalle de tareas especiales	Responsable
	Medir decibel	
	Medir piso 3 vidrios	
	Medir muebles faltantes	
	Refuerzos para bibliotecas especiales	

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
	Medición de vidrios y carpinterías	
	Terminar durlock de piso 8 y 3	
	Comenzar instalación eléctrica piso 8 y 4	
	Comenzar ajustes de piso técnico	
	Movimiento de equipos de AA y tachos	
	Terminar demoliciones que quedan	

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Medición de pisos terminados aluminio	06-nov		
	Montar equipos de aire	05-nov		
	Terminar compras faltantes	05-nov		

AVANCE DE OBRA

Semana	Previsto	Real	Porcentaje Semanal de Avance de Obra
0	0%	0%	70%
1	5%	5%	
2	10%	10%	

INFORME SEMANA 02



3	17%	17%
4	25%	24%
5	34%	
6	42%	
7	50%	
8	56%	
9	62%	
10	70%	
11	79%	
12	88%	
13	94%	
14	98%	
15	100%	

