

INFORME SEMANA 03



Fecha Reporte	12/11/2018
Proyecto	M&M Bomchil
Ubicación	Av. Corrientes 420, Capital Federal
Contacto Cliente:	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta del armado de puestos de trabajo y salas de reuniones con coffes y espacios de biblioteca y guardados. La obra esta comprendida en los pisos 3,4,5,7 y 8.

FOTOS Y DESCRIPCION



Piso 8 se cortó y ajustó el piso tecnico. Se continúa con la instalación eléctrica.



Piso 8 se hicieron los bajo tabiques acústicos y se terminó la demolición. Se avanza con arreglos de albañilería



Piso 7. Se avanza con estructura de cielorrasos, empaque de ajustes y masillado.



Piso 5. Se avanza con estructura de cielorrasos y ajustes. También se avanza con AA, montaje de tachos y cañerías.



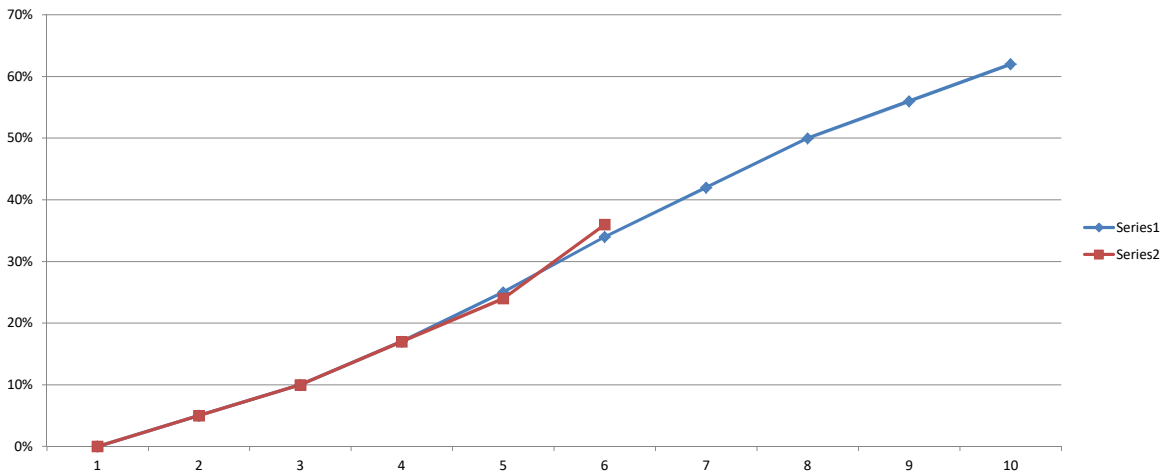
Piso 4. Se terminó la demolición, se avanza con refuerzos de madera en tabiques, estructura de cielorrasos y AA.



Piso 3. Se armó la estructura de los cielorrasos ajustes. Se está emplacando las segundas caras.

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso	Responsable
	Piso 8, se está avanzando con cierre de tabiques y cielorrasos. Se realizó la instalación de incendio	
	Piso 8 ya avanzó la instalación eléctrica	
	Piso 7, Se está haciendo el cierre de tabiques, demoliciones faltantes, se montaron tachos y comenzó el cableado estructurado.	
	Piso 5, se se avanza con estructura de cielorrasos, ajustes y gargantas. Se picó el piso para canalización eléctrica. Se terminó la demolición.	
	Piso 4, se avanza con los refuerzos de tabiques y cierres de los mismos. Se avanza con cielorrasos y demolición faltante.	
	Piso 3 se avanza con instalación eléctrica de piso, cierre de tabiques y ajustes de cielorrasos. Se avanza con tachos de AA.	
Item	Detalle de tareas especiales	Responsable
	Mide Decibel paneles	
	Mide Fabian carpinterías. De los 4 pisos	
	Avanza fabricación de muebles	
	Recibimos artefactos de iluminación.	

R E P O R T E S E M A N A L				
INFORME SEMANA 03				
TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA				
Item	Detalle			Responsable
	Terminar durlock de piso 7 y 8			
	Continuar instalación electrica piso 5			
	Comntinuar instalación electrica piso 3 y 4			
	Avanzar con cañería de AA y montaje de tachos			
HITOS Y DEADLINES				
Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Medición de pisos terminados aluminio	13-nov		
	Montar equipos de aire	17-nov		
	Terminar compras faltantes	17-nov		
AVANCE DE OBRA				
Semana	Previsto	Real	Porcentaje Semanal de Avance de Obra	
0	0%	0%		
1	5%	5%		
2	10%	10%		
3	17%	17%		
4	25%	24%		
5	34%	36%		
6	42%			
7	50%			
8	56%			
9	62%			
10	70%			
11	79%			
12	88%			
13	94%			
14	98%			
15	100%			
