



INFORME FINAL	INFORME FINAL	contract workplaces
Fecha Reporte	22de Septiembre de 2017	
PROYECTO	PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER	
UBICACIÓN	Av. Corrientes 1516	
Contacto Cliente:	Gonzalo Slobocian	
Superficie	1132 m2	
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO		
Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°		
2) FOTOS Y DESCRIPCION		
Baño de hombres piso 1		
		
		
		
		
Baño de damas piso 1		
		



Baño de hombres piso 2



Baño de damas piso 2







Se acopian en deposito material de reposición.



Vistas de la obra en Gral.





3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516


Status	Hitos			Comentarios	Responsable

4) TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Piso 1 y 2	25/09/2017	Realizado	Cajoneras en puestos	Línea K
2	Piso 2	25/09/2017	Realizado	Cambio de alfombra con pegamento	FyG
3	Piso 1	28/09/2017	Realizado	Alinear puestos de trabajo	Línea K
4	Piso 1 (Baño de damas)	25/09/2017	Realizado	Cambio de cerradura	Fmax
5	Baños piso 1 y 2	26/09/2017	Realizado	Amurado sobre muros	N4
6	Instalación sanitaria	25/09/2017	Realizado	Relevar instalación de artefactos Sanitarios..	N4
7	Baño de damas piso 2	25/09/2017	Realizado	Perdida en inodoro	N4
8	Baños piso 1 y 2	28/09/2017	Realizado	Sellar descarga de mingitorios.	N4
9	Obra en Gral.	28/09/2017	Realizado	Colocar zócalos de mdf.	FyG

5) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	31-jul	0%	0%
1	07-ago	3%	20%
2	14-ago	12%	32%
3	21-ago	33%	66%
4	28-ago	55%	68%
5	04-sep	73%	77%
6	11-sep	93%	84%

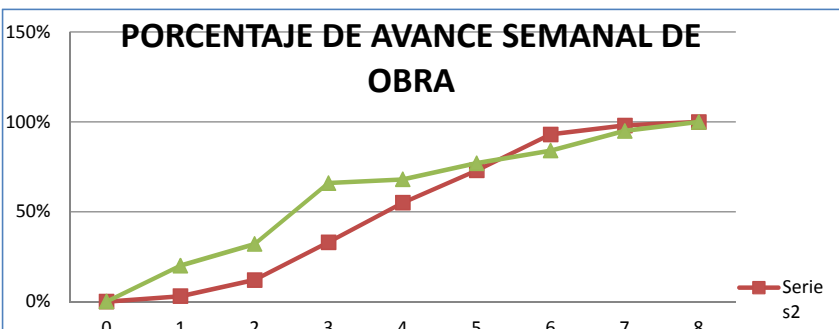

7	18-sep	98%	95%	0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	25-sep	100%	100%									
FIN DEL DOCUMENTO												
