



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fecha Reporte     | 20/10/2017                         |
| Proyecto          | Obra Remodelación Oficinas 6° PISO |
| Ubicación         | Tronador 4890, Saavedra, CABA.     |
| Contacto Cliente: | Carlos Chana                       |


**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.  
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas privadas.

**FOTOS Y DESCRIPCION**



Montaje de equipos de A-A y pase en semipiso vecino.

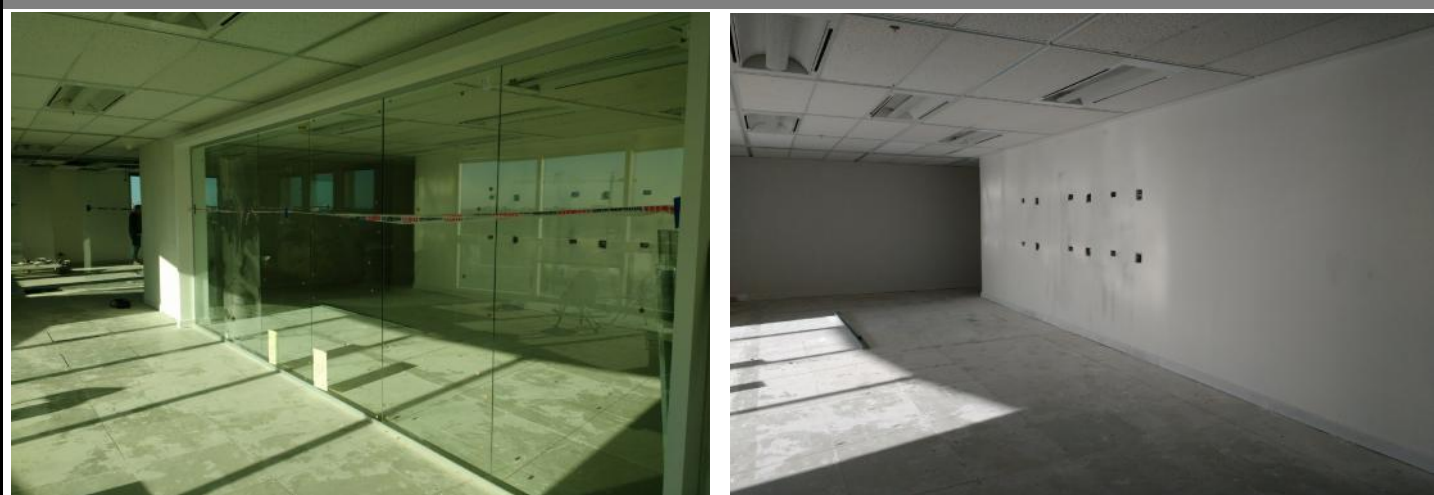


Instalación de vidrios y pintura del Hubgrade



Instalación de vidrios.




Instalación de vidrios y pintura de tabiques.

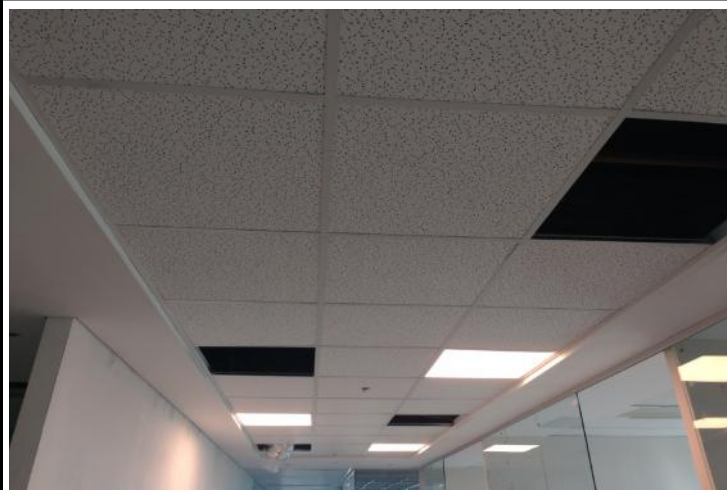

Instalación de cielorraso desmontable nuevo.



Instalación de cielorraso desmontable y montaje de artefactos de iluminación existentes.

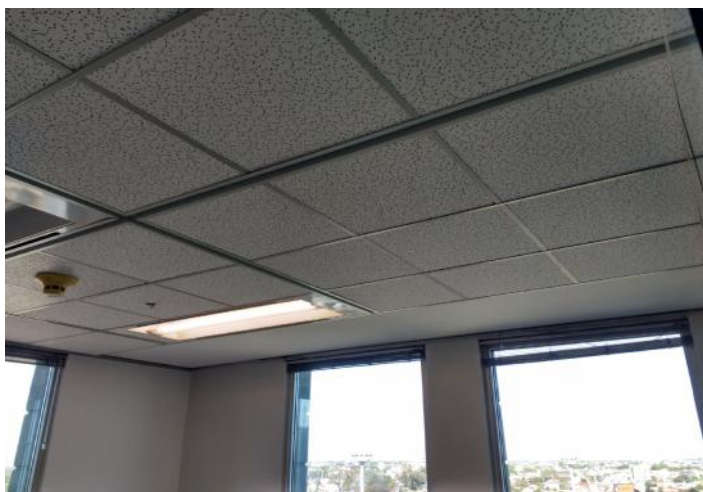

Instalación de cielorraso desmontable y montaje de artefactos de iluminación existentes.

RESUMEN DE AVANCE

| Ítem | Detalle de tareas en curso               |          |
|------|------------------------------------------|----------|
| 1    | Cableado de UTP                          | CONTRACT |
| 2    | Colocación de vidrios, paños fijos       | CONTRACT |
| 3    | Emplacado de cielorraos desmontables     | CONTRACT |
| 4    | Nivelación y cierre de piso técnico      | CONTRACT |
| 5    | Instalación de artefactos de iluminación | CONTRACT |
| 6    | Montaje de equipos y conductos de A-A    | CONTRACT |

| Ítem | Detalle de eventos especiales                                                                                                              |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1    | MUDANZA CLIENTE 31/10/2017 - Fecha reprogramada al 31-10, quedando instalación de muebles especiales y de línea más cableado para el 15-11 |  |
| 2    | VINCULACION ENTRE PISOS POR CUESTION DE CONTRATACION DE SEGURIDAD, PROGRAMADO PARA EL 21-10                                                |  |
| 3    | DEFINICION DE VINILOS EN HUBGRADE                                                                                                          |  |

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

| Item | Detalle                          | Responsable |
|------|----------------------------------|-------------|
| 1    | Instalación de alfombra          | CONTRACT    |
| 2    | Limpieza final                   | CONTRACT    |
| 3    | Instalación de puertas de vidrio | CONTRACT    |
| 4    | Instalación de vinilos           | CONTRACT    |

HITOS Y DEADLINES

| Status | Rubros                 | Fecha      | Comentarios                        | Responsable |
|--------|------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
|        | Colocación de alfombra | 24/10/2017 | A confirmar según avances          | CONTRACT    |
|        | Vinilos de impresión   | 09/10/2017 | A confirmar cliente/ Sin respuesta | VEOLIA      |
