



OBRA PDVSA - AV. LIBERTADOR 602 PISO 20 CAPITAL FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 02 - LUNES 26/01 AL SÁBADO 31/01

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA




PICADO DE CARPETA EN HALL ASCENSORES PARA COLOCACIÓN DE
NUEVO PORCELLANATTO



EJECUCIÓN DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS - EMPLACADO DE
PRIMERA CARA



EJECUCIÓN DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS - EMPLACADO DE
PRIMERA CARA

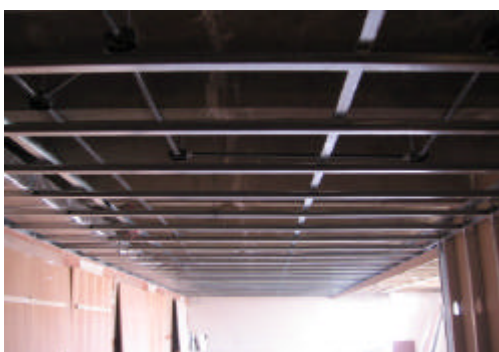

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELORRASOS



DESARMADO DE MUEBLES CUBRE FANCOIL, PROTECCIÓN DE LOS APARATOS, PRUEBA DE DRENAJES Y NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA



MONTAJE DE NUEVAS CAÑERÍAS METÁLICAS PARA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y CABLEADO SEGÚN NORMAS VIGENTES



PICADO DE CONTRAPISO PARA EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL BAJO ARCHIVOS DESLIZANTES



MONTAJE DE CHICOTES HEMBRA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN SEGÚN NORMAS VIGENTES



NUEVO ACOPIO DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE NUEVOS TABIQUES Y CIELORRASOS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA ENTRANTE

INSTALACION DE CAJAS Y CANALIZACIONES POR PISO PARA NUEVA INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO
INSTALACION DE CAÑERÍAS Y CABLEADO POR NUEVOS TABIQUES
EMPLACADO DE SEGUNDA CARA DE TABIQUES DIVISORIOS
EJECUCION DE AJUSTES PERIMETRALES EN CIELORRASOS
BAJADA DE ESCOMBROS A VOLQUETES
LIMPIEZA DE OBRA
INSTALACION DERIVACIONES CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO
PUESTA A PUNTO DE SALAS DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO
