

FECHA 11/06/14

LUGAR Zonamérica, edif. @1, of 307

CLIENTE UBS Financial Services

OBRA Zonamérica, edif. @1, of 303-304-305-306

Empresa

UBS

Email

Alejandro.plevak@ubs.com
hiram.coubertier@ubs.com

Integrantes

Alejandro Plevak
Hiram Coubertier

Contract

ccapouya@contract.com.uy

Carolina Capouyá

ACTIVITY	RESPONSIBLE	TARGET	STATUS	OBSERVATIONS
Kick-off	CONTRACT	May 12	Completed	
Delivery of works	CONTRACT	July 10	In progress	
Fire detection plan	ZONAMERICA	May 19	In progress	Stage 1: completed. Works are expected to be finished by 28/05.
Send originals of signed docs	UBS		Pending	Requirement for issuing invoices to UBS
Give feedback on contract by lawyers	UBS		Pending	Requirement for issuing invoices to UBS
New quote requested	UBS/CONTRACT		In progress	1. TVs will be purchased directly by UBS 2. Fix projector to ceiling in existing meeting room, provide conduits to connect to computer 3. Chair for Alejandro Plevak 4. Magazine holders in expansion area and in existing office (180 magazines) 5. Full glazed vinyl in glass partition behind existing reception
Construction progress	CONTRACT		In progress	6. Gypsum surfaces are being prepared for future paint 7. Electrical works: conduits 100% completed, cabling in process 8. Data cabling entered June 10 9. Structure of modular ceiling 100% complete

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.


Redactada por: Carolina Capouyá

1320-MIN-140611

				10. Light fixtures are being placed 11. Carpet on site 12. Graphic design on vynyis approved 13. Construction strike in Zonamerica – works interrupted on June 10
	UBS		Warning	UBS personnel safety: Visits to the site must be planned. People must wear helmets.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

Images June 11, 2014

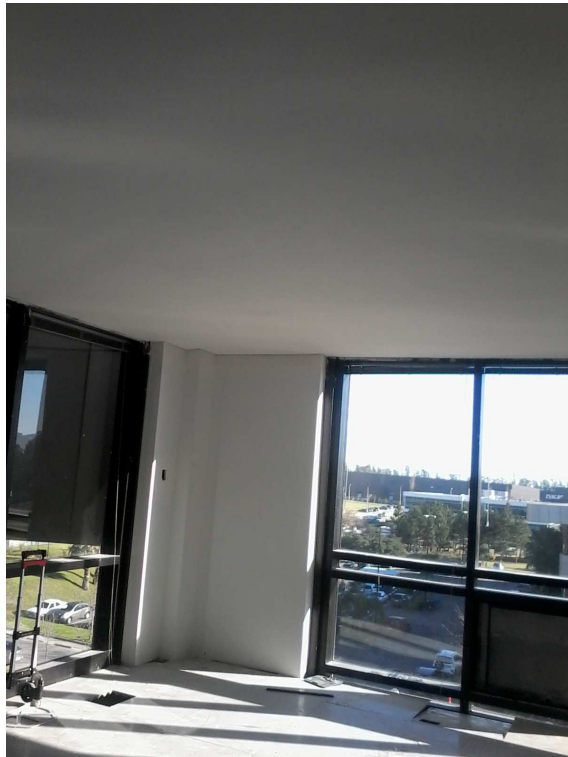

Gypsum surfaces (partitions and ceiling) are being prepared for future paint


Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



Carpet on site



Light fixtures on site

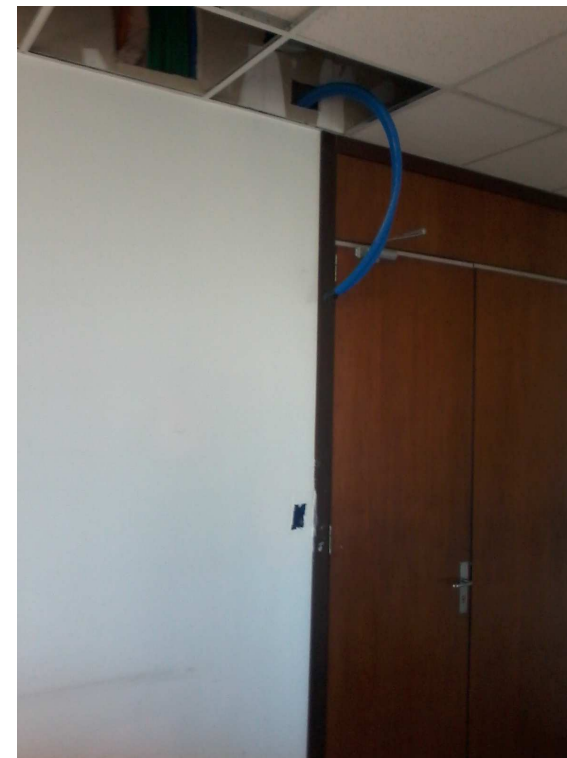

Access control

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.
