

**BAYER – Minuta 8 - Reunión 31-05-2017**

Redactada por: Juan Pablo Santilli

FECHA: 31/05/17**CLIENTE:** BAYER**OBRA:** Oficinas MUNRO**PARTICIPANTES:**

Eduardo Irvine Reid, BAYER
Juan Pablo Santilli, CONTRACT
Ricardo Vanarelli, CONTRACT
Andrea Simboli, CONTRACT
Federico Chaplin, CONTRACT

1- TEMAS TRATADOS**1. CRONOGRAMA**

Contract presentó el informe de avance de obra y el cronograma actualizado en el que se informa que existen 2 semanas de desvío por causas ajenas a Contract. La fecha actualizada de entrega de la etapa 1 es el 15 de julio de 2017. Contract solicita a Bayer retirar el equipamiento acopiado antes del lunes 5/6/17 para mantener esta nueva fecha de entrega.

2. ADICIONAL AIRE ACONDICIONADO

Bayer aprobó el presupuesto adicional de aire acondicionado presentado. En el mismo se contemplan dos unidades de 12TR en lugar de una de 20TR que puedan ser puestas en marcha de la siguiente manera: Unidad 1 en etapa 1 y 2 y Unidad 2 en la etapa 3 más la futura etapa 4 (etapa fuera del alcance de la presente obra)

3. ECONOMÍAS Y DEMASIAS 1

Bayer aprobó el presupuesto presentado por la economías y demasías en función de los detallado en la minuta 7 ítem 5. Bayer observó el costo del mueble del modificado del coffee por lo que se revisará con el proveedor el mismo. Bayer informó que una vez recibido el balance lo enviará a Compras el presupuesto para el cierre definitivo.

4. REVESTIMIENTOS DE COLUMNAS

Se aprobó el revestimiento Vescom solo para el hall de acceso y el área social. El resto de las columnas serán pintadas del mismo color al revestimiento sugerido.

5. COMPLEMENTOS


Contract presentó los presupuestos por los complementos para los puestos de trabajo y área social para aprobación de Bayer. Se informó acerca de la demora de los mismos por lo que se sugirió la definición en los próximos días.

BAYER – Minuta 8 - Reunión 31-05-2017

Redactada por: Juan Pablo Santilli

6. PUESTOS DE TRABAJO

Se solicitó un toma eléctrico normal adicional en cada puesto de trabajo y se definió que el cable de datos quede por fuera de el bastidor de tomas. Se analizará el impacto y se presentará la cotización respectiva. El armado estará de acuerdo con la foto adjunta. Los tomas estabilizados (color rojo) se instalarán en uno de los extremos.

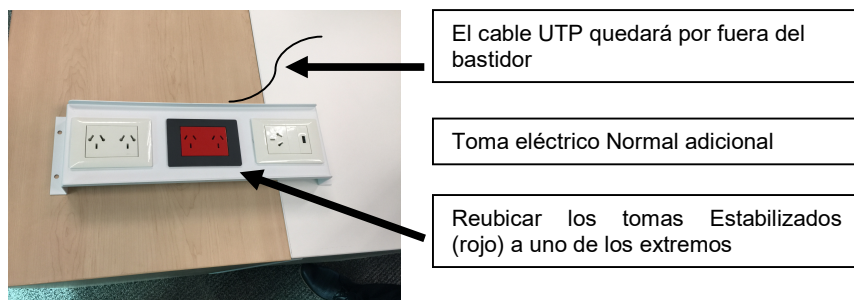

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto.
