

REPORTE SEMANAL



INFORME 02



Fecha Reporte	23/02/2018
Proyecto	NUEVAS OFICINAS VESTAS
Ubicación	Carlos Pellegrini 1023 piso 10
Contacto Cliente:	Luis Morán Mora

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las oficinas constan de sala de reuniones de 12 personas, sala de reuniones de 8 personas, 1 privado para gerente, salas de reuniones 4 personas, 1 sala de IT, 1 coffee, 1 recepción, 36 puestos operativos, 2 phone booth y baños existentes.

FOTOS Y DESCRIPCION



CAÑERÍAS DE ILUMINACION EN LOSA



TABIQUE DE ROCA DE YESO - ESTRUCTURA Y 1 PLACA



TABIQUE DE ROCA DE YESO - ESTRUCTURA Y 1 PLACA

REPORTE SEMANAL



INFORME 02



TABIQUE DE ROCA DE YESO - ESTRUCTURA Y 1 PLACA - REVOQUES EN BAÑOS



DESMONTE DE REVESTIMIENTOS EN BAÑOS EXISTENTES

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Picado para canalizaciones
2	Replanteo y ejecución de estructura de tabique de roca de yeso
3	Tabique de roca de yeso - Emplaque 1° cara
4	Cañerías eléctricas en losa

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Cieloraso de roca de yeso - Ejecución de estructura	
2	Instalación sanitaria para coffee	
3	Instalación sanitaria para dispenser	
4		

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	Adicionales	26/02/2018	Se enviará presupuesto de adicionales por adelanto de fecha de entrega 23-03	Contract
2	Wifi - cctv - armado de rack -CA	26/02/2018	Vestas enviará ubicación de instalaciones en planos esquemáticos	Vestas
3	Informe de avance comparativo	25/02/2018	Se enviara informe con condiciones de entrega al 23/3 y al 30/3 para evaluacion	Contract
3	Recorrida de obra	07/03/2018	Revision status de obra previo a mudanza	A confirmar por Luis


REPORTE SEMANAL



INFORME 02



AVANCE DE OBRA

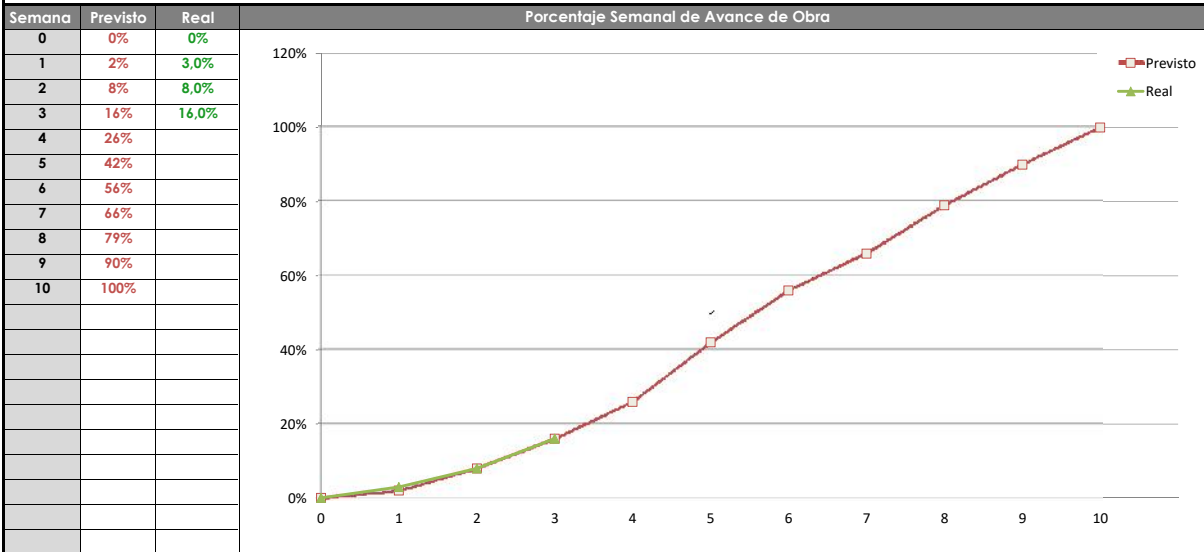

FIN DEL DOCUMENTO
