

OBRA PAREXEL AVDA. LIBERTADOR 7270 PISO 5° CABA
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 06 - LUNES 11/01 AL SÁBADO 16/01

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA



SE REALIZO LA INSTALACION DE LA TABIQUERIA DE CRISTAL TEMPLADO, COMPUESTO POR VIDRIO TEMPLADO 10 MM Y PERFIL PERIMETRAL "U" DE ALUMINIO 15X40 MM



SE REALIZO LA INSTALACION DEL PISO FLOTANTE



SE REALIZO LA ENTREGA E INSTALACION DE LA PUERTA PLACA MELAMINADA PARA LA SALA DE SERVIDORES




SE REALIZO LA INSTALACION DEL RACK, DENTRO DE ESTA SE EJECUTO LA COLOCACION DEL PISO VINILICO EN BALDOZAS 30X30



SE ENTREGO LA ALFOMBRA PARA SU COLOCACION



SE PUSIERON EN MARCHA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SU VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO

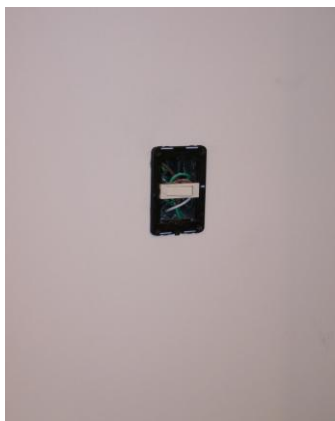

SE COMINEZA CON LA INSTALACION DE EFECTOS DE LUZ



SE REALIZO LA LIMPIEZA DE CAJAS DE PISO



SE PUSO EN FUNCIONAMIENTO EQUIPO DE AA SPLIT PARA SALA DE SERVIDORES, SE COLOCA BOMBA DE CONDENSADO PARA MEJOR DRENAJE DEL SISTEMA



SE PREPARO SUPERFICIE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LA ALFOMBRA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA ENTRANTE

INSTALACION DE ALFOMBRA
INSTALACION DE DEFINITIVA DEL RACK
FINALIZACION DE INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
FINALIZACION DE LA COLOCACION DE MUEBLES ESPECIALES Y PUERTAS DE MADERA DE SALA DE ARCHIVOS
INSTALACION DE CORTINAS
INSTALACION DE FILMS ESMERILADOS
COLOCACION DE PERISCOPIOS
INSTALACION DE GRANITO PARA MESADA CAFETERIA

VISTAS GENERALES DE LA OBRA

