

BASF - TUCUMÁN 1 PISOS 5, 17 Y 18 CAPITAL FEDERAL
REPORTE SEMANAL 01 - PERÍODO DEL 17/03 AL 27/03

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



DESMONTAJE DE CIELORRASOS MODULARES Y DE INSTALACIONES
SOBRE CIELORRASO



DESMONTAJE PARCIAL DE CIELORRASOS MODULARES PARA
RECABLEADO DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN



DESMONTAJE DE CAJAS DE PISO EXISTENTES PARA REPARACIÓN DE
PLACAS




DESMONTAJE DE ALFOMBRA MODULAR EXISTENTE PARA SU REEMPLAZO



DESCABLEADO DE INSTALACIONES EXISTENTES BAJO PISO TÉCNICO



DESMONTAJE DE TABIQUERÍA MODULAR EXISTENTE Y REEMPLAZO DE CRISTALES PARA SU REUTILIZACIÓN

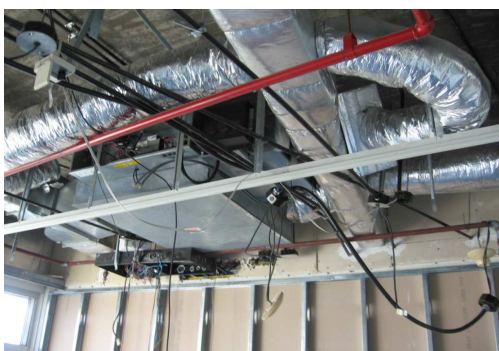

DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOBRE CIELORRASOS



ESCALERA DE CRISTAL TEMPLADO Y ACERO EXISTENTE A REACONDICIONAR



DESMONTAJE PARCIAL DE CIELORRASOS PARA MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO



EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NUEVA TABIQUERÍA EN PLACA DE ROCA DE YESO



EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NUEVA TABIQUERÍA EN PLACA DE ROCA DE YESO



EMPLACADO DE CARA UNO EN NUEVOS TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

DESMONTAJE PARCIAL DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA SU MODIFICACIÓN.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL INTERIOR DE LOS NUEVOS TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO.
RECABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOBRE CIELORRASO.
EMPLACADO DE CARA DOS EN NUEVOS TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO.
EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELORRASOS NUEVOS.
