


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 oct '09							11 oct		
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
1		OBRA NEXTEL	79 días	lun 05/10/09	lun 18/01/10										
2		ETAPA 1	21 días	lun 05/10/09	lun 02/11/09										
3		OBRAS DE CONSTRUCCION PROVISORIAS	3 días	lun 05/10/09	mié 07/10/09										
4		Cierre	2 días	mar 06/10/09	mié 07/10/09										
5		Instalación de bodega	2 días	mar 06/10/09	mié 07/10/09										
6		retiro de muebles	1 día	lun 05/10/09	lun 05/10/09										
7		OBRA GRUESA	8 días	jue 08/10/09	lun 19/10/09										
8		Demolición	2 días	jue 08/10/09	vie 09/10/09										
9		Trazado	2 días	lun 12/10/09	mar 13/10/09										
10		estructura de tabiques y viga	2 días	mié 14/10/09	jue 15/10/09										
11		tabique de volcometal	2 días	vie 16/10/09	lun 19/10/09										
12		TERMINACIONES	12 días	vie 16/10/09	lun 02/11/09										
13		CIELOS	8 días	vie 16/10/09	mar 27/10/09										
14		cielo de volcometal	2 días	vie 16/10/09	lun 19/10/09										
15		cenefa y viga de volcometal	3 días	vie 16/10/09	mar 20/10/09										
16		cielo americano	2 días	lun 26/10/09	mar 27/10/09										
17		PAVIMENTO	1 día	mié 28/10/09	mié 28/10/09										
18		Instalación de Alfombra	1 día	mié 28/10/09	mié 28/10/09										
19		Instalación de guardapolvo	1 día	mié 28/10/09	mié 28/10/09										
20		PINTURA	9 días	mié 21/10/09	lun 02/11/09										
21		preparación de supuerficie	3 días	mié 21/10/09	vie 23/10/09										
22		Pintura en tabique y cenefas	2 días	lun 26/10/09	mar 27/10/09										
23		Pintura en guardapolvo	2 días	jue 29/10/09	vie 30/10/09										
24		Barniz en puerta	2 días	vie 30/10/09	lun 02/11/09										
25		PUERTAS	3 días	mié 28/10/09	vie 30/10/09										
26		Instalación de puertas	2 días	mié 28/10/09	jue 29/10/09										
27		Instalación de quincallería	1 día	vie 30/10/09	vie 30/10/09										
28		VENTANAS Y ESPEJOS	3 días	lun 26/10/09	mié 28/10/09										
29		Instalación de cristales	2 días	lun 26/10/09	mar 27/10/09										
30		Instalación de film	1 día	mié 28/10/09	mié 28/10/09										
31		INSTALACIONES	14 días	lun 12/10/09	jue 29/10/09										
32		ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN	13 días	lun 12/10/09	mié 28/10/09										
33		Canalización	13 días	lun 12/10/09	mié 28/10/09										
34		Canalización por cielo	2 días	lun 12/10/09	mar 13/10/09										
35		Canalización perimetral	1 día	mar 20/10/09	mar 20/10/09										
36		Instalación de iluminación	1 día	mié 28/10/09	mié 28/10/09										
37		Cableado	8 días	mié 14/10/09	vie 23/10/09										
38		cableado estructurado por puestos	3 días	mié 21/10/09	vie 23/10/09										
39		Cableado iluminación	2 días	mié 14/10/09	jue 15/10/09										
40		SEGURIDAD	3 días	lun 12/10/09	mié 14/10/09										
41		Movimiento de camara existente	1 día	lun 12/10/09	lun 12/10/09										
42		Instalación de detector de humo	1 día	mié 14/10/09	mié 14/10/09										
43		Reubicación de sistema de robo	1 día	lun 12/10/09	lun 12/10/09										
44		AIRE ACONDICIONADO	2 días	mié 28/10/09	jue 29/10/09										
45		Movimiento de difusores	2 días	mié 28/10/09	jue 29/10/09										
46		ETAPA 2	16 días	mar 03/11/09	vie 20/11/09										
47		OBRAS DE CONSTRUCCION PROVISORIAS	3 días	mar 03/11/09	jue 05/11/09										
48		Cierre	2 días	mié 04/11/09	jue 05/11/09										
49		retiro de muebles	1 día	mar 03/11/09	mar 03/11/09										
50		OBRA GRUESA	5 días	vie 06/11/09	mié 11/11/09										
51		Demolición	1 día	vie 06/11/09	vie 06/11/09										
52		Trazado	0 días	vie 06/11/09	vie 06/11/09										
53		estructura de tabiques y viga	2 días	sáb 07/11/09	lun 09/11/09										
54		tabique de volcometal	2 días	mar 10/11/09	mié 11/11/09										
55		TERMINACIONES	9 días	mar 10/11/09	jue 19/11/09										
56		CIELOS	6 días	mar 10/11/09	lun 16/11/09										
57		cielo de volcometal	2 días	mar 10/11/09	mié 11/11/09										
58		cenefa y viga de volcometal	3 días	mar 10/11/09	jue 12/11/09										
59		cielo americano	2 días	sáb 14/11/09	lun 16/11/09										
60		PAVIMENTO	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09										
61		Instalación de Alfombra	1 día	mar 17/11/09	mar 17/11/09										
62		Instalación de guardapolvo	1 día	mié 18/11/09	mié 18/11/09										
63		PINTURA	7 días	jue 12/11/09	jue 19/11/09										
64		preparación de supuerficie	2 días	jue 12/11/09	vie 13/11/09										



Proyecto: Programación 3 dic
Fecha: lun 07/12/09

Tarea	
Tarea crítica	
Progreso	
Hito	
Resumen	

Tarea resumida	
Tarea crítica resumida	
Hito resumido	
Progreso resumido	
División	

Tareas externas	
Resumen del proyecto	
Agrupar por síntesis	
Fecha límite	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 oct '09							11 oct		
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
65		Pintura en tabique y cenefas	2 días	sáb 14/11/09	lun 16/11/09										
66		Pintura en guardapolvo	1 día	jue 19/11/09	jue 19/11/09										
67		Barniz en puerta	1 día	jue 19/11/09	jue 19/11/09										
68		PUERTAS	2 días	mié 18/11/09	jue 19/11/09										
69		Instalación de puertas	1 día	mié 18/11/09	mié 18/11/09										
70		Instalación de quincallería	1 día	jue 19/11/09	jue 19/11/09										
71		VENTANAS Y ESPEJOS	4 días	sáb 14/11/09	mié 18/11/09										
72		Instalación de cristales	3 días	sáb 14/11/09	mar 17/11/09										
73		Instalación de film	1 día	mié 18/11/09	mié 18/11/09										
74		INSTALACIONES	12 días	sáb 07/11/09	vie 20/11/09										
75		ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN	9 días	sáb 07/11/09	mar 17/11/09										
76		Canalización	9 días	sáb 07/11/09	mar 17/11/09										
77		Canalización por cielo	2 días	sáb 07/11/09	lun 09/11/09										
78		Canalización perimetral	1 día	jue 12/11/09	jue 12/11/09										
79		Instalación de iluminación	1 día	mar 17/11/09	mar 17/11/09										
80		Cableado	6 días	mar 10/11/09	lun 16/11/09										
81		cableado estructurado por puestos	3 días	vie 13/11/09	lun 16/11/09										
82		Cableado iluminación	2 días	mar 10/11/09	mié 11/11/09										
83		SEGURIDAD	1 día	mar 10/11/09	mar 10/11/09										
84		Instalación de detector de humo	1 día	mar 10/11/09	mar 10/11/09										
85		AIRE ACONDICIONADO	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09										
86		Movimiento de difusores	2 días	mar 17/11/09	mié 18/11/09										
87		ASEO FINAL ETAPA 2	1 día	vie 20/11/09	vie 20/11/09										
88		Aseo final	1 día	vie 20/11/09	vie 20/11/09										
89		ETAPA 3	29 días	vie 20/11/09	lun 28/12/09										
90		INICIO	0 días	vie 20/11/09	vie 20/11/09										
91		OBRAS DE CONSTRUCCION PROVISORIAS	1 día	sáb 21/11/09	sáb 21/11/09										
92		Cierre	1 día	sáb 21/11/09	sáb 21/11/09										
93		OBRA GRUESA	8 días	sáb 21/11/09	lun 30/11/09										
94		Demolición	8 días	sáb 21/11/09	lun 30/11/09										
95		Trazado	2 días	sáb 21/11/09	lun 23/11/09										
96		estructura de tabiques y viga	3 días	mar 24/11/09	jue 26/11/09										
97		tabique de volcometal	3 días	vie 27/11/09	lun 30/11/09										
98		TERMINACIONES	23 días	vie 27/11/09	sáb 26/12/09										
99		CIELOS	13 días	vie 27/11/09	sáb 12/12/09										
100		cielo de volcometal	3 días	vie 27/11/09	lun 30/11/09										
101		cielo americano	3 días	jue 10/12/09	sáb 12/12/09										
102		PAVIMENTO	7 días	sáb 05/12/09	lun 14/12/09										
103		Instalación de Alfombra	2 días	vie 11/12/09	sáb 12/12/09										
104		Instalación de guardapolvo	1 día	lun 14/12/09	lun 14/12/09										
105		instalación de porcelanato	5 días	sáb 05/12/09	vie 11/12/09										
106		REVESTIMIENTO	5 días	sáb 12/12/09	jue 17/12/09										
107		Instalación de porcelanato	5 días	sáb 12/12/09	jue 17/12/09										
108		PINTURA	12 días	mar 01/12/09	mar 15/12/09										
109		preparación de superficie	3 días	mar 01/12/09	jue 03/12/09										
110		Pintura en tabique y cenefas	5 días	vie 04/12/09	jue 10/12/09										
111		Pintura en guardapolvo	1 día	mar 15/12/09	mar 15/12/09										
112		Barniz en puerta	2 días	vie 11/12/09	sáb 12/12/09										
113		PUERTAS	4 días	lun 07/12/09	vie 11/12/09										
114		Instalación de puertas	3 días	lun 07/12/09	jue 10/12/09										
115		Instalación de quincallería	1 día	vie 11/12/09	vie 11/12/09										
116		INSTALACIÓN DE MUEBLES ESPECIALES	10 días	lun 14/12/09	sáb 26/12/09										
117		Retiro mueble recepción existente	1 día	mar 22/12/09	mar 22/12/09										
118		Instalación de muebles secretaria	2 días	mié 23/12/09	sáb 26/12/09										
119		Instalación de closet	4 días	lun 14/12/09	jue 17/12/09										
120		Instalación de enchape	6 días	vie 18/12/09	sáb 26/12/09										
121		INSTALACIONES	26 días	mié 25/11/09	lun 28/12/09										
122		ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN	20 días	mar 01/12/09	sáb 26/12/09										
123		Canalización	15 días	mar 01/12/09	vie 18/12/09										
124		Canalización por cielo	2 días	mar 01/12/09	mié 02/12/09										
125		Instalación de iluminación	5 días	lun 14/12/09	vie 18/12/09										
126		Cableado	18 días	jue 03/12/09	sáb 26/12/09										
127		Descableado de recepción secretaria	1 día	lun 21/12/09	lun 21/12/09										
128		cableado estructurado por puestos secretaria	1 día	sáb 26/12/09	sáb 26/12/09										

Proyecto: Programación 3 dic

Fecha: lun 07/12/09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 2

		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 oct '09							11 oct		
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
129		Cableado iluminación	2 días	jue 03/12/09	vie 04/12/09										
130		SEGURIDAD	1 día	jue 03/12/09	jue 03/12/09										
131		Instalación de detector de humo	1 día	jue 03/12/09	jue 03/12/09										
132		AIRE ACONDICIONADO	17 días	mié 25/11/09	mar 15/12/09										
133		Perforación en losa	1 día	mié 25/11/09	mié 25/11/09										
134		Canalización	2 días	jue 26/11/09	vie 27/11/09										
135		Instalación de equipo split	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09										
136		INSTALACIÓN SANITARIA	16 días	mar 01/12/09	sáb 19/12/09										
137		instalación de alcantarillado y agua potable	4 días	mar 01/12/09	vie 04/12/09										
138		Instalación de wc	2 días	vie 18/12/09	sáb 19/12/09										
139		instalación lavamanos	2 días	vie 04/12/09	sáb 05/12/09										
140		Instalación estructura metálica	2 días	mié 02/12/09	jue 03/12/09										
141		ASEO FINAL ETAPA 3	1 día	lun 28/12/09	lun 28/12/09										
142		Aseo	1 día	lun 28/12/09	lun 28/12/09										
143		ETAPA 4	16 días	mié 23/12/09	lun 18/01/10										
144		Inicio	0 días	mié 23/12/09	mié 23/12/09										
145		OBRAS DE CONSTRUCCION PROVISORIAS	1 día	mié 23/12/09	mié 23/12/09										
146		Cierre	1 día	mié 23/12/09	mié 23/12/09										
147		retiro de muebles	1 día	mié 23/12/09	mié 23/12/09										
148		OBRA GRUESA	4 días	mié 23/12/09	mar 29/12/09										
149		Demolición	2 días	mié 23/12/09	sáb 26/12/09										
150		Trazado	0 días	sáb 26/12/09	sáb 26/12/09										
151		estructura de tabiques y viga	2 días	lun 28/12/09	mar 29/12/09										
152		TERMINACIONES	11 días	mié 30/12/09	vie 15/01/10										
153		CIELOS	11 días	mié 30/12/09	vie 15/01/10										
154		cenefa y viga de volcometal	2 días	mié 30/12/09	lun 04/01/10										
155		cielo americano	2 días	jue 14/01/10	vie 15/01/10										
156		PAVIMENTO	3 días	lun 11/01/10	mié 13/01/10										
157		Instalación de Alfombra	3 días	lun 11/01/10	mié 13/01/10										
158		Instalación de guardapolvo	2 días	mar 12/01/10	mié 13/01/10										
159		PINTURA	8 días	mar 05/01/10	jue 14/01/10										
160		preparación de superficie	2 días	mar 05/01/10	mié 06/01/10										
161		Pintura en muros	2 días	jue 07/01/10	vie 08/01/10										
162		Pintura en guardapolvo	1 día	jue 14/01/10	jue 14/01/10										
163		VENTANAS Y ESPEJOS	3 días	jue 07/01/10	lun 11/01/10										
164		Instalación de cristales	2 días	jue 07/01/10	vie 08/01/10										
165		Instalación de film	1 día	lun 11/01/10	lun 11/01/10										
166		INSTALACIONES	14 días	lun 28/12/09	lun 18/01/10										
167		ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN	13 días	lun 28/12/09	vie 15/01/10										
168		Canalización	13 días	lun 28/12/09	vie 15/01/10										
169		Canalización por cielo	2 días	lun 28/12/09	mar 29/12/09										
170		Canalización perimetral	1 día	mié 30/12/09	mié 30/12/09										
171		Instalación de iluminación	1 día	vie 15/01/10	vie 15/01/10										
172		Cableado	3 días	mié 30/12/09	mar 05/01/10										
173		cableado estructurado por puestos	2 días	lun 04/01/10	mar 05/01/10										
174		Cableado iluminación	1 día	mié 30/12/09	mié 30/12/09										
175		SEGURIDAD	1 día	mié 30/12/09	mié 30/12/09										
176		Instalación de detector de humo	1 día	mié 30/12/09	mié 30/12/09										
177		AIRE ACONDICIONADO	1 día	vie 15/01/10	vie 15/01/10										
178		Movimiento de difusores	1 día	vie 15/01/10	vie 15/01/10										
179		ASEO FINAL ETAPA 4	1 día	lun 18/01/10	lun 18/01/10										
180		Aseo	1 día	lun 18/01/10	lun 18/01/10										
181		ETAPA 5	5 días	vie 20/11/09	mié 25/11/09										
182		Inicio	0 días	vie 20/11/09	vie 20/11/09										
183		OBRAS DE CONSTRUCCION PROVISORIAS	1 día	vie 20/11/09	vie 20/11/09										
184		retiro de muebles	1 día	vie 20/11/09	vie 20/11/09										
185		DEMOLICIÓN	1 día	sáb 21/11/09	sáb 21/11/09										
186		Retiro de alfombra	1 día	sáb 21/11/09	sáb 21/11/09										
187		INSTALACIONES	5 días	vie 20/11/09	mié 25/11/09										
188		ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN	5 días	vie 20/11/09	mié 25/11/09										
189		Canalización	4 días	vie 20/11/09	mar 24/11/09										
190		Descableado de mobiliario	1 día	vie 20/11/09	vie 20/11/09										
191		Canalización perimetral	1 día	sáb 21/11/09	sáb 21/11/09										
192		Canalización por mobiliario	1 día	mar 24/11/09	mar 24/11/09										

Proyecto: Programación 3 dic

Fecha: lun 07/12/09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido


División

Tareas externas

Resumen del proyecto


Agrupar por síntesis

Fecha límite

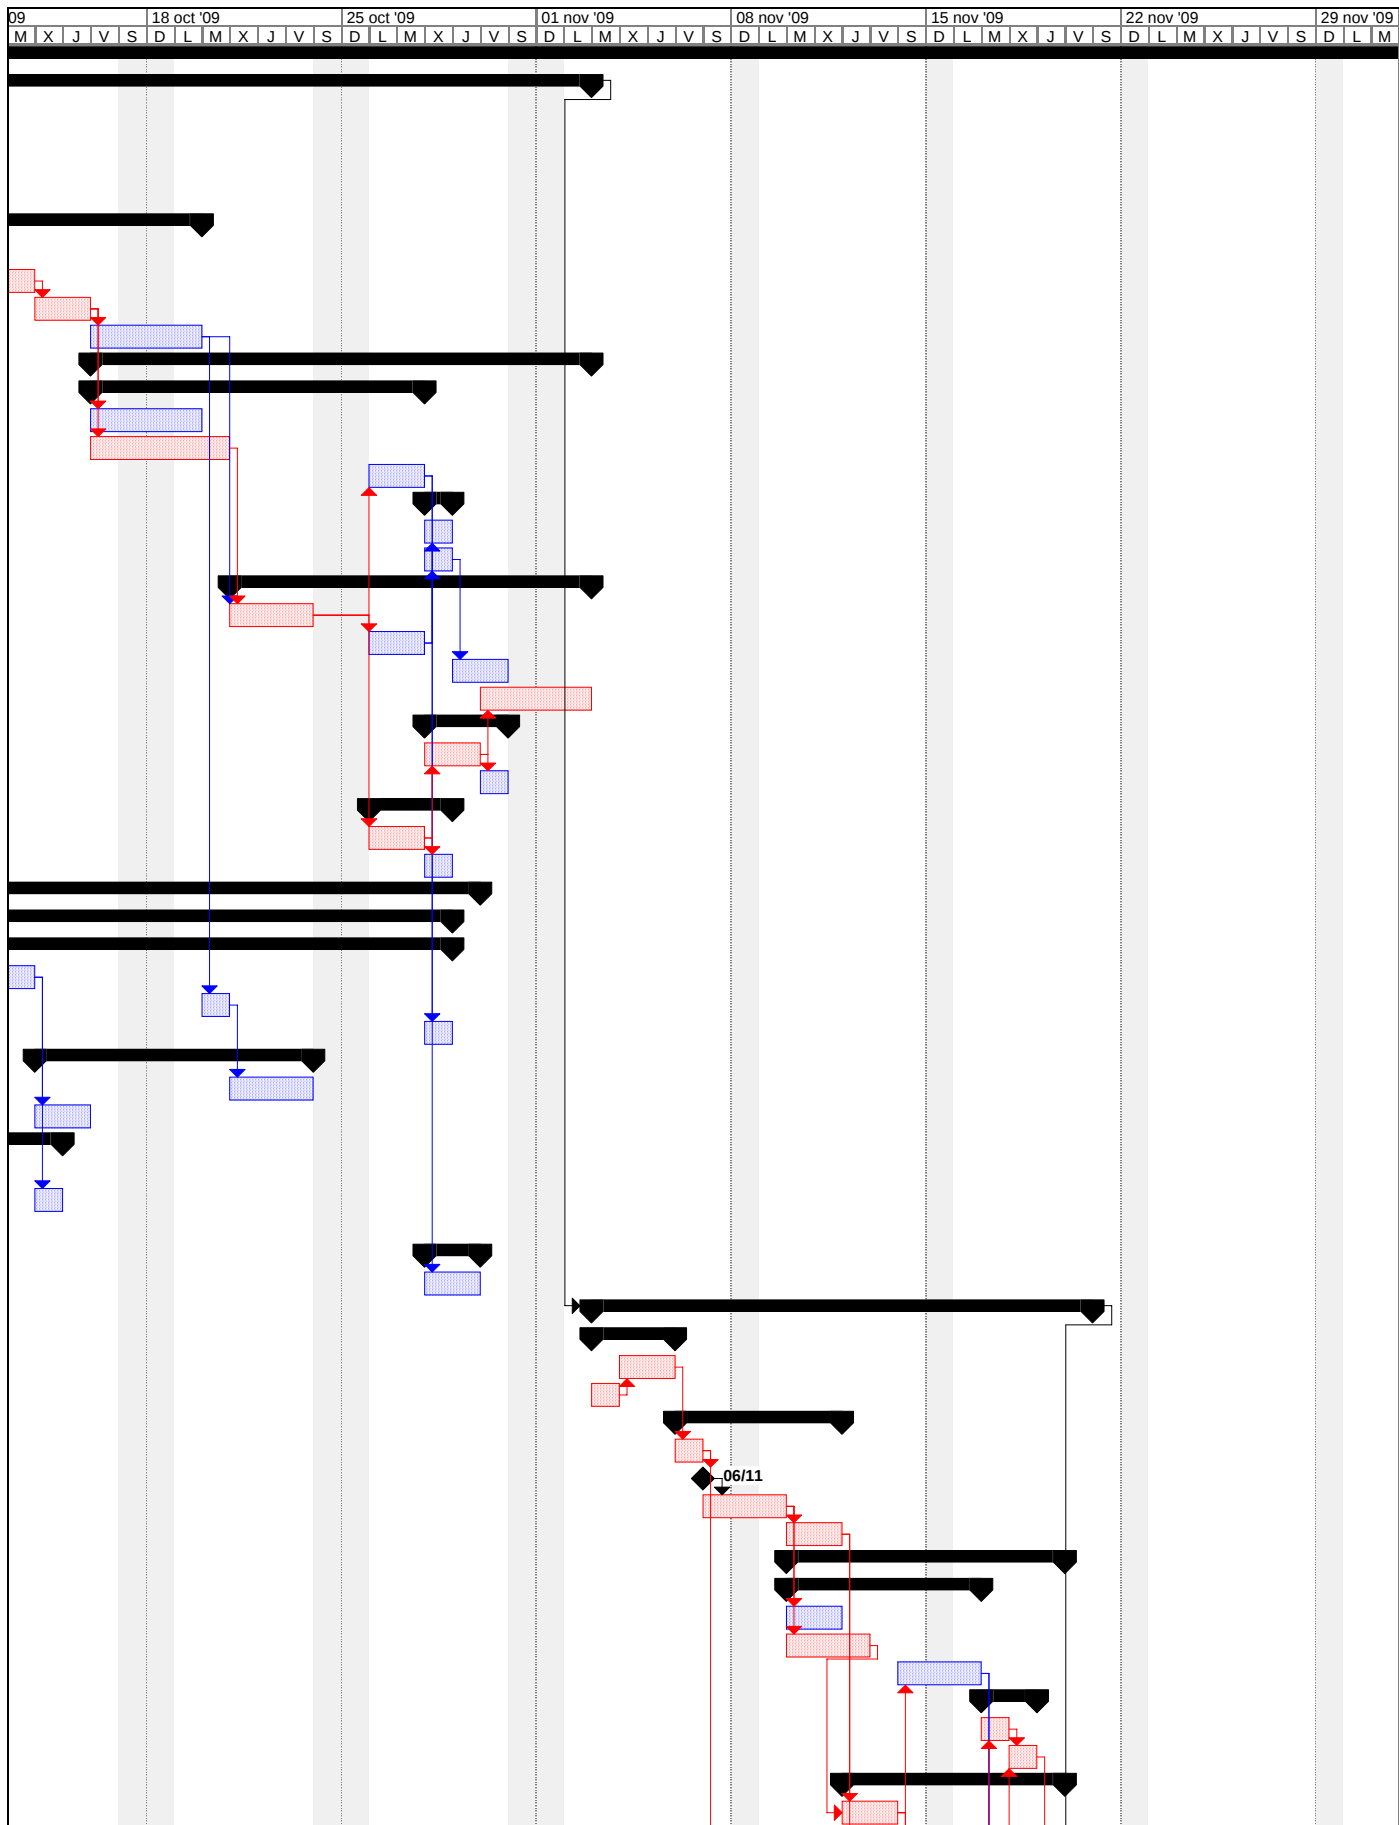


Proyecto: Programación 3 dic
Fecha: lun 07/12/09

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			

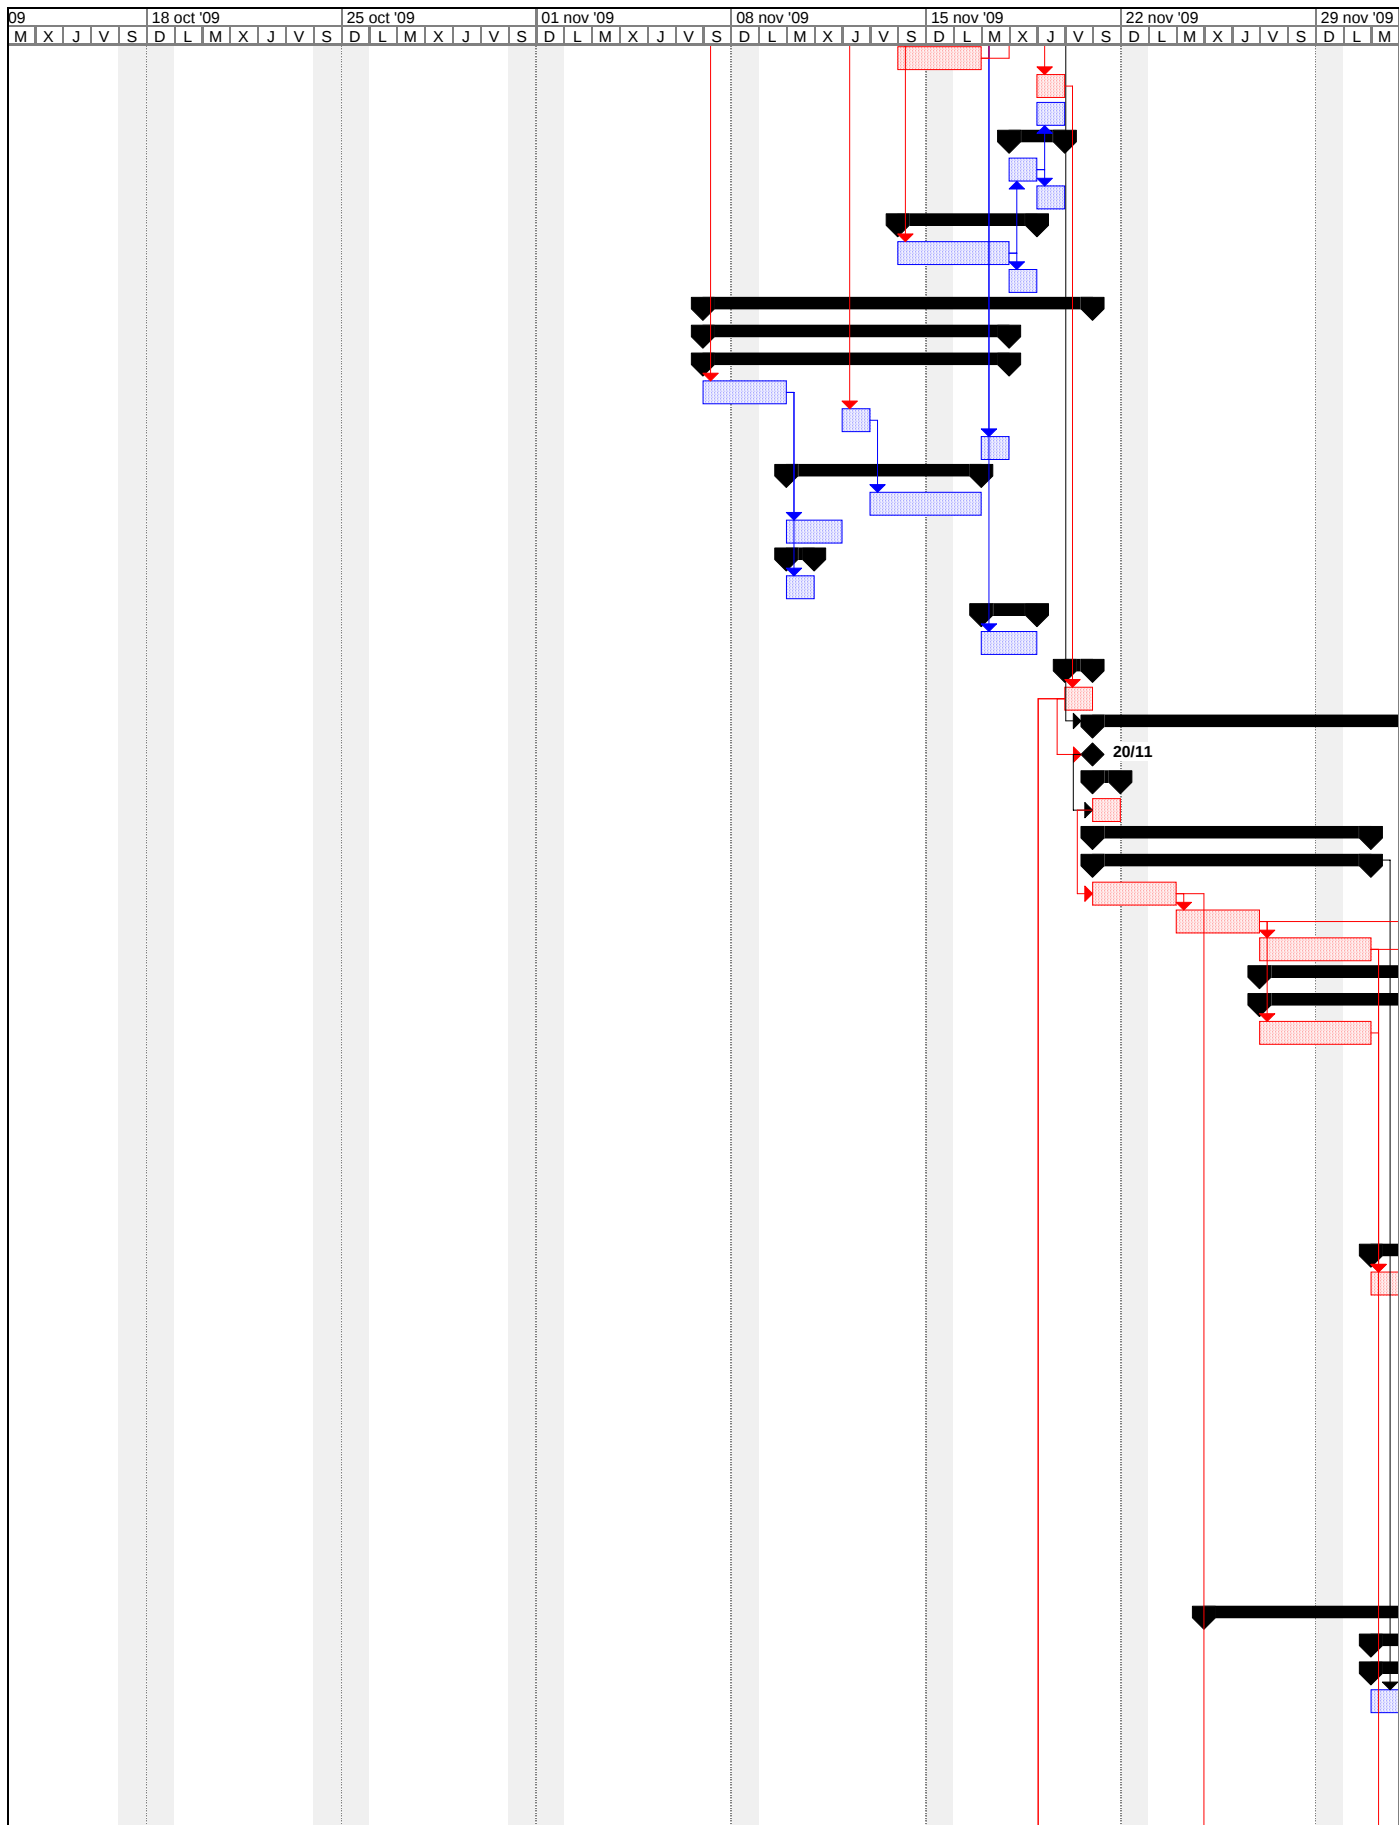


Proyecto: Programación 3 dic
Fecha: lun 07/12/09

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			

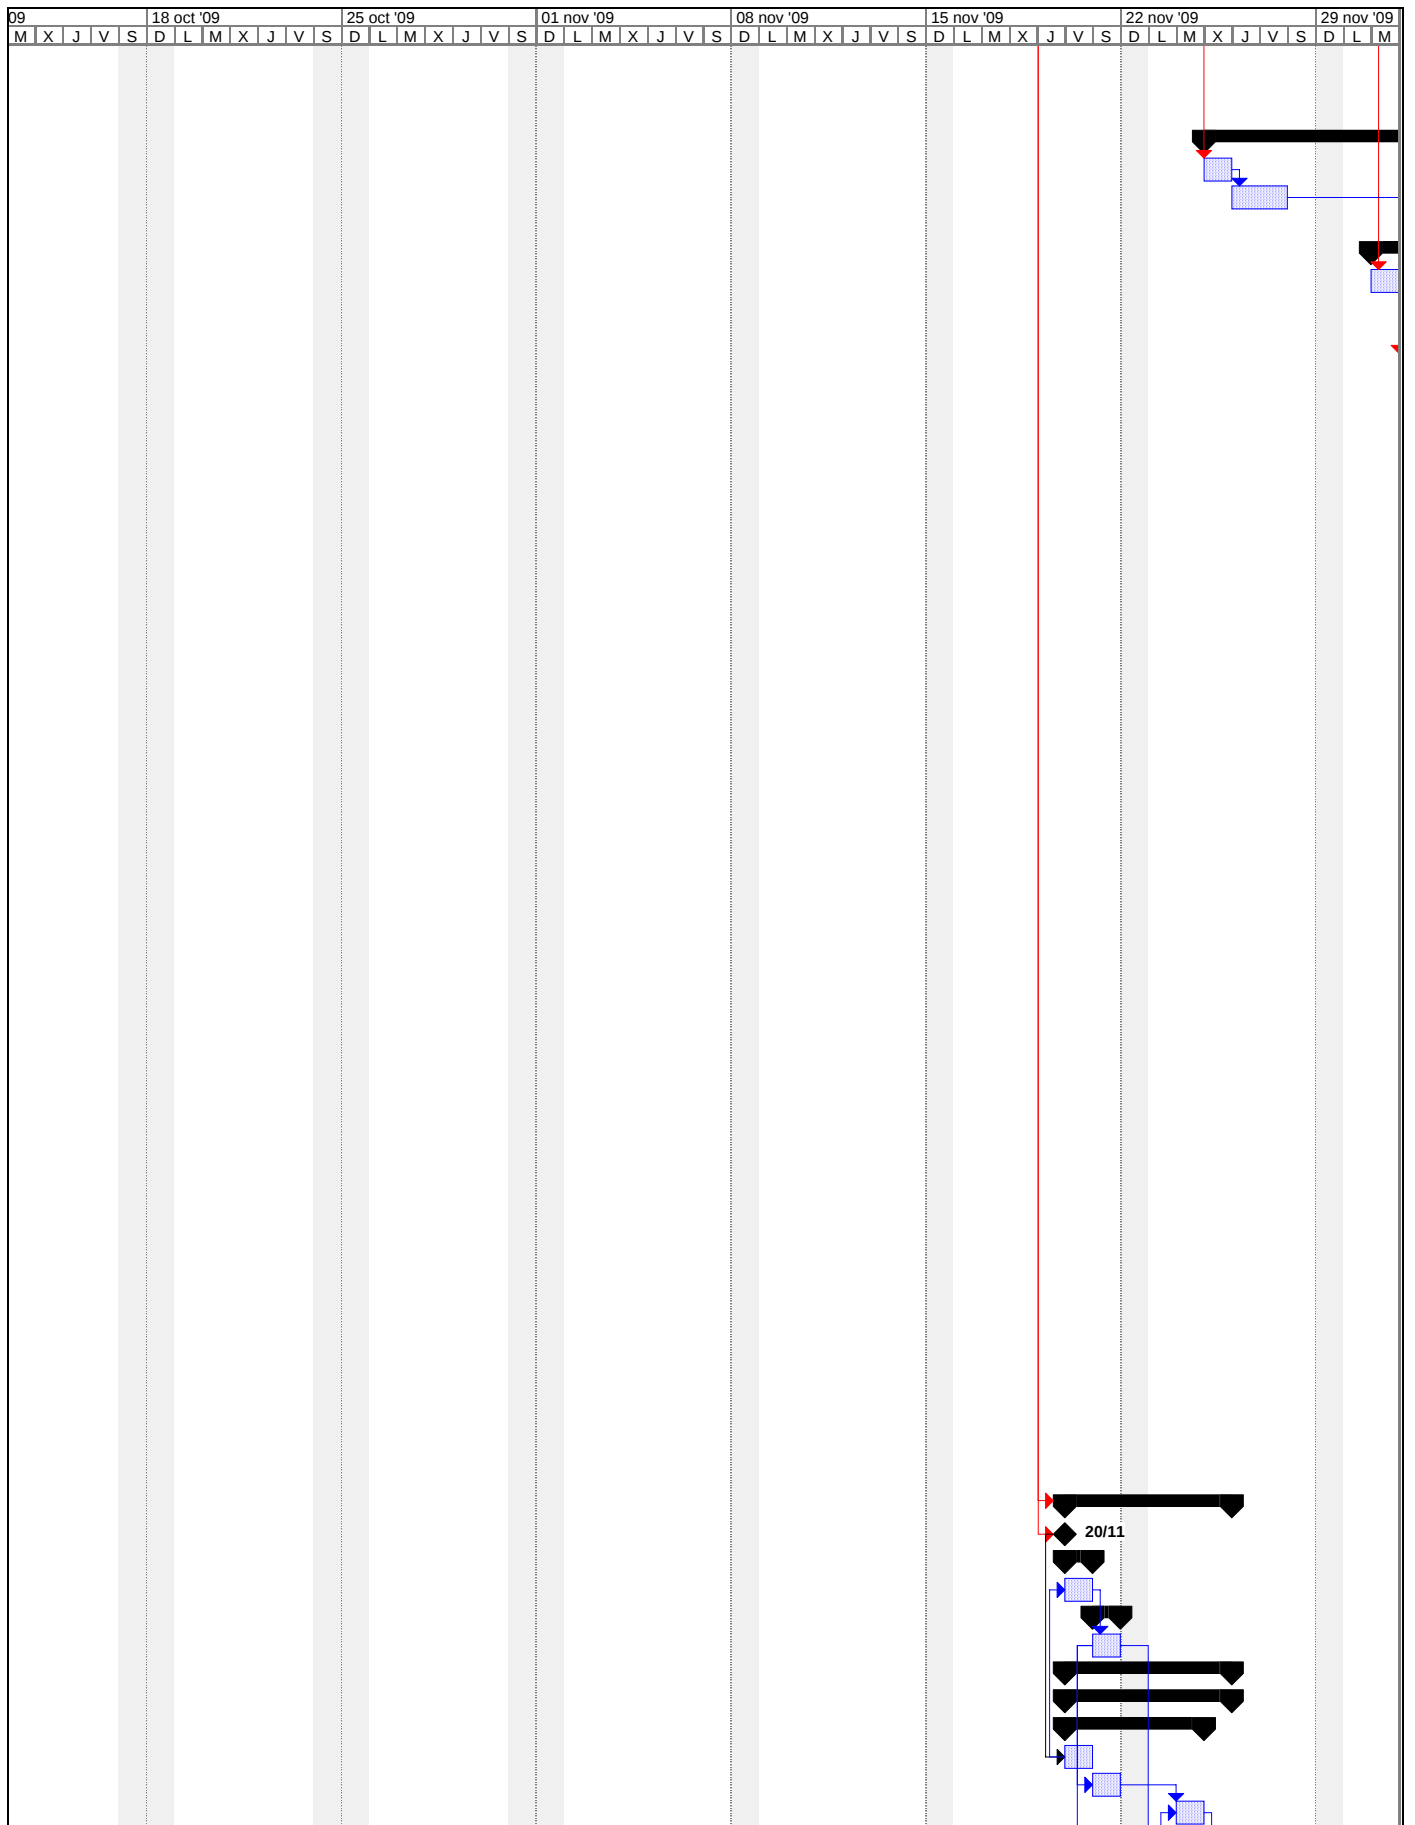


Proyecto: Programación 3 dic
Fecha: lun 07/12/09

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			

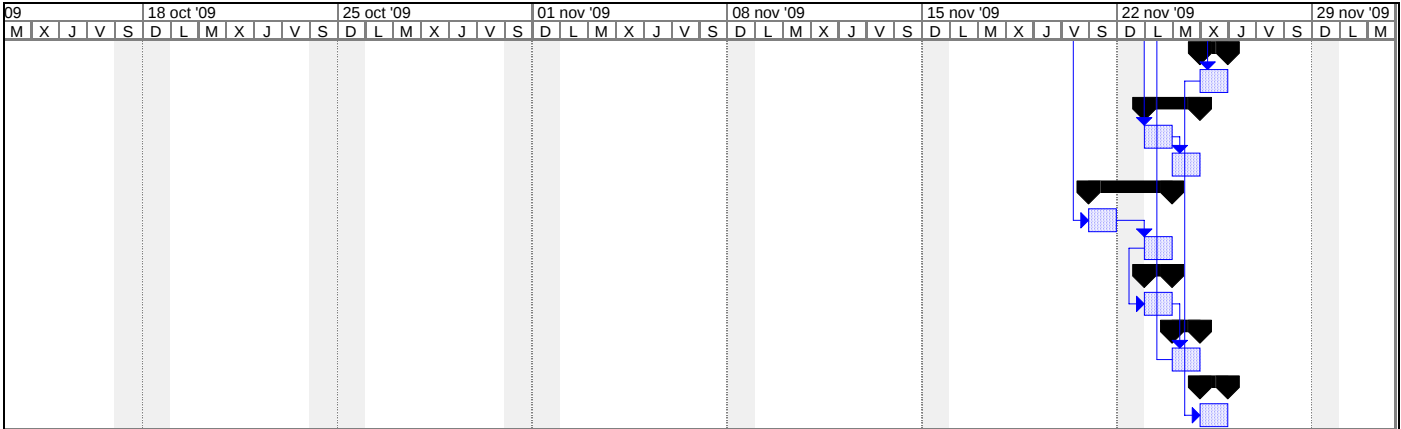

Proyecto: Programación 3 dic
Fecha: lun 07/12/09


Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			

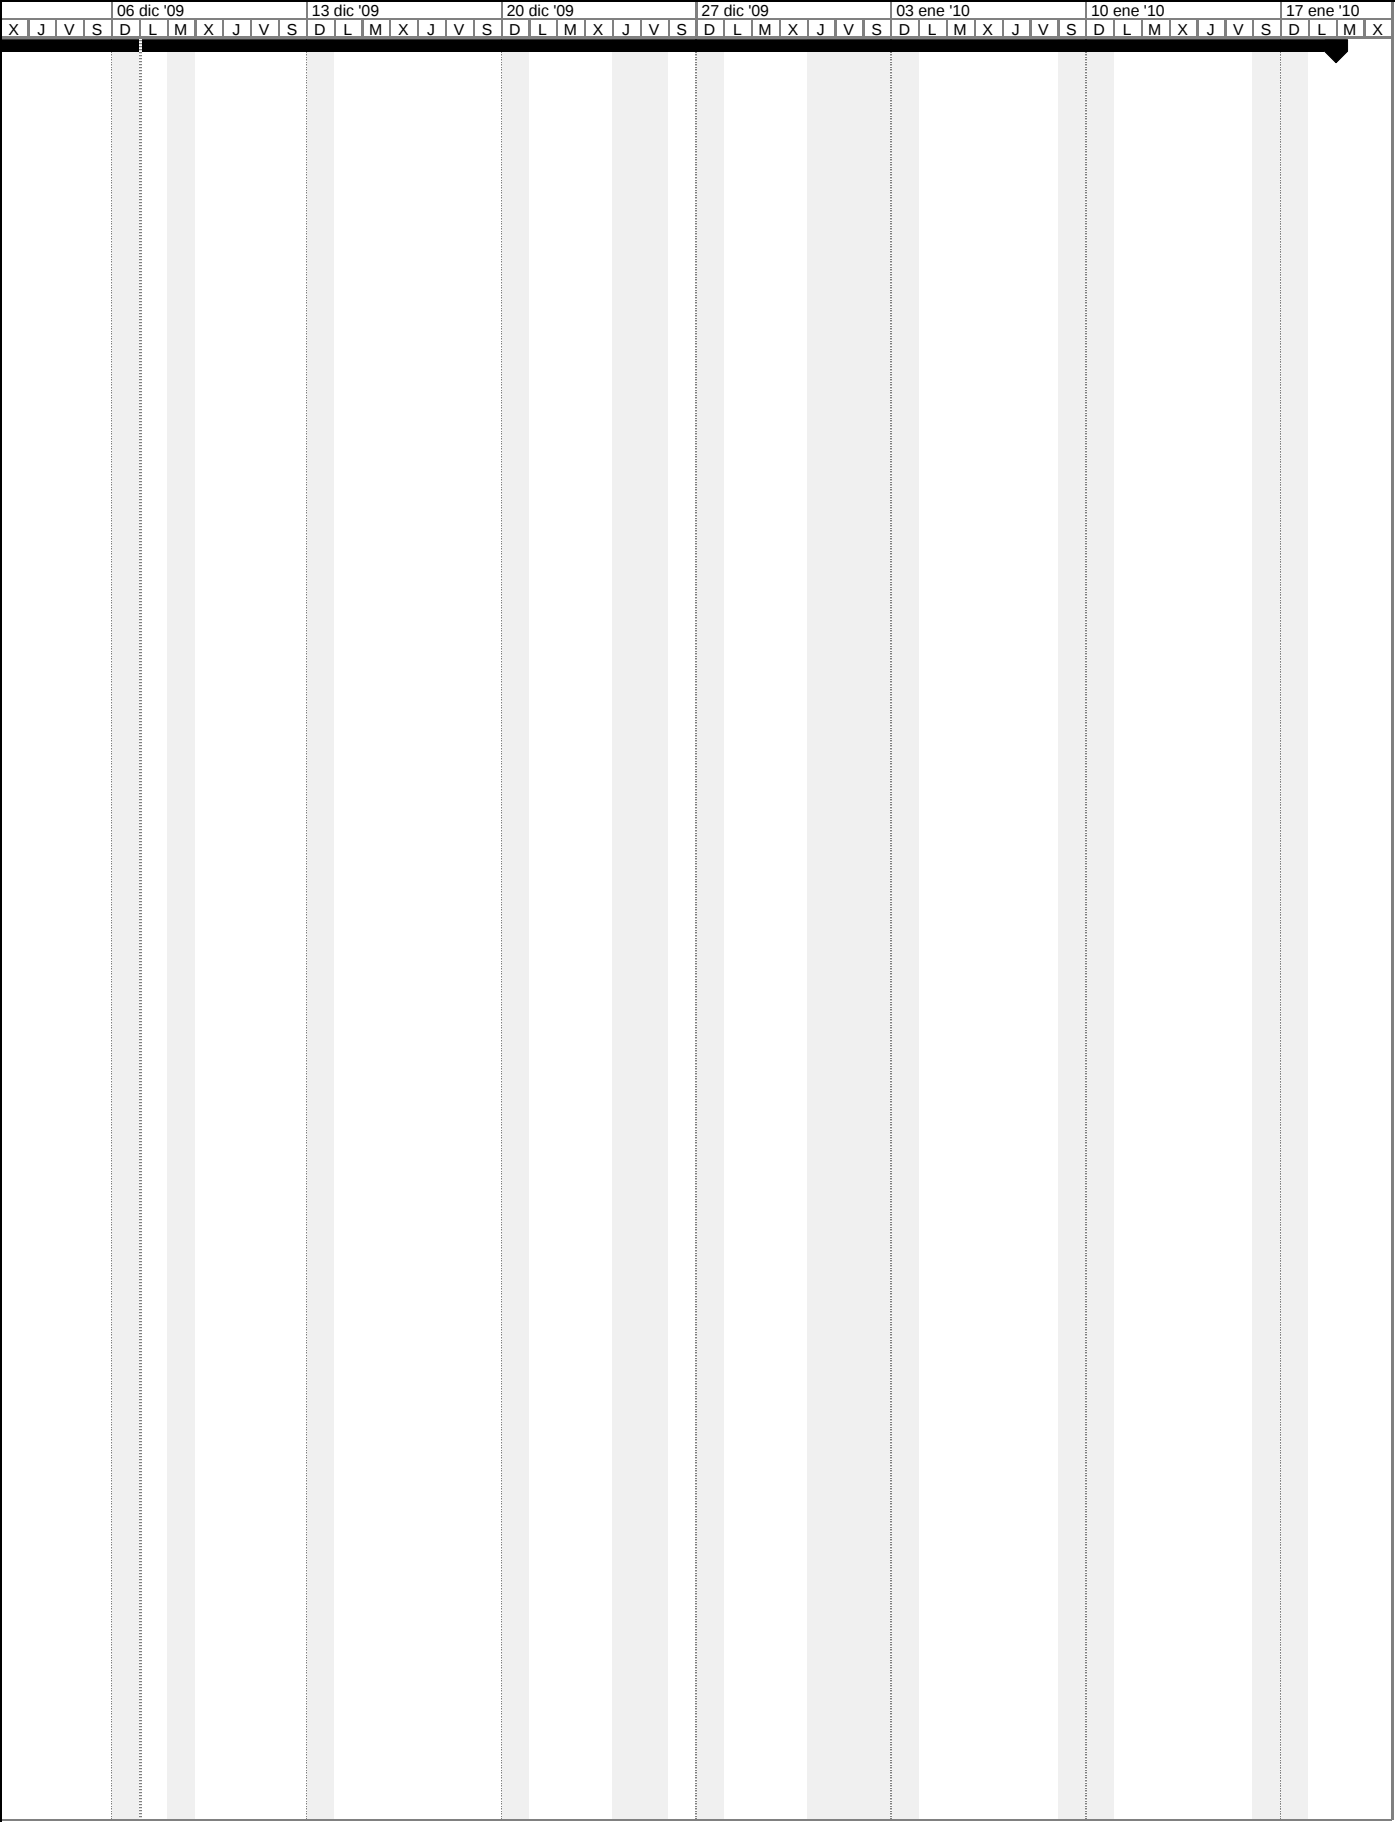

Proyecto: Programación 3 dic
Fecha: lun 07/12/09


Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			

Página 9

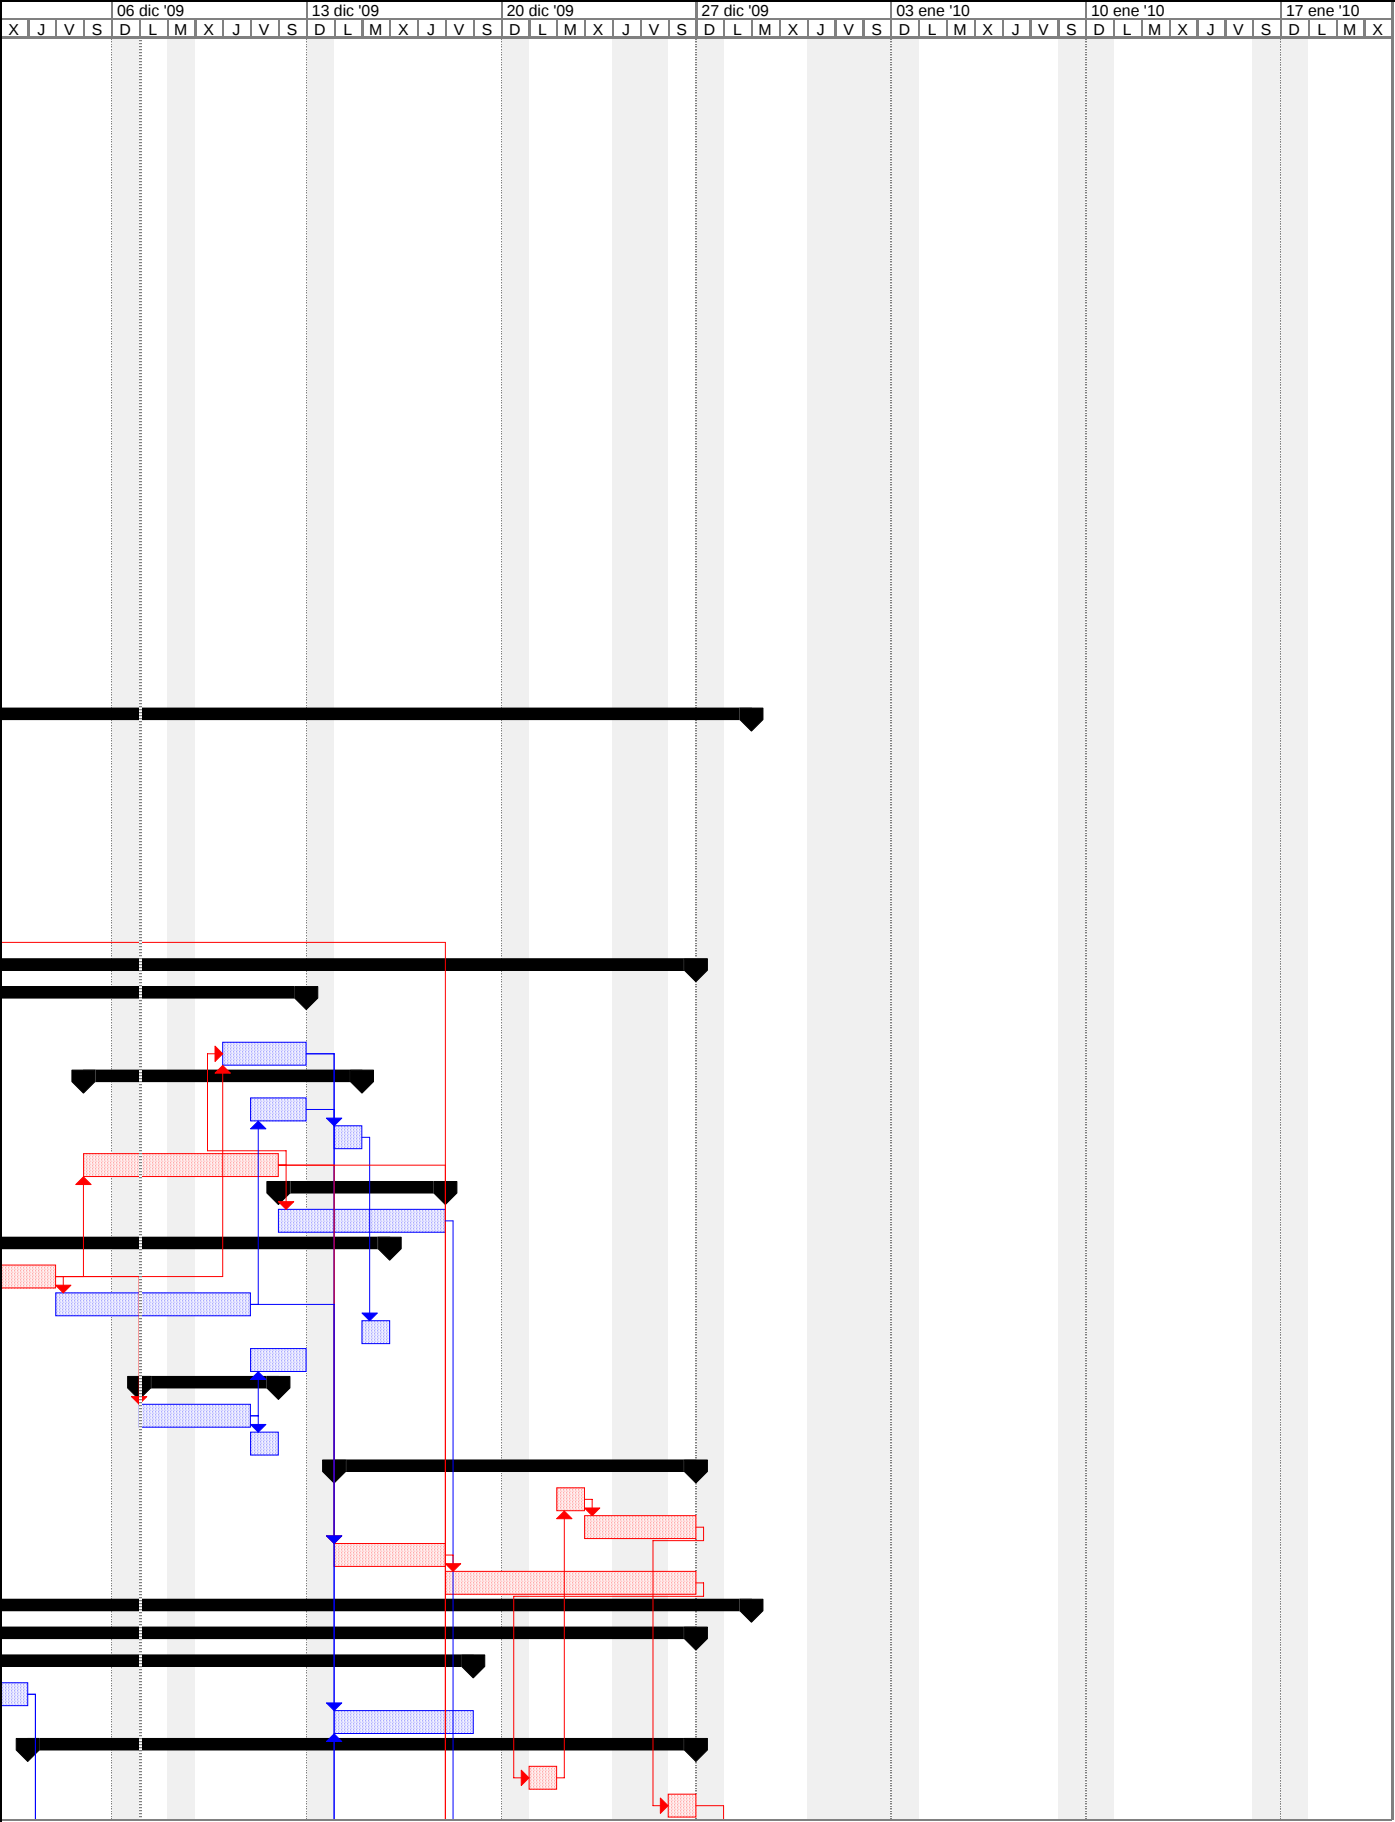

Proyecto: Programación 3 dic
Fecha: lun 07/12/09


Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			

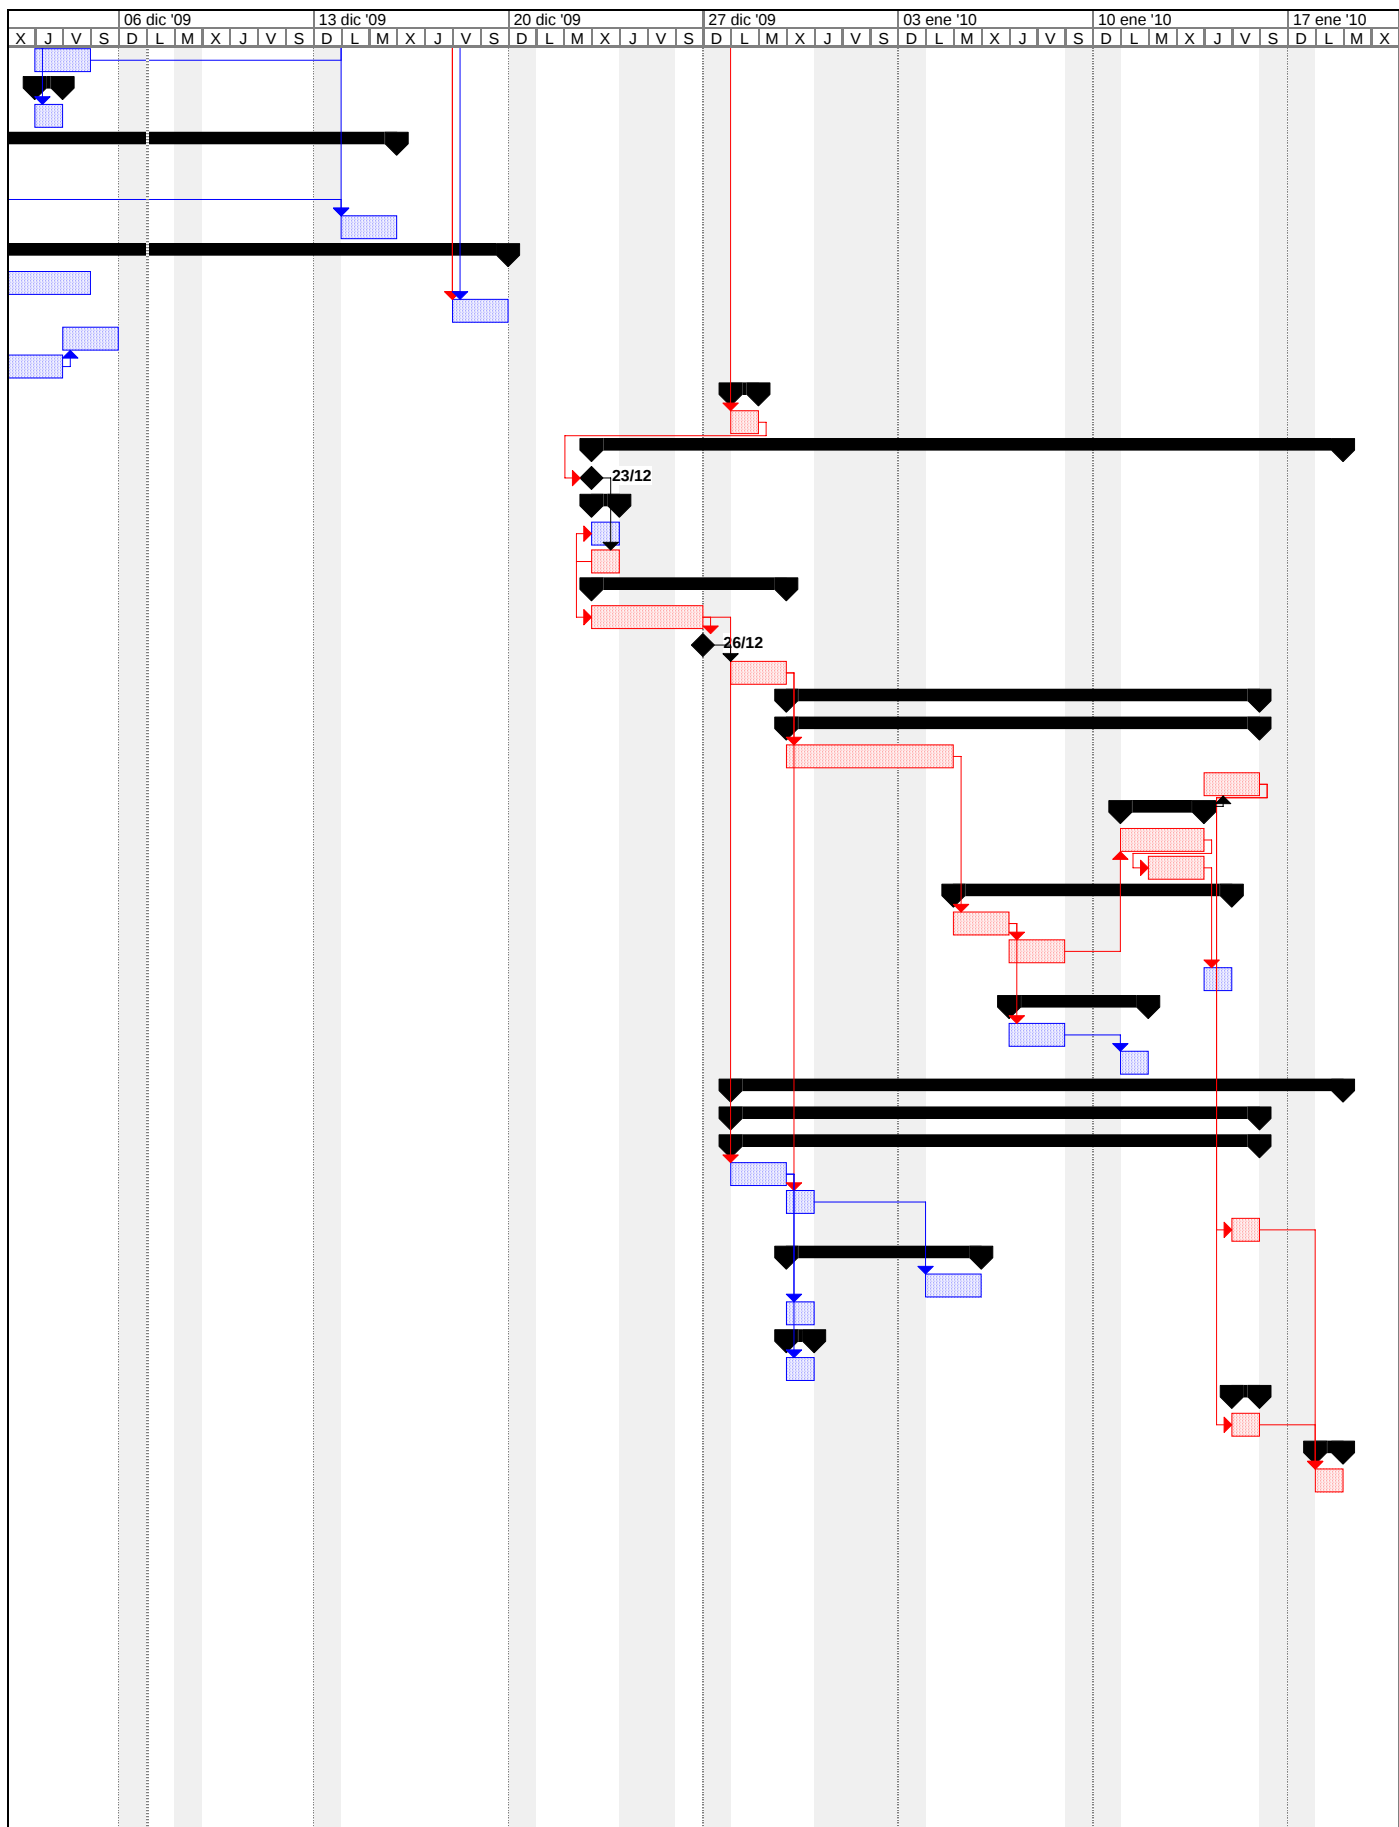

Proyecto: Programación 3 dic
Fecha: lun 07/12/09

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			

06 dic '09				13 dic '09				20 dic '09				27 dic '09				03 ene '10				10 ene '10				17 ene '10				
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X



Proyecto: Programación 3 dic

Fecha: lun 07/12/09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
