



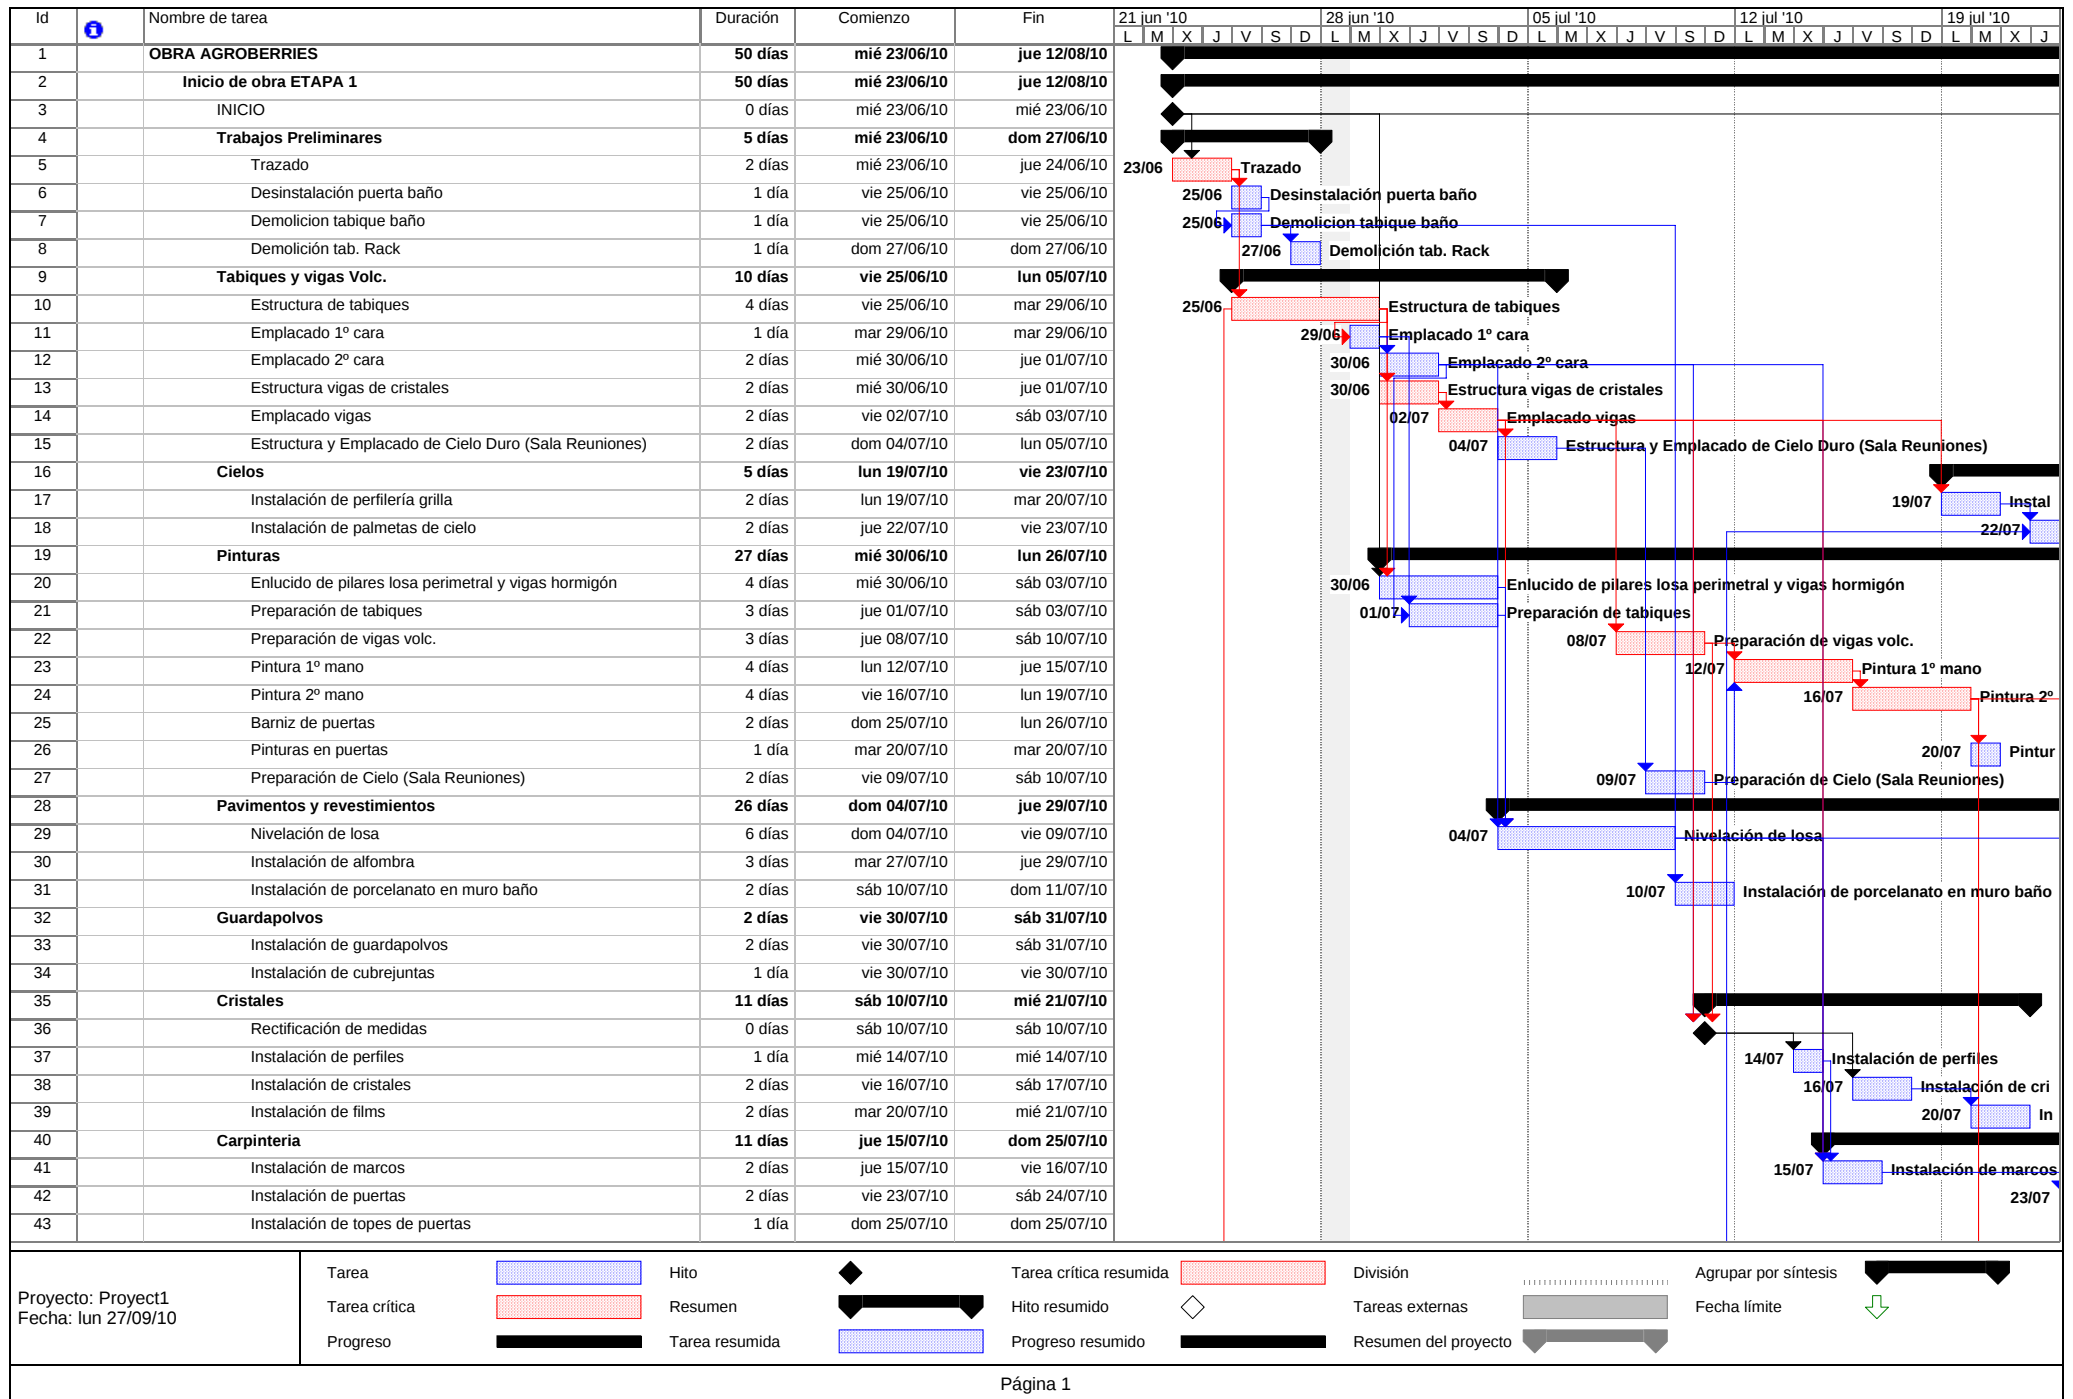

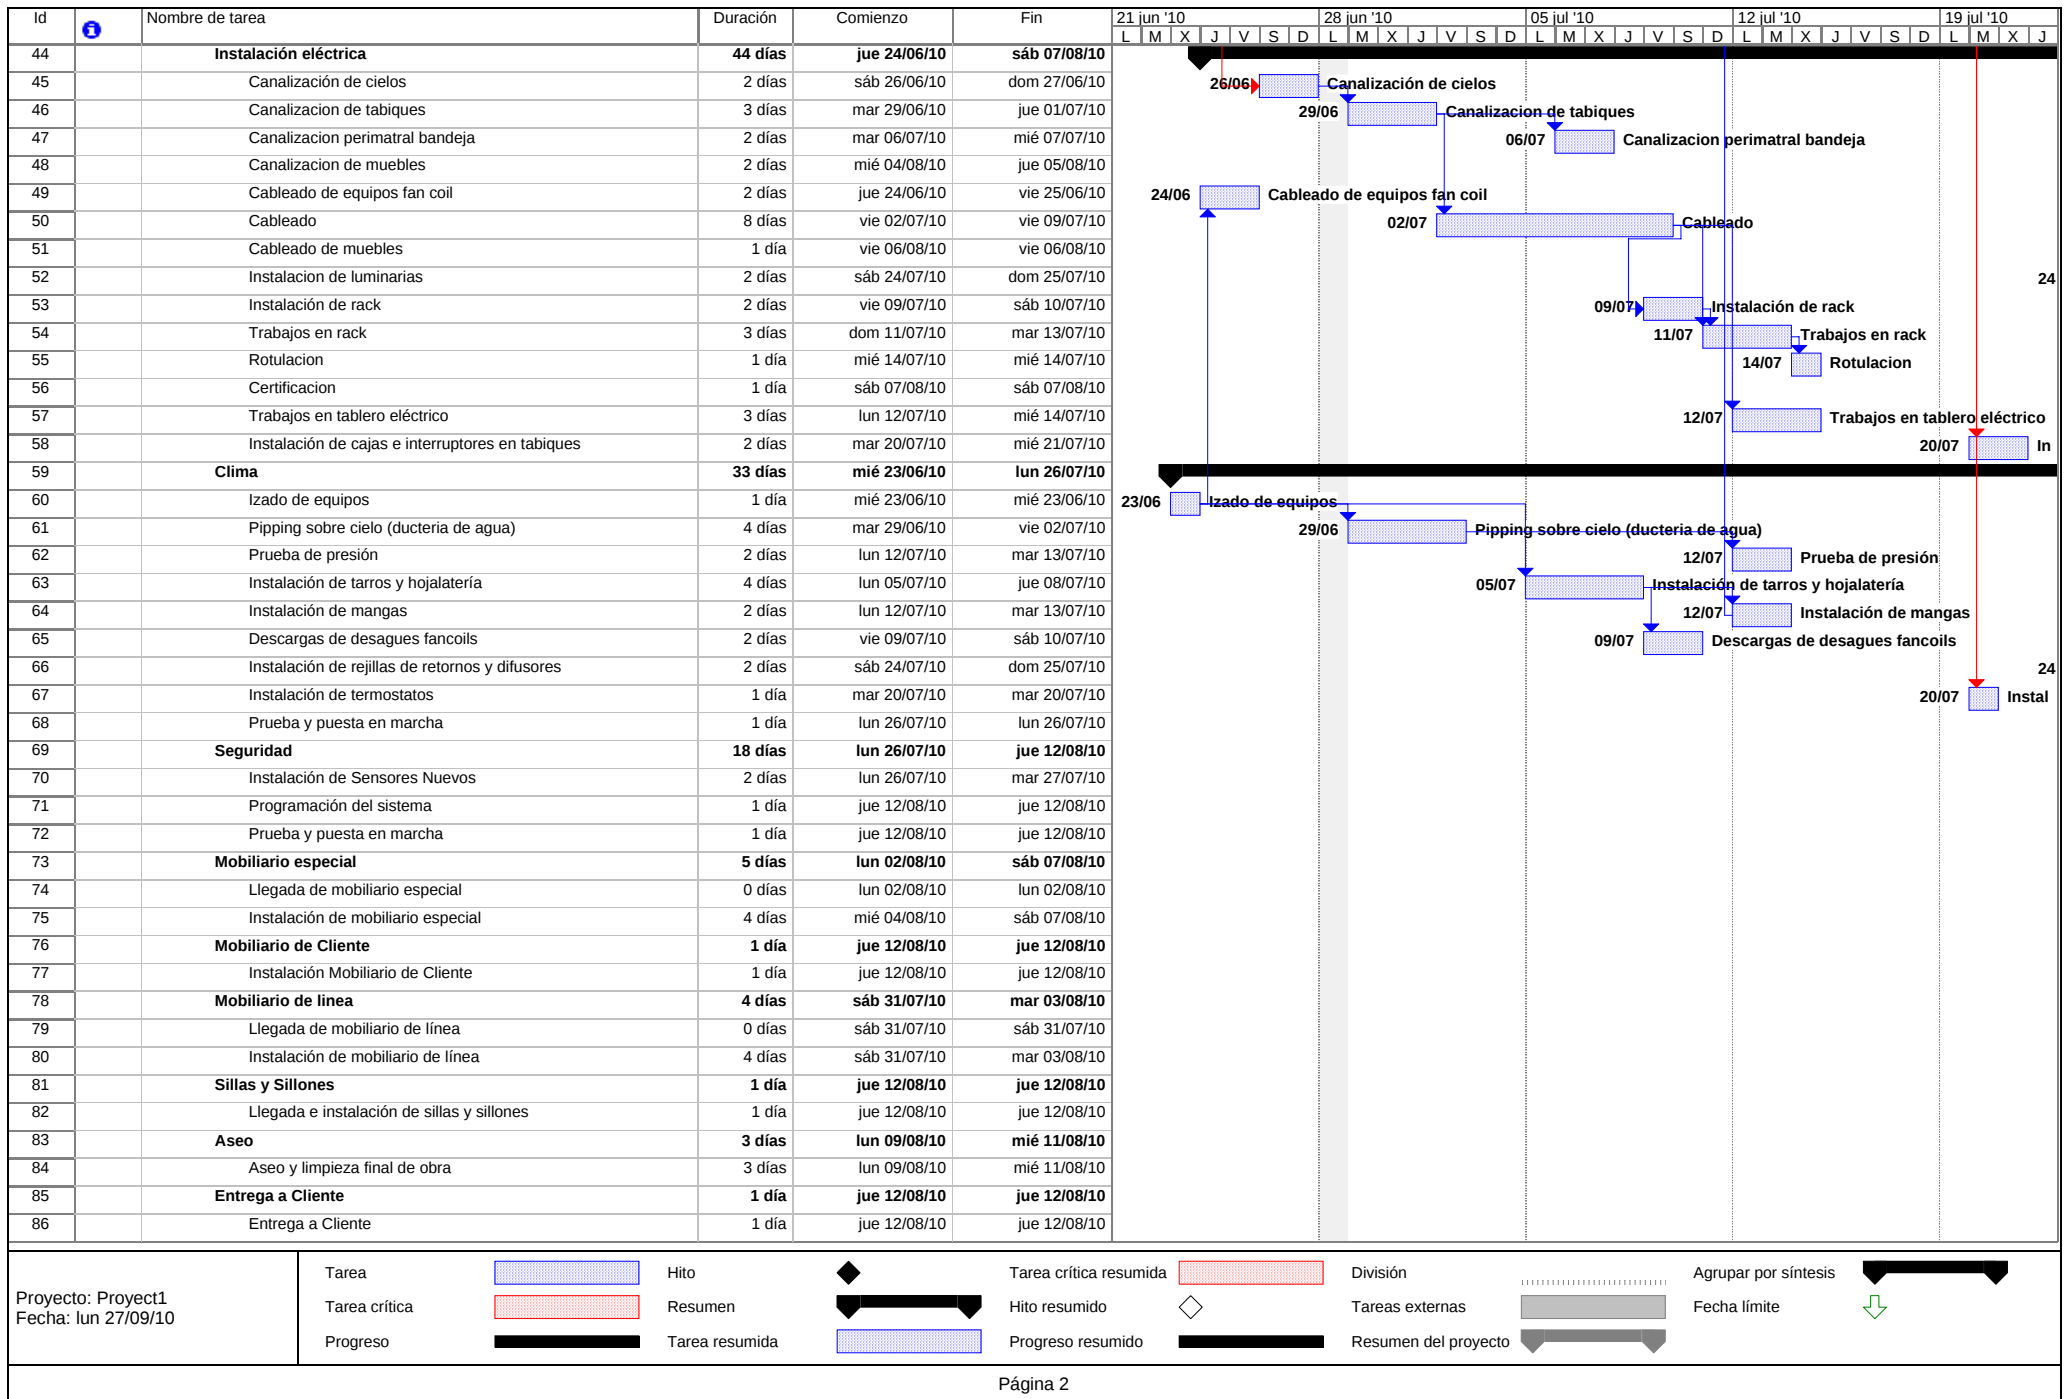

Id	i	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21 jun '10							28 jun '10							05 jul '10							12 jul '10							19 jul '10						
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			
87																																								
88		Inundación en Sala de Reuniones y Acceso a Etapa 1	19 días	vie 23/07/10	mié 11/08/10																																			
89		Primera Inundación	0 días	vie 23/07/10	vie 23/07/10																																			
90		Tapado de Cielo	1 día	sáb 24/07/10	sáb 24/07/10																																			
91		Preparación de Superficie de Cielo	2 días	mié 28/07/10	jue 29/07/10																																			
92		Pintura de Cielo	2 días	dom 01/08/10	lun 02/08/10																																			
93		Reposició n e instalación de Sensores de Humo	1 día	mié 11/08/10	mié 11/08/10																																			
94																																								
95		Inundación Baño Gerente 1 y Área de Impresión	10 días	sáb 24/07/10	mar 03/08/10																																			
96		Segunda Inundación	0 días	sáb 24/07/10	sáb 24/07/10																																			
97		Tapado de Muros	1 día	mié 28/07/10	mié 28/07/10																																			
98		Preparación de Superficie de Muros	1 día	vie 30/07/10	vie 30/07/10																																			
99		Pintura de Muros	1 día	mar 03/08/10	mar 03/08/10																																			
100																																								
101																																								
102		PERMISO MUNICIPAL	20 días	mié 01/09/10	mar 21/09/10																																			
103		Inicio de obra ETAPA 2	20 días	mié 01/09/10	mar 21/09/10																																			
104		INICIO	0 días	mié 01/09/10	mié 01/09/10																																			
105		Trabajos Preliminares	2 días	jue 02/09/10	vie 03/09/10																																			
106		Trazado	1 día	jue 02/09/10	jue 02/09/10																																			
107		Demolición tabique acceso, muro y piso kitchenette	2 días	jue 02/09/10	vie 03/09/10																																			
108		Tabique Volvometal	3 días	vie 03/09/10	dom 05/09/10																																			
109		Estructura de tabique	1 día	vie 03/09/10	vie 03/09/10																																			
110		Emplacado 1º cara	1 día	sáb 04/09/10	sáb 04/09/10																																			
111		Emplacado 2º cara	1 día	dom 05/09/10	dom 05/09/10																																			
112		Cielos	15 días	sáb 04/09/10	sáb 18/09/10																																			
113		Estructura de cielo duro	2 días	sáb 04/09/10	dom 05/09/10																																			
114		Tapado de cielo duro	2 días	lun 06/09/10	mar 07/09/10																																			
115		Estructura de Plafón	1 día	lun 06/09/10	lun 06/09/10																																			
116		Tapado de plafón	1 día	mié 08/09/10	mié 08/09/10																																			
117		Viga de volvometal con refuerzo de madera	2 días	lun 06/09/10	mar 07/09/10																																			
118		Instalación de perfilería grilla	1 día	jue 16/09/10	jue 16/09/10																																			
119		Instalacion de palmetas de cielo	2 días	vie 17/09/10	sáb 18/09/10																																			
120		Pinturas	10 días	dom 05/09/10	mar 14/09/10																																			
121		Enlucido de pilares losa y viga de hormigón	2 días	dom 05/09/10	lun 06/09/10																																			
122		Preparación de tabiques	2 días	lun 06/09/10	mar 07/09/10																																			
123		Preparación de cielos y plafón	1 día	jue 09/09/10	jue 09/09/10																																			
124		Pintura 1º mano	2 días	vie 10/09/10	sáb 11/09/10																																			
125		Pintura 2º mano	2 días	dom 12/09/10	lun 13/09/10																																			
126		Barniz de puertas	1 día	mar 14/09/10	mar 14/09/10																																			
127		Pintura de puertas	1 día	mar 14/09/10	mar 14/09/10																																			
128		Pavimentos y revestimientos	8 días	mié 08/09/10	mié 15/09/10																																			
129		Nivelación de losa	2 días	mié 08/09/10	jue 09/09/10																																			

24

Proyecto: Project1
Fecha: lun 27/09/10

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido


Divisi3n

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

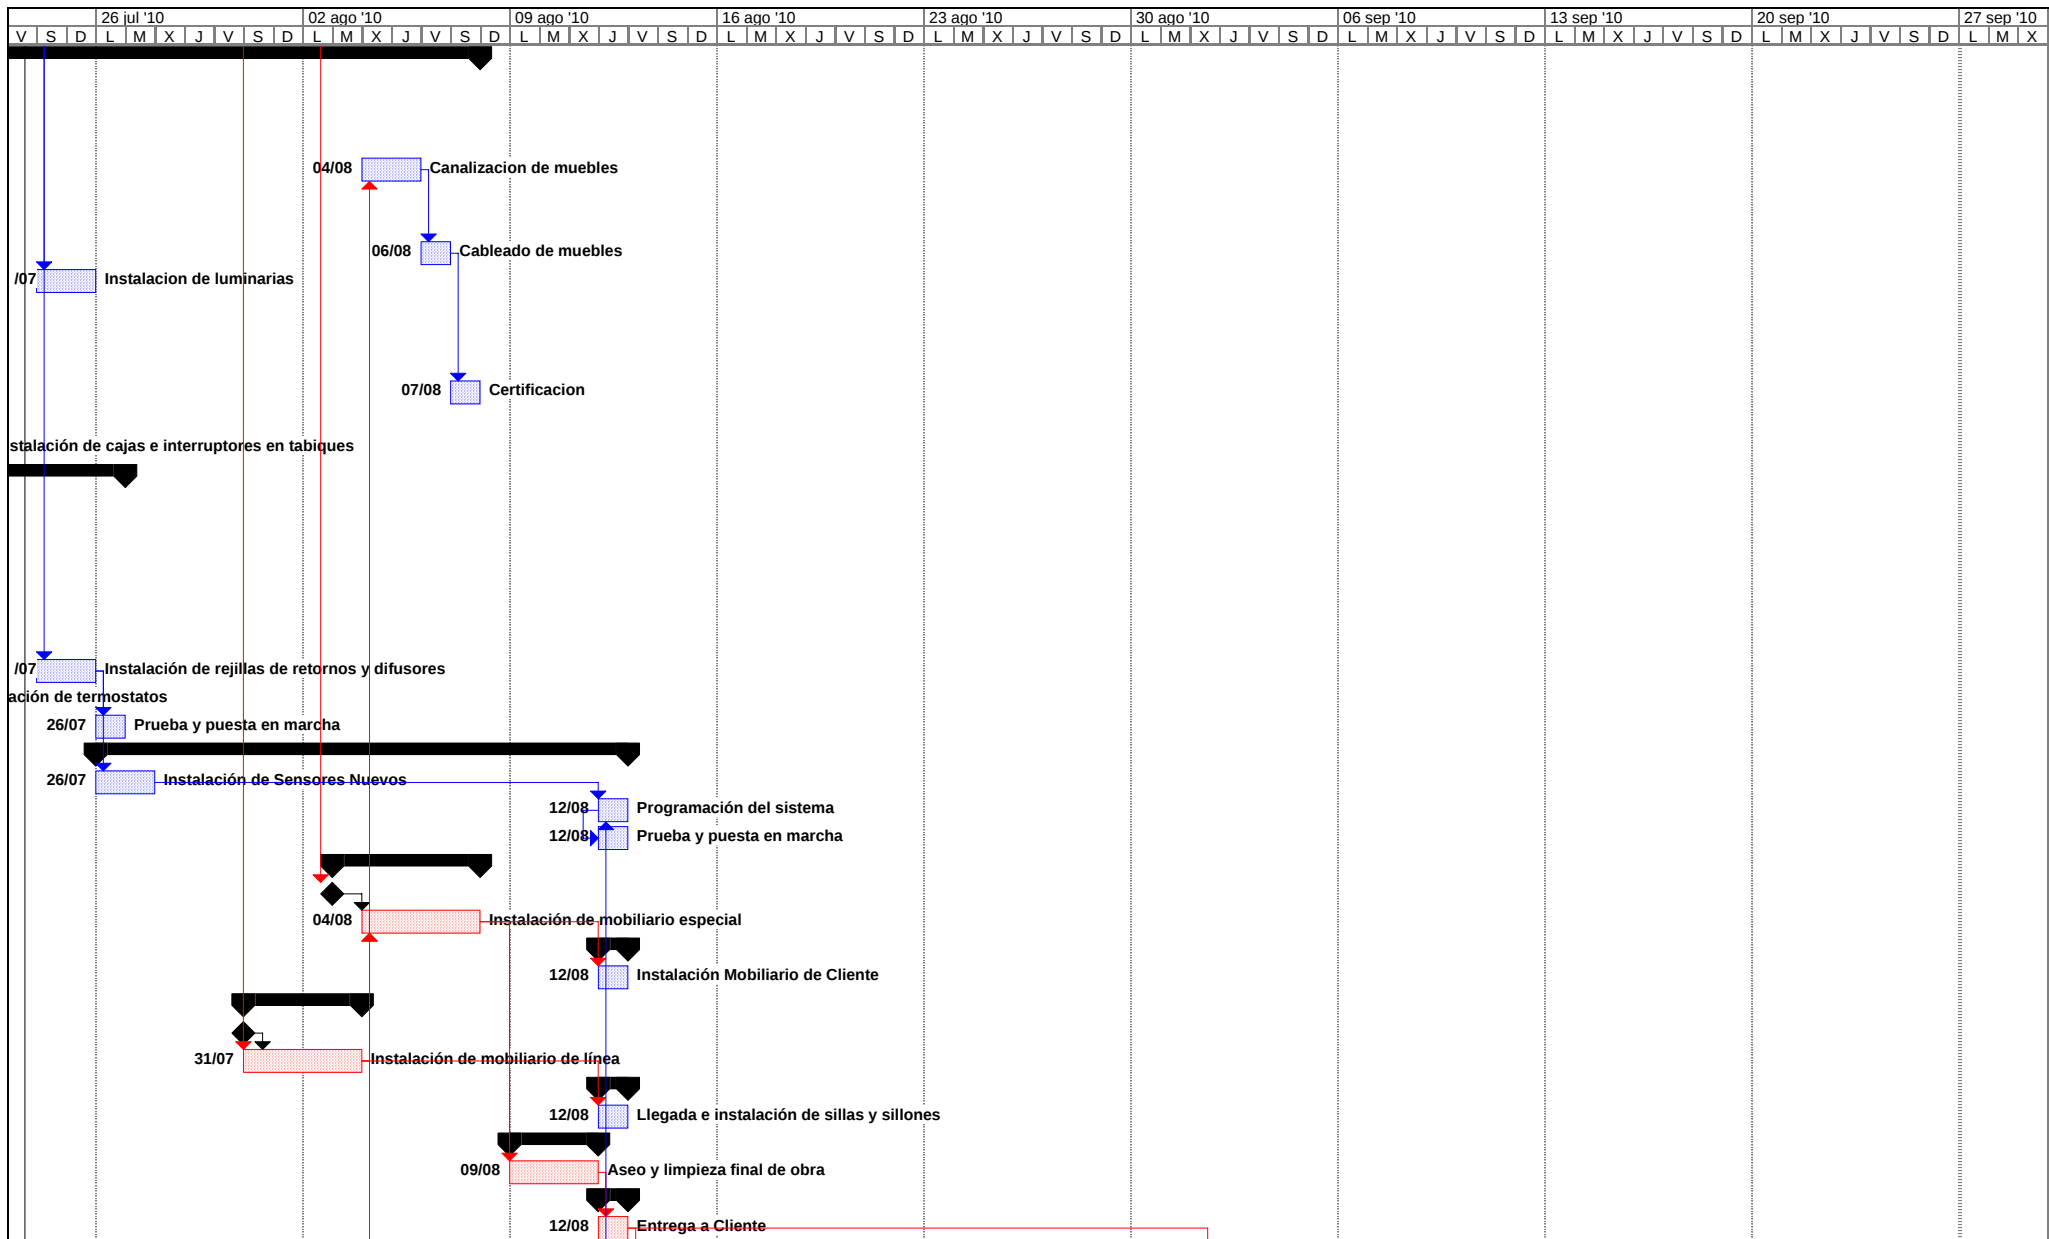

Proyecto: Project1
Fecha: lun 27/09/10


Tarea
Tarea crítica
Progreso

Hito
Resumen
Tarea resumida


Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido

División
Tareas externas
Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis
Fecha límite

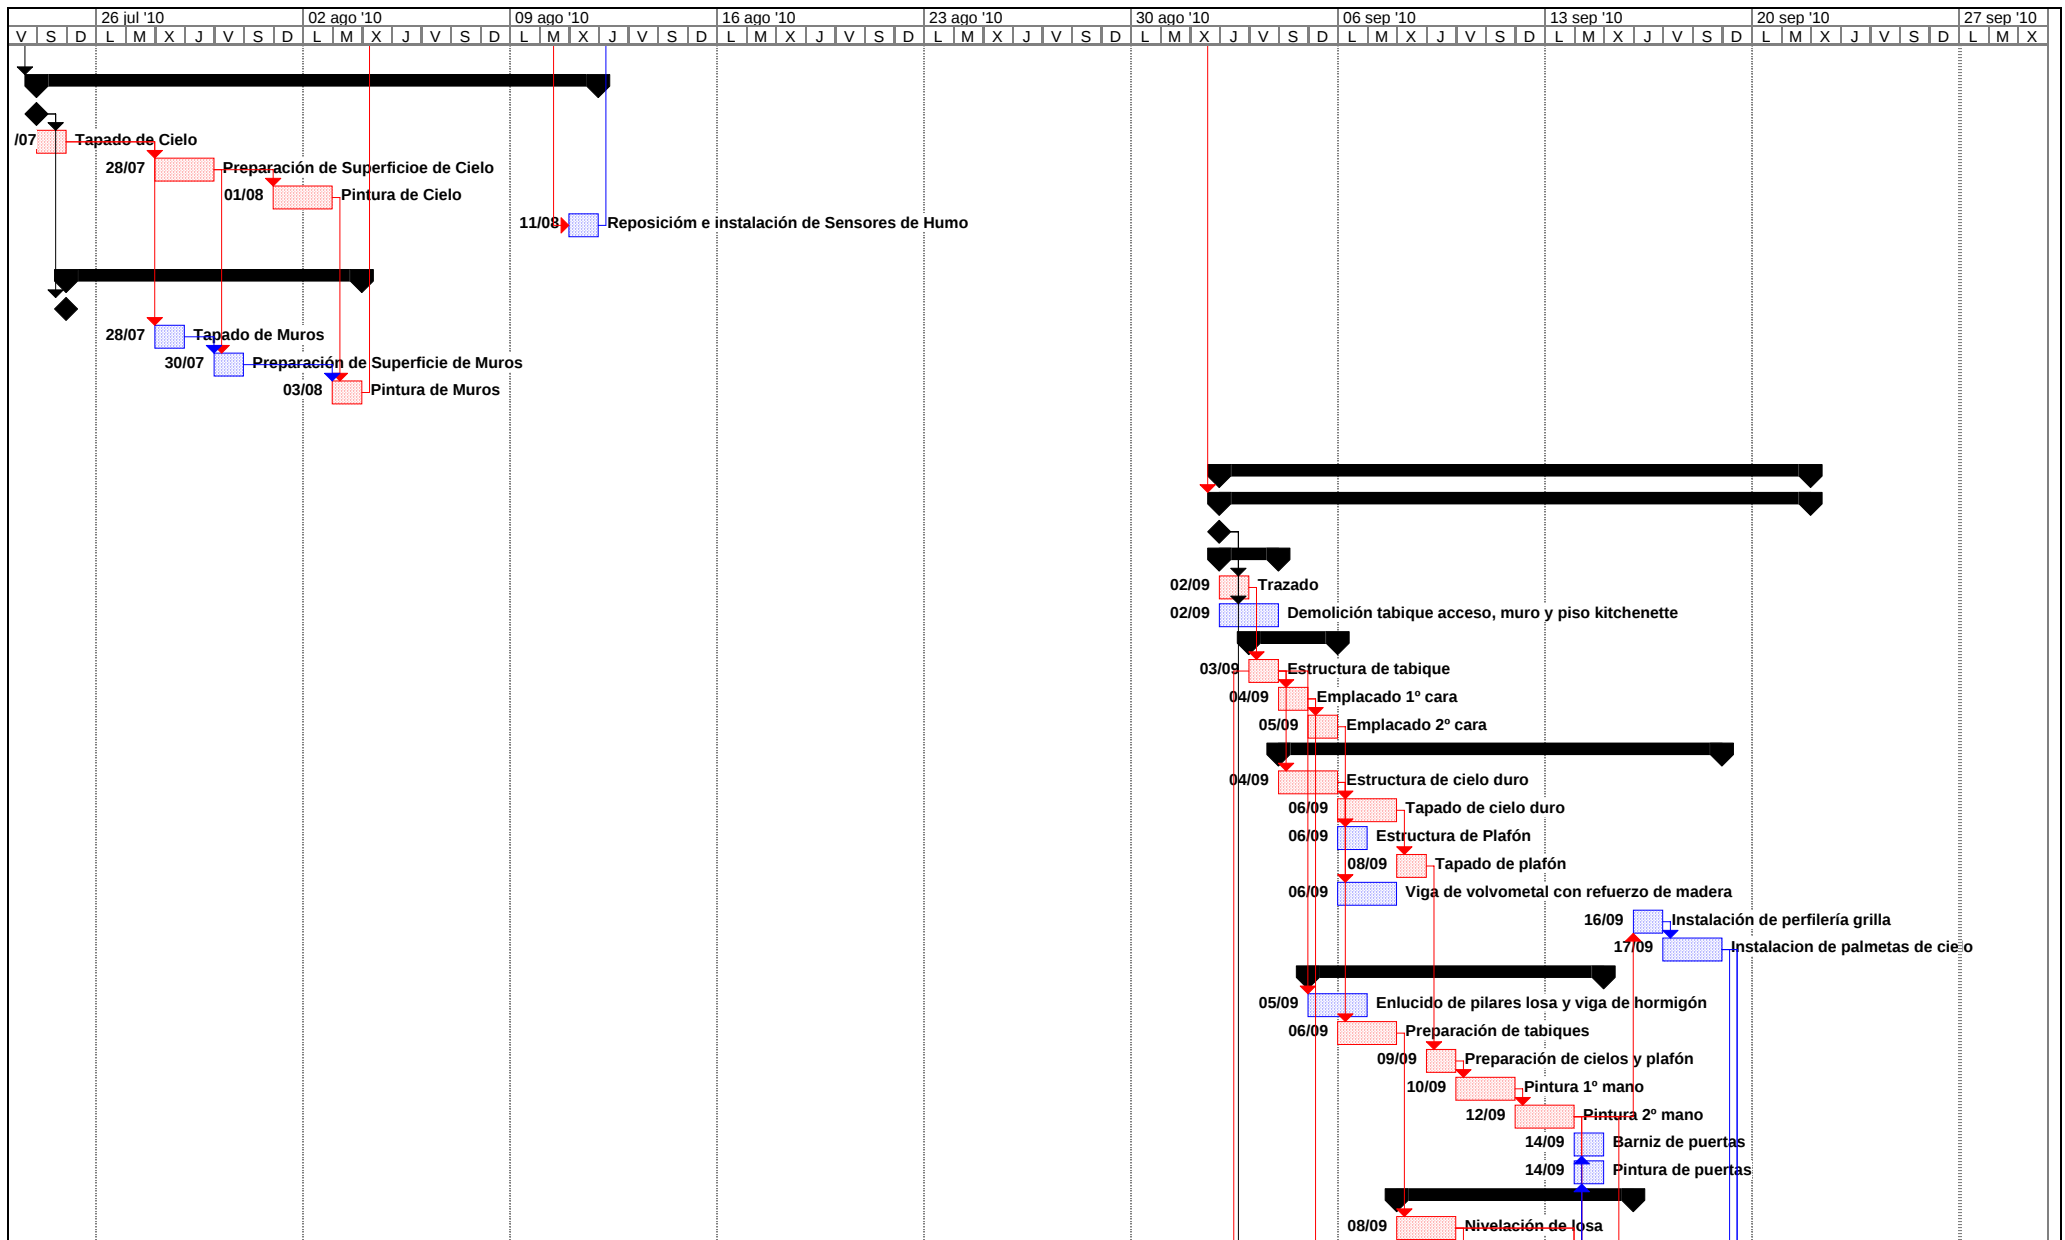

Proyecto: Project1
Fecha: lun 27/09/10

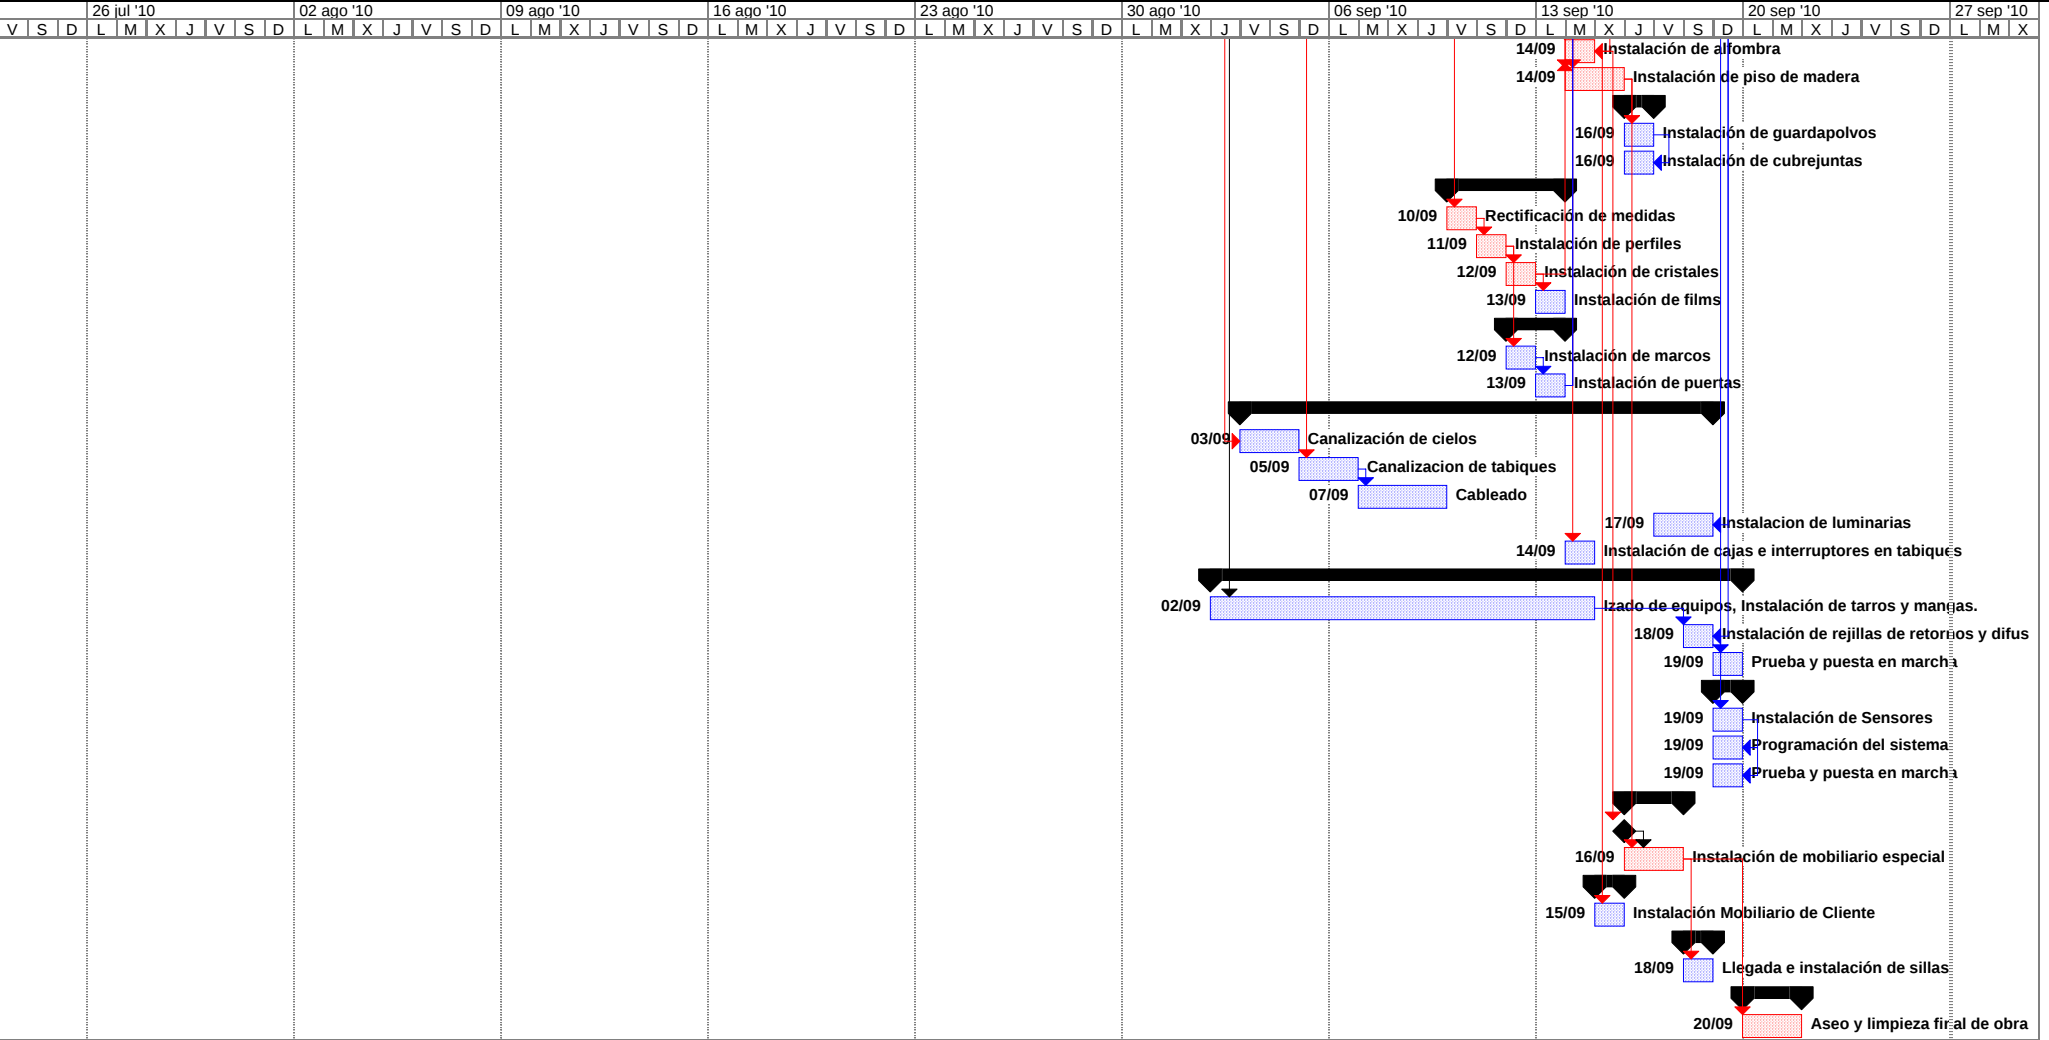

Proyecto: Project1
Fecha: lun 27/09/10

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
