


Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Gantt Chart Timeline (13 Jun '11 to 19 Sep '11)																											
1	NEXTEL PUERTO DEL CENTRO	61 días?	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
2	1ERA ETAPA	61 días?	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
3	APROBACIONES y NUEVOS TRABA	26 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
4	Alfombras	5 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
5	Prefinished	5 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
6	Catering Cocina (diseño, cañerías	5 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
7	IFSA (Frentes de Oficinas y muebl	3 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
8	Multimedia (Configuración de Sala	10 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
9	Sillones (generadores de Salas de	8 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
10	Extinción de Incendio	2 días	lun 20/06/11	[Timeline visualization]																											
11	Detección de Incendio	2 días	lun 20/06/11	[Timeline visualization]																											
12	Aire Acondicionado Sala Reunione	6 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
13	PRELIMINARES	13 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
14	Luz de obra y montante provisori	5 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
15	Relevamientos con instalaciones	5 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
16	Replanteos	5 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
17	informes y Compras	8 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
18	PISO TÉCNICO	20 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
19	OC	0 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
20	Entrega	0 días	vie 24/06/11	[Timeline visualization]																											
21	Colocación	10 días	lun 27/06/11	[Timeline visualization]																											
22	EXTINCIÓN DE INCENDIO	20 días	mié 22/06/11	[Timeline visualization]																											
23	Nuevo pedido, Proyecto y presupu	3 días	mié 22/06/11	[Timeline visualization]																											
24	Aprobación presupuesto	2 días	lun 27/06/11	[Timeline visualization]																											
25	Reacomodamiento de Sprinklers	5 días	mié 13/07/11	[Timeline visualization]																											
26	AIRE ACONDICIONADO	57 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
27	Confección y ajustes de planos de	15 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
28	Aprobación de plano	11 días	lun 04/07/11	[Timeline visualization]																											
29	Construcción	5 días	mar 19/07/11	[Timeline visualization]																											
30	Readaptación de conductos existe	5 días	vie 22/07/11	[Timeline visualization]																											
31	Aislación y montaje	6 días	mar 26/07/11	[Timeline visualization]																											
32	Coloc Rejas y difusores	2 días	mié 24/08/11	[Timeline visualization]																											
33	Puesta en Marcha	2 días	vie 26/08/11	[Timeline visualization]																											
34	EXTRACCION COCINA - COMEDOR	32,5 días	lun 20/06/11	[Timeline visualization]																											
35	Ajustes de Proyecto Catering (si-	19 días	lun 20/06/11	[Timeline visualization]																											
36	Presupuesto	1,5 días	vie 15/07/11	[Timeline visualization]																											
37	Aprobación de presupuesto	3 días	lun 18/07/11	[Timeline visualization]																											
38	Construcción	3 días	jue 21/07/11	[Timeline visualization]																											
39	Montaje	2 días	mar 26/07/11	[Timeline visualization]																											
40	Coloc Rejas y difusores	2 días	jue 28/07/11	[Timeline visualization]																											
41	Puesta en Marcha	2 días	lun 01/08/11	[Timeline visualization]																											
42	COCINA	35 días	jue 30/06/11	[Timeline visualization]																											
43	Proyecto y aprobación	11 días	jue 30/06/11	[Timeline visualization]																											
44	Canalizaciones eléctricas	2 días	vie 15/07/11	[Timeline visualization]																											
45	Canalizaciones sanitarias	3 días	lun 25/07/11	[Timeline visualization]																											
46	Base piso de cocina	4 días	jue 28/07/11	[Timeline visualization]																											
47	coloc de porcellanatos en pisos	2 días	lun 08/08/11	[Timeline visualization]																											
48	colocac de revestimientos	3 días	mié 10/08/11	[Timeline visualization]																											
49	Colocac Mueble	1 día	dom 14/08/11	[Timeline visualization]																											
50	Coloc Mesada	1 día	lun 15/08/11	[Timeline visualization]																											
51	Coloc Grifería	1 día	mar 16/08/11	[Timeline visualization]																											
52	MEDIDOR	41 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
53	Gestión	4 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
54	Trabajos en Sala de medidores	2 días	mié 13/07/11	[Timeline visualization]																											
55	MONTANTES	32 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
56	Relevamiento y Proyecto	4 días	lun 13/06/11	[Timeline visualization]																											
57	Informes	1 día	jue 14/07/11	[Timeline visualization]																											
58	Presupuesto y aprobación	5 días	vie 15/07/11	[Timeline visualization]																											
59	Nuevas montantes	2 días	lun 25/07/11	[Timeline visualization]																											

Tarea		Progreso de tarea crítica		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea		Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis	
Tarea crítica		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	

	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Gantt Chart Timeline																							
					13 jun '11	20 jun '11	27 jun '11	04 jul '11	11 jul '11	18 jul '11	25 jul '11	01 ago '11	08 ago '11	15 ago '11	22 ago '11	29 ago '11	05 sep '11	12 sep '11	19 sep '11	26 sep '11								
60		TABLEROS	8 días	lun 25/07/11																								
61		De Iluminación y Tomas	5 días	lun 25/07/11																								
62		Nuevo de UPS	3 días	lun 01/08/11																								
63		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	56 días	lun 20/06/11																								
64		Cielorraso	23 días	lun 20/06/11																								
65		canalizaciones	15 días	lun 20/06/11																								
66		Cableados	8 días	lun 11/07/11																								
67		Tabiques	10,5 días	lun 11/07/11																								
68		canalizaciones	7,5 días	lun 11/07/11																								
69		Cableados	3 días	mié 20/07/11																								
70		bajo piso	30 días	lun 11/07/11																								
71		bandejas	4 días	lun 11/07/11																								
72		Cableado por bandejas	2 días	vie 15/07/11																								
73		Cajas de piso	2 días	mié 17/08/11																								
74		Efectos, tapas y cajas de piso	4 días	mar 30/08/11																								
75		Clipsals en frentes y cableado	4 días	mar 30/08/11																								
76		Montaje de artef Iluminación	6 días	mar 16/08/11																								
77		(tubos, embutidos comunes y	6 días	mar 16/08/11																								
78		Conexiones en muebles	2 días	lun 29/08/11																								
79		cableados por muebles y arm.	2 días	lun 29/08/11																								
80		Certificación de Puestos	3 días	mié 31/08/11																								
81		Utps	3 días	mié 31/08/11																								
82		BAJA TENSIÓN (cámaras, detector	54 días	lun 20/06/11																								
83		Canalizaciones	15 días	lun 20/06/11																								
84		Cableado	3 días	jue 21/07/11																								
85		Montaje de equipos	2 días	jue 25/08/11																								
86		Pruebas y puesta en marcha	3 días	lun 29/08/11																								
87		DURLOCK	48 días	lun 13/06/11																								
88		Despachos	48 días	lun 13/06/11																								
89		Cielorraso	48 días	lun 13/06/11																								
90		Continuo	42 días	lun 13/06/11																								
91		Estructura	10 días	lun 13/06/11																								
92		Emplacado, cinta y m	5 días	lun 01/08/11																								
93		Huecos para artefact	2 días	lun 08/08/11																								
94		Desmontable	6 días	mié 10/08/11																								
95		Estructura	2 días	mié 10/08/11																								
96		Emplacado	2 días	vie 12/08/11																								
97		Huecos para artefact	2 días	lun 15/08/11																								
98		Tabiques	16 días	vie 01/07/11																								
99		Despachos	16 días	vie 01/07/11																								
100		Estructura y emplaca	6 días	vie 01/07/11																								
101		Refuerzos de madera	3 días	vie 15/07/11																								
102		Emplacado, cinta y m	3 días	mié 20/07/11																								
103		Salas de Reunión	34 días	lun 13/06/11																								
104		Cielorraso	34 días	lun 13/06/11																								
105		Estructura	3 días	jue 21/07/11																								
106		Emplacado	3 días	mar 26/07/11																								
107		Huecos para artefactos y	2 días	lun 13/06/11																								
108		Tabiques	5 días	jue 21/07/11																								
109		Estructura	3 días	jue 21/07/11																								
110		Emplacado	2 días	mar 26/07/11																								
111		Cocina	42 días	lun 13/06/11																								
112		Cielorraso	5 días	mié 03/08/11																								
113		Estructura	2 días	mié 03/08/11																								
114		Emplacado, cinta y masill	2 días	vie 05/08/11																								
115		Huecos para artefactos y	1 día	mar 09/08/11																								
116		Tabiques	35 días	lun 13/06/11																								
117		Estructura	5 días	lun 13/06/11																								
118		Emplacado	2 días	jue 28/07/11																								

Tarea		Progreso de tarea crítica		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea		Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis	
Tarea crítica		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	

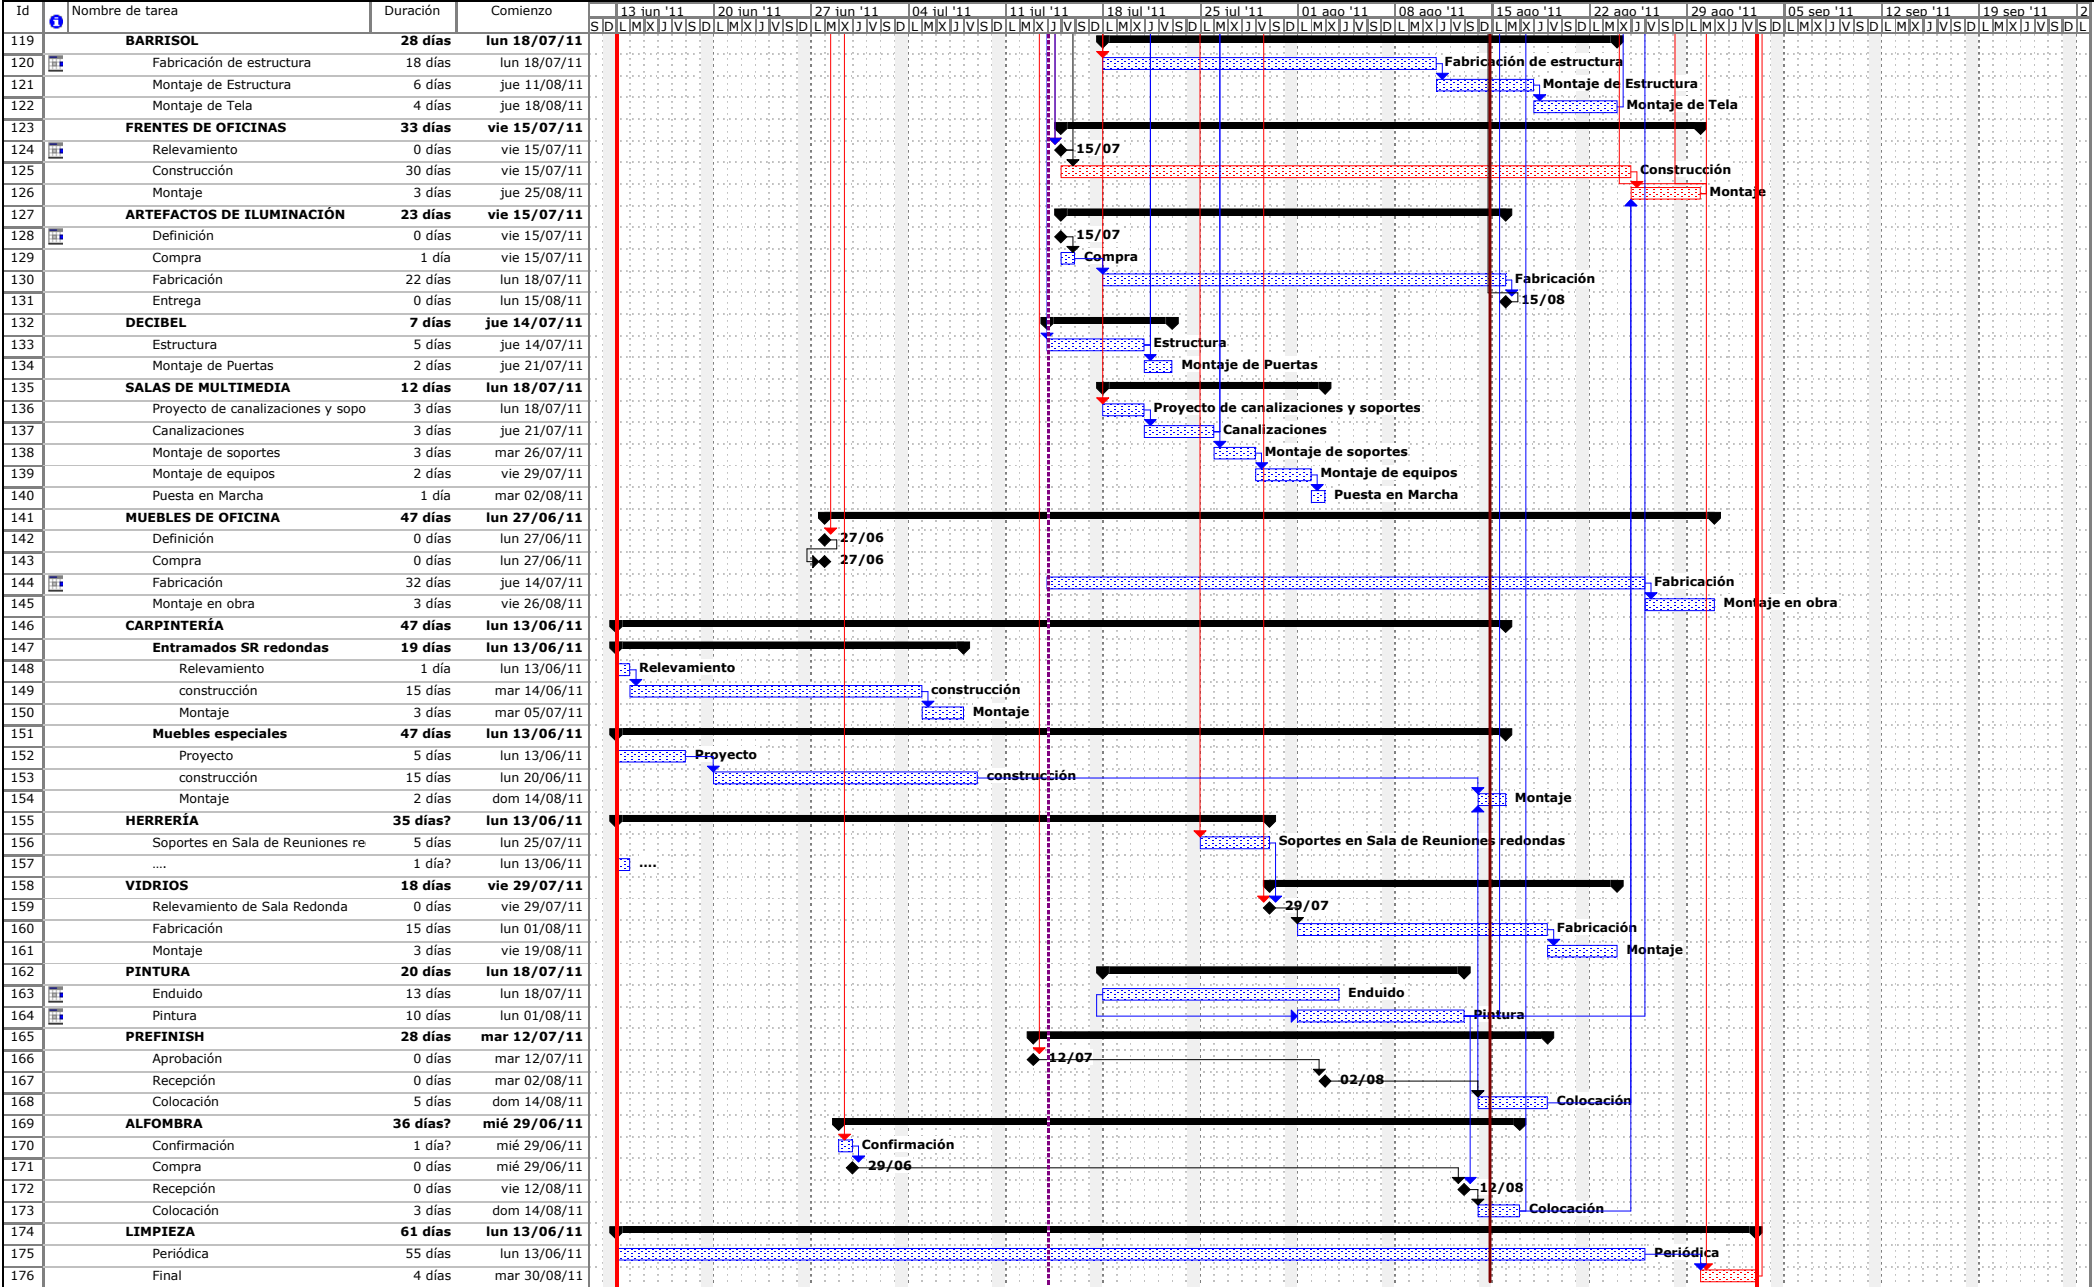

Proyecto: Project Nxtl Pto Ctro V5
Fecha: jue 14/07/11

Tarea

Progreso de tarea

Tarea crítica

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
