


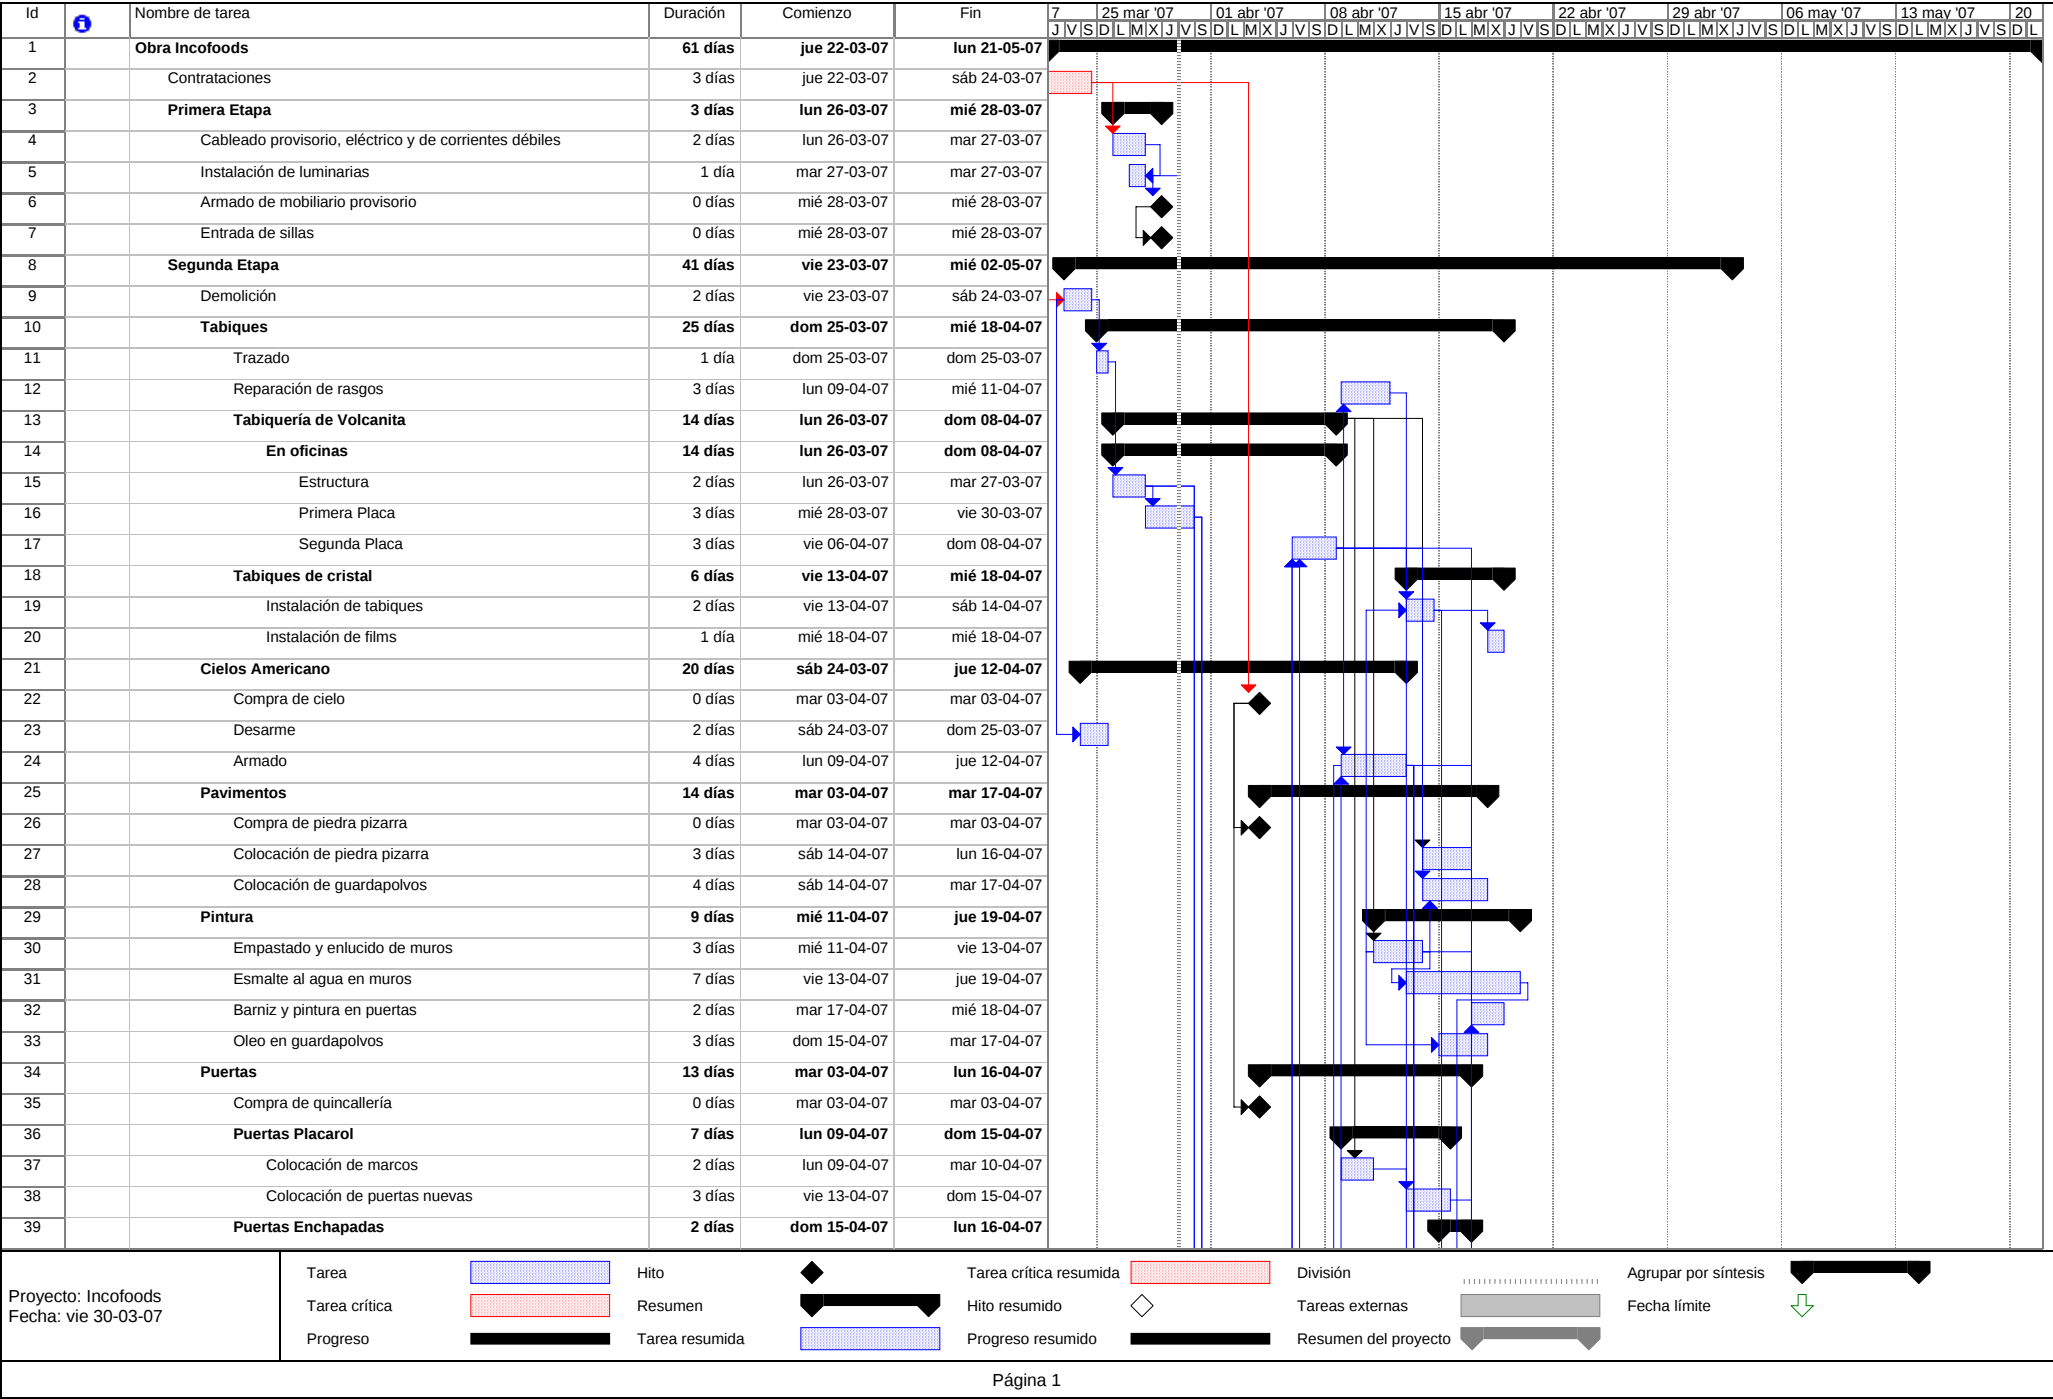

[illegible]

Proyecto: Incofoods  
Fecha: vie 30-03-07

|       |  |
|-------|--|
| Tarea |  |
|-------|--|

Hito 

### Tarea crítica

## Progreso

### Tarea crítica resumida

### Hito resumido

### Progreso resumido

División

## Tareas externas

## Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

| Id  | i | Nombre de tarea                          | Duración | Comienzo     | Fin          | 7     | 25 mar '07    | 01 abr '07    | 08 abr '07    | 15 abr '07    | 22 abr '07    | 29 abr '07    | 06 may '07    | 13 may '07    | 20  |
|-----|---|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|     |   |                                          |          |              |              | J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L |
| 79  |   | Pavimentos                               | 5 días   | jue 10-05-07 | lun 14-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 80  |   | Colocación de piedra pizarra             | 2 días   | jue 10-05-07 | vie 11-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 81  |   | Colocación de guardapolvos               | 3 días   | sáb 12-05-07 | lun 14-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 82  |   | Pintura                                  | 5 días   | jue 10-05-07 | lun 14-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 83  |   | Empastado y enlucido de muros            | 2 días   | jue 10-05-07 | vie 11-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 84  |   | Esmalte al agua en muros                 | 4 días   | vie 11-05-07 | lun 14-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 85  |   | Barniz y pintura en puertas              | 2 días   | dom 13-05-07 | lun 14-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 86  |   | Oleo en guardapolvos                     | 3 días   | vie 11-05-07 | dom 13-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 87  |   | Puertas                                  | 2 días   | jue 10-05-07 | vie 11-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 88  |   | Puertas Placarol                         | 2 días   | jue 10-05-07 | vie 11-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 89  |   | Colocación de marcos                     | 1 día    | jue 10-05-07 | jue 10-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 90  |   | Colocación de puertas nuevas             | 1 día    | vie 11-05-07 | vie 11-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 91  |   | Instalaciones                            | 18 días  | jue 03-05-07 | dom 20-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 92  |   | Electricidad y corrientes débiles        | 16 días  | sáb 05-05-07 | dom 20-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 93  |   | Canalizaciones                           | 3 días   | sáb 05-05-07 | lun 07-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 94  |   | Sobre cielo                              | 1 día    | sáb 05-05-07 | sáb 05-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 95  |   | En tabiques                              | 1 día    | lun 07-05-07 | lun 07-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 96  |   | Cableado                                 | 3 días   | mar 08-05-07 | jue 10-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 97  |   | Cableado por estaciones de trabajo       | 2 días   | vie 18-05-07 | sáb 19-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 98  |   | Instalación de artefactos de iluminación | 2 días   | sáb 12-05-07 | dom 13-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 99  |   | Instalación de chapa eléctrica           | 2 días   | lun 14-05-07 | mar 15-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 100 |   | Trabajos en el tablero                   | 2 días   | vie 11-05-07 | sáb 12-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 101 |   | Trabajos en el rack de comunicaciones    | 2 días   | sáb 19-05-07 | dom 20-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 102 |   | Climatización                            | 9 días   | sáb 05-05-07 | dom 13-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 103 |   | Instalación de extractores en cocina     | 2 días   | sáb 05-05-07 | dom 06-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 104 |   | Reubicación de difusores                 | 1 día    | vie 11-05-07 | vie 11-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 105 |   | Cableado de termostatos                  | 2 días   | sáb 12-05-07 | dom 13-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 106 |   | Gasfitería                               | 15 días  | jue 03-05-07 | jue 17-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 107 |   | En Cocina                                | 15 días  | jue 03-05-07 | jue 17-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 108 |   | Instalación de alcantarillado            | 2 días   | jue 03-05-07 | vie 04-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 109 |   | Instalación de agua                      | 2 días   | vie 04-05-07 | sáb 05-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 110 |   | Instalación de artefactos                | 1 día    | jue 17-05-07 | jue 17-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 111 |   | Mobiliario                               | 3 días   | mar 15-05-07 | jue 17-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 112 |   | Instalación de estaciones de trabajo     | 3 días   | mar 15-05-07 | jue 17-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 113 |   | Instalación de muebles de cocina         | 2 días   | mar 15-05-07 | mié 16-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 114 |   | Aseo final de obra                       | 1 día    | dom 20-05-07 | dom 20-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 115 |   | Mudanza                                  | 0 días   | lun 21-05-07 | lun 21-05-07 |       |               |               |               |               |               |               |               |               |     |

Proyecto: Incofoods  
Fecha: vie 30-03-07

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
