



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	AVANCE	Predecesoras	'13	03 mar '13	10 mar '13	17 mar '13	24 mar '13	31 mar '1
1	OBRA	16,9 días	mié 06/03/13	vie 22/03/13	48%		M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M
2	ETAPA 1	16,9 días	mié 06/03/13	vie 22/03/13	50%							
5	PISOS	1 día	mié 06/03/13	mié 06/03/13	100%							
6	SECADO DE PISO	1 día	jue 07/03/13	jue 07/03/13	100%	5						
3	DURLOCK	1 día	vie 08/03/13	vie 08/03/13	100%	6						
4	PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO	1 día	vie 08/03/13	vie 08/03/13	100%	6						
7	PINTURA	3 días	sáb 09/03/13	lun 18/03/13	50%	3,4						
9	CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN	2 días	mié 20/03/13	vie 22/03/13	0%	7,8						
8	EQUIPAMIENTO	2 días	lun 18/03/13	mié 20/03/13	0%	7,5						
10	ETAPA 2	16,9 días	mié 06/03/13	vie 22/03/13	61%							
11	DURLOCK	1 día	mié 06/03/13	mié 06/03/13	100%							
13	PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO	1 día	mié 06/03/13	lun 18/03/13	95%							
15	PISOS	1 día	jue 07/03/13	jue 07/03/13	100%	11						
12	SECADO DE PISO	1 día	vie 08/03/13	vie 08/03/13	100%	15						
14	PINTURA	2 días	lun 18/03/13	mié 20/03/13	45%	12,13						
17	CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN	1 día	jue 21/03/13	vie 22/03/13	0%	16						
16	EQUIPAMIENTO	1 día	mié 20/03/13	jue 21/03/13	0%	14						
18	ETAPA 3	16,9 días	mié 06/03/13	vie 22/03/13	64%							
21	PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO	2 días	mié 06/03/13	jue 07/03/13	70%							
19	DURLOCK	1 día	jue 07/03/13	jue 07/03/13	100%	11						
23	PISOS	3 días	vie 08/03/13	dom 10/03/13	100%	19						
20	SECADO DE PISO	1 día	lun 11/03/13	lun 11/03/13	100%	23						
22	PINTURA	3 días	mar 12/03/13	mar 19/03/13	33%	21,20						
24	EQUIPAMIENTO	2 días	vie 15/03/13	jue 21/03/13	45%	22						
25	CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN	1 día	jue 21/03/13	vie 22/03/13	0%	24						

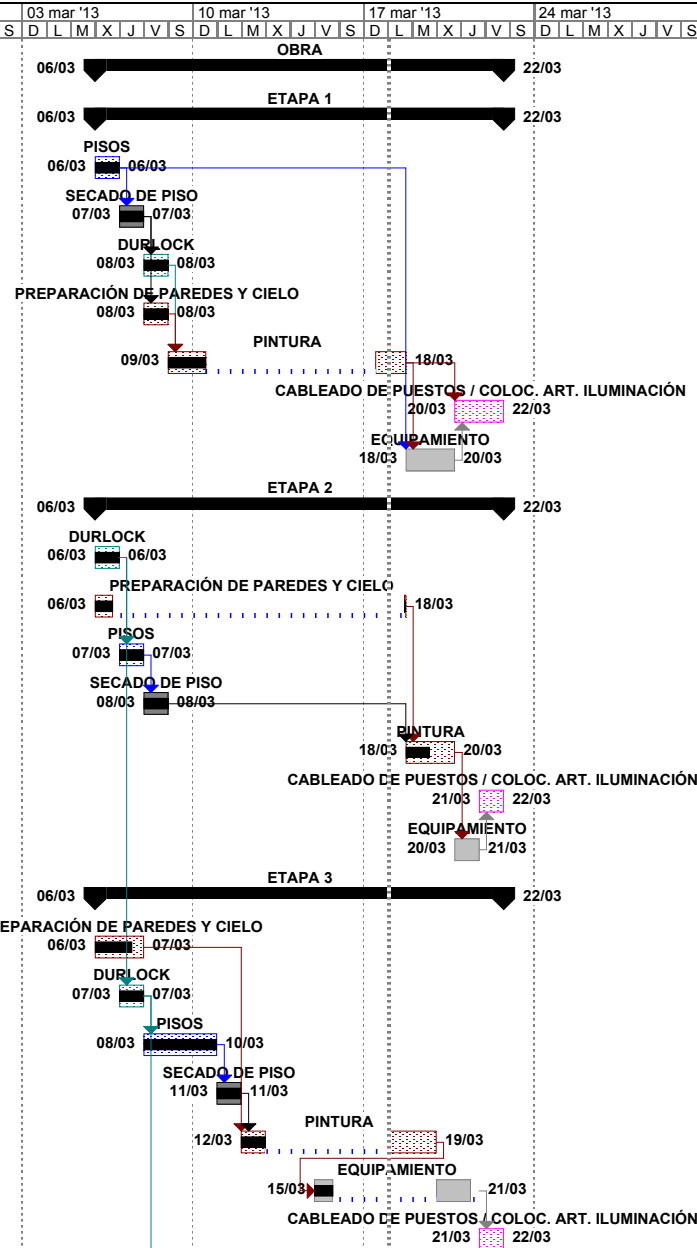

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	AVANCE	Predecesoras	'13	03 mar '13	10 mar '13	17 mar '13	24 mar '13	31 mar '1
							M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M
26	ETAPA 4	16,9 días	mié 06/03/13	vie 22/03/13	62%							
28	PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO	4 días	mié 06/03/13	sáb 09/03/13	70%							
27	DURLOCK	2 días	vie 08/03/13	sáb 09/03/13	90%	19						
30	PISOS	3 días	dom 10/03/13	mar 12/03/13	100%	27						
31	SECADO DE PISO	1 día	mié 13/03/13	mié 13/03/13	100%	30						
29	PINTURA	3 días	jue 14/03/13	mar 19/03/13	27%	31,28						
32	EQUIPAMIENTO	2 días	lun 18/03/13	mié 20/03/13	60%	29FC-2 días						
33	CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN	2 días	mié 20/03/13	vie 22/03/13	0%	32						
34	ETAPA 5	12,9 días	dom 10/03/13	vie 22/03/13	15%							
36	PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO	7 días	dom 10/03/13	dom 17/03/13	0%							
35	DURLOCK	3 días	dom 10/03/13	mar 12/03/13	50%	27						
38	PISOS	2 días	mié 13/03/13	jue 14/03/13	60%	35,30						
39	SECADO DE PISO	1 día	vie 15/03/13	vie 15/03/13	0%	38						
37	PINTURA	3 días	dom 17/03/13	mié 20/03/13	0%	39,36						
40	EQUIPAMIENTO	1 día	mié 20/03/13	jue 21/03/13	0%	37						
41	CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN	1 día	jue 21/03/13	vie 22/03/13	0%	40						
42	ETAPA 6	16,9 días	mié 06/03/13	vie 22/03/13	51%							
43	VIGA	1 día	mié 06/03/13	mié 06/03/13	100%							
44	LOSA Y CARPETA	2 días	jue 07/03/13	vie 08/03/13	100%	43						
45	DURLOCK	3 días	dom 10/03/13	mar 12/03/13	85%	35CC						
47	PISOS	2 días	mié 13/03/13	sáb 16/03/13	80%	45,38CC						
48	SECADO DE PISO	1 día	sáb 16/03/13	dom 17/03/13	0%	47						
46	PINTURA	3 días	dom 17/03/13	mié 20/03/13	0%	48						
49	EQUIPAMIENTO	1 día	mié 20/03/13	jue 21/03/13	0%	46						
50	CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN	1 día	jue 21/03/13	vie 22/03/13	0%	49						

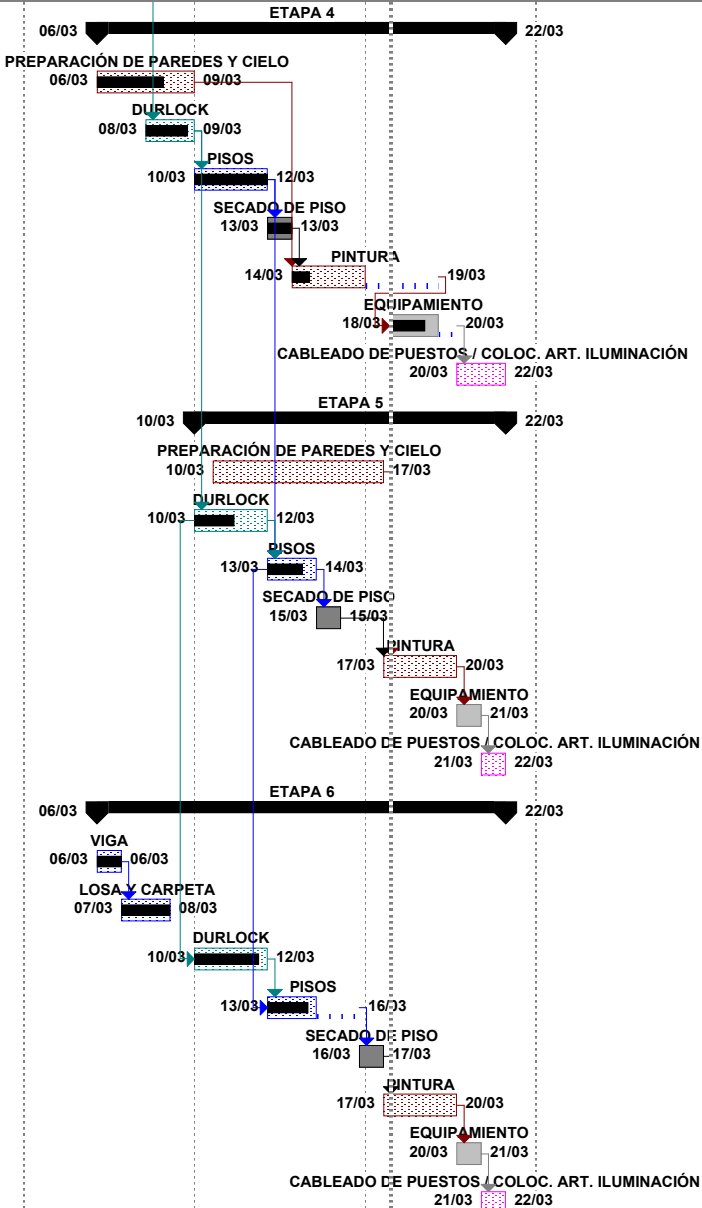

Proyecto: Proyect FINAL V2

Fecha: lun 18/03/13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
