


Id	i	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	17		
								S	D	L
1		Inicio	86 días	lun 17/06/13	lun 23/09/13					
2		Aprobación del presupuesto	1 día	lun 17/06/13	mar 18/06/13		Autorización de ingreso al ed			
3		Coordinación de inicio de obra	4 días	mar 18/06/13	sáb 22/06/13	2				
4		ART / SeH	5 días	vie 21/06/13	jue 27/06/13	3FC-1 día	Pedido de documentación a			
5		Inicio de obra	1 día	jue 27/06/13	vie 28/06/13	4	Replanteos / Inicio de trabajc			
6		Demoliciones	34 días	vie 28/06/13	mar 06/08/13					
7		Total del piso	34 días	vie 28/06/13	mar 06/08/13	5	Horario nocturno y fines de s			
8		Albañilería	21 días	sáb 13/07/13	mar 06/08/13					
9		Canalizaciones Grales	10 días	sáb 13/07/13	mié 24/07/13	7FC-21 días				
10		Contrapisos + carpetas	14 días	mié 17/07/13	vie 02/08/13	9FC-6 días				
11		Revoques	7 días	lun 29/07/13	mar 06/08/13	10FC-4 días				
12		instalaciones/Canalizaciones Sanitarias	9 días	vie 02/08/13	mar 13/08/13					
13		Tendido de cañerías y prueba hidráulica	6 días	vie 02/08/13	vie 09/08/13	10				
14		Tapado	3 días	vie 09/08/13	mar 13/08/13	13				
15		instalaciones/Canalizaciones Electricas	16 días	mar 06/08/13	sáb 24/08/13					
16		Canalizaciones	7 días	mar 06/08/13	mié 14/08/13	7				
17		Cableado	9 días	mié 14/08/13	sáb 24/08/13	16				
18		instalaciones/Canalizaciones Baja Tensión	35 días	dom 21/07/13	vie 30/08/13					
19		Canalizaciones	10 días	dom 21/07/13	jue 01/08/13	7FC-14 días				
20		Cableado + Armado de racks y certificaciones	25 días	jue 01/08/13	vie 30/08/13	19				
21		instalaciones/Canalizaciones Seguridad	9 días	sáb 10/08/13	mié 21/08/13					
22		Canalizaciones	4 días	sáb 10/08/13	jue 15/08/13	16FC-3 días				
23		Cableado	5 días	jue 15/08/13	mié 21/08/13	22				
24		instalaciones/Canalizaciones Aire acondicionado	34 días	mar 23/07/13	sáb 31/08/13					
25		Fabricación de ductos	10 días	mar 23/07/13	sáb 03/08/13	7FC-12 días				
26		Montaje de conductos	5 días	dom 04/08/13	vie 09/08/13	25				
27		Entrega de los equipos	15 días	mar 06/08/13	vie 23/08/13	7;8				
28		Montaje con las cañerías de cobre: 3 días.	3 días	vie 23/08/13	lun 26/08/13	27				
29		Montaje de equipos, Puesta en marcha y regulación	4 días	lun 26/08/13	sáb 31/08/13	28				
30		Tabiquería	8 días	mar 06/08/13	jue 15/08/13					

Proyecto: Project estimación Inici
Fecha: mar 16/07/13

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto




Fecha límite



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	17		
								S	D	L
31		Estructura + Emplacado	4 días	mar 06/08/13	sáb 10/08/13	7				
32		Emplacado + terminaciones	6 días	jue 08/08/13	jue 15/08/13	31FC-2 días				
33		Cielorrasos	7 días	sáb 10/08/13	dom 18/08/13					
34		Continuos, cajones, gargantas	7 días	sáb 10/08/13	dom 18/08/13	31				
35		Pintura	16 días	jue 15/08/13	lun 02/09/13					
36		Cielorrasos/ Losas	8 días	dom 18/08/13	mar 27/08/13	34				
37		Tabiquerías	16 días	jue 15/08/13	lun 02/09/13	32				
38		Revestimientos	6 días	jue 15/08/13	jue 22/08/13					
39		Colocación ceramicos/Porcellanato	6 días	jue 15/08/13	jue 22/08/13	32	Piso / pared			
40		Artefactos Iluminación	5 días	mié 28/08/13	lun 02/09/13					
41		Colocación de artefactos	5 días	mié 28/08/13	lun 02/09/13	36;34				
42		Frente de oficinas	25 días	sáb 10/08/13	dom 08/09/13					
43		Replanteo	1 día	sáb 10/08/13	dom 11/08/13	31				
44		Colocación	4 días	mar 03/09/13	dom 08/09/13	43FC+20 días				
45		Carpinterías	3 días	lun 02/09/13	vie 06/09/13					
46		Colocación	3 días	lun 02/09/13	vie 06/09/13	32;37				
47		Solados	14 días	jue 29/08/13	sáb 14/09/13					
48		Colocación	14 días	jue 29/08/13	sáb 14/09/13	36FC-2 días;37FC	Alfombras, cerámicos, made			
49		Artefactos sanitarios	4 días	jue 22/08/13	lun 26/08/13					
50		Colocación, empastinado, terminaciones	4 días	jue 22/08/13	lun 26/08/13	39				
51		Grafica	26 días	lun 12/08/13	mar 10/09/13					
52		Replanteo	1 día	lun 12/08/13	mar 13/08/13	43				
53		Colocación	2 días	dom 08/09/13	mar 10/09/13	44				
54		Cortinas	19 días	sáb 10/08/13	dom 01/09/13					
55		Replanteo	1 día	sáb 10/08/13	dom 11/08/13	31				
56		Colocación	3 días	jue 29/08/13	dom 01/09/13	55FC+15 días				
57		Mobiliario	16 días	mar 03/09/13	dom 22/09/13					
58		Armado	16 días	mar 03/09/13	dom 22/09/13	48FC-9 días				
59		Limpieza	76 días	vie 28/06/13	lun 23/09/13					
60		Diaria	70 días	vie 28/06/13	lun 16/09/13	5				

Proyecto: Project estimación Inici
Fecha: mar 16/07/13

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto



Fecha límite



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	17		
								S	D	L
61		Final	6 días	lun 16/09/13	lun 23/09/13	60				


Proyecto: Project estimación Inici

Fecha: mar 16/07/13

Tarea

División

Progreso







Hito

Resumen

Resumen del proyecto







Tareas externas


Hito externo


Fecha límite







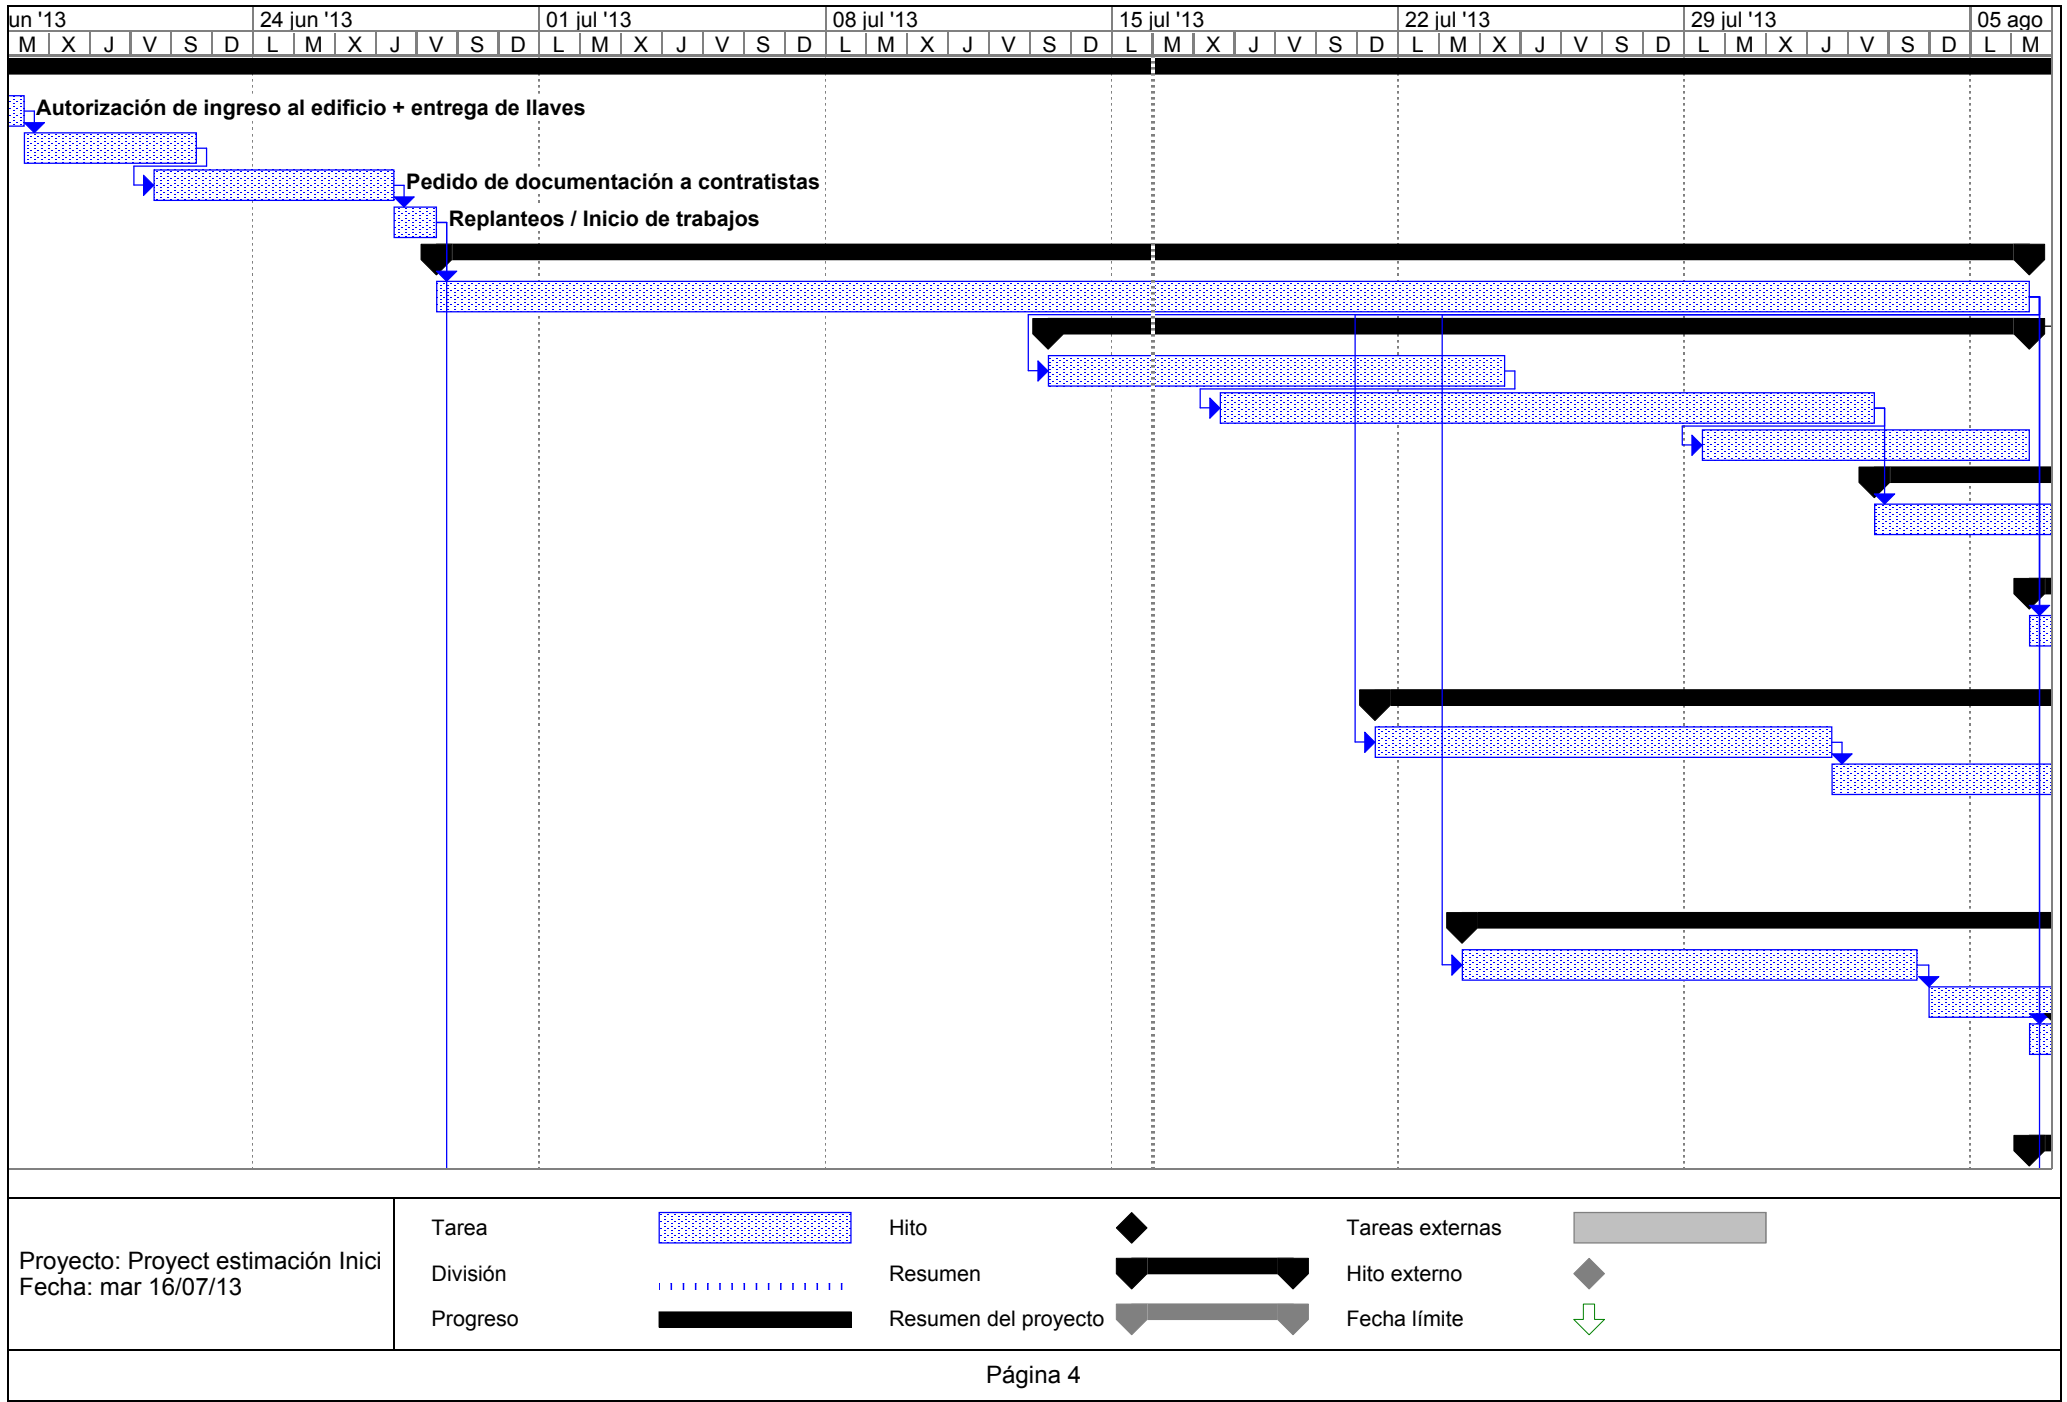

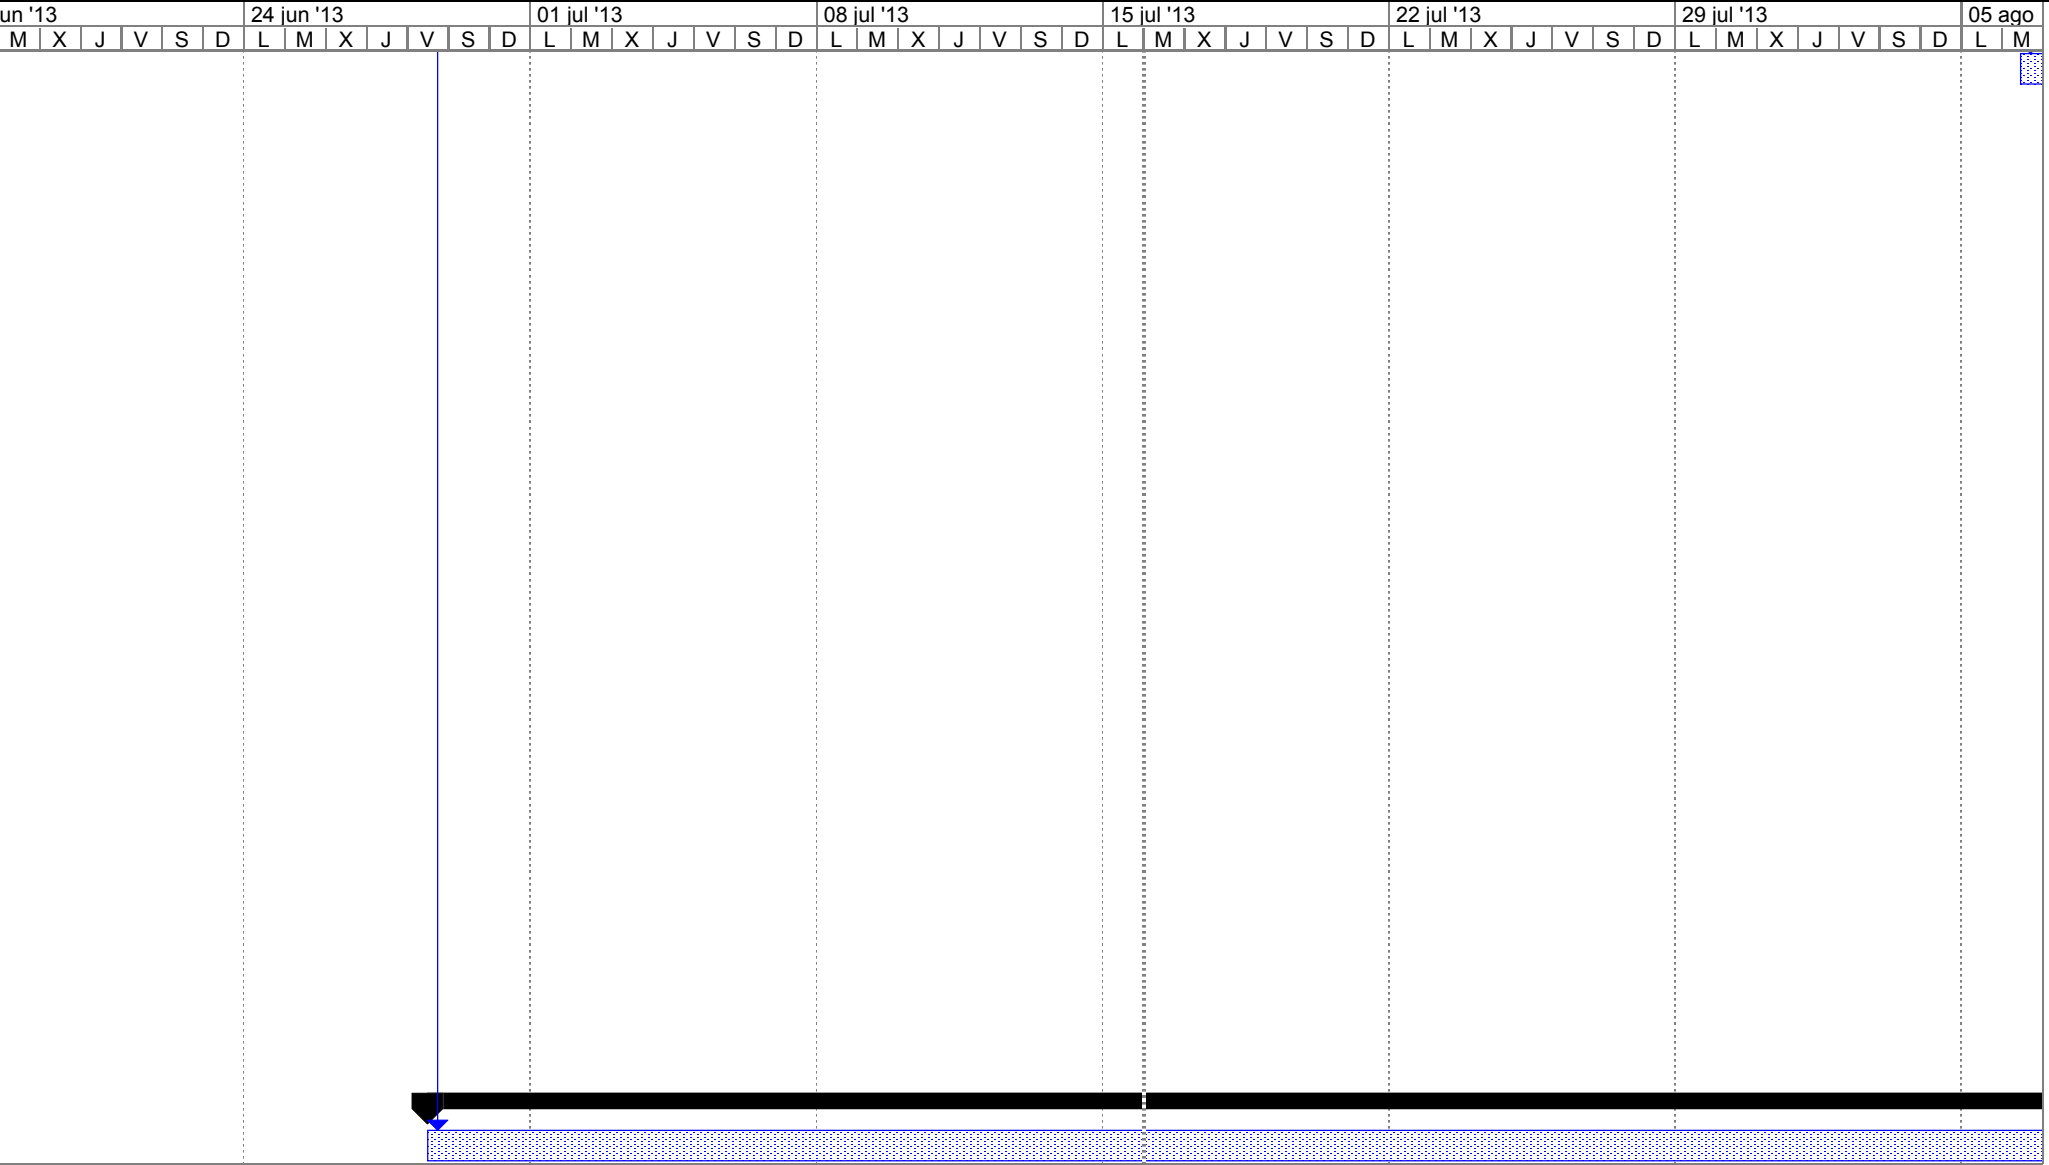

Proyecto: Project estimación Inici
Fecha: mar 16/07/13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto



Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

un '13						24 jun '13						01 jul '13						08 jul '13						15 jul '13						22 jul '13						29 jul '13						05 ago	
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	



Proyecto: Project estimación Inici Fecha: mar 16/07/13	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

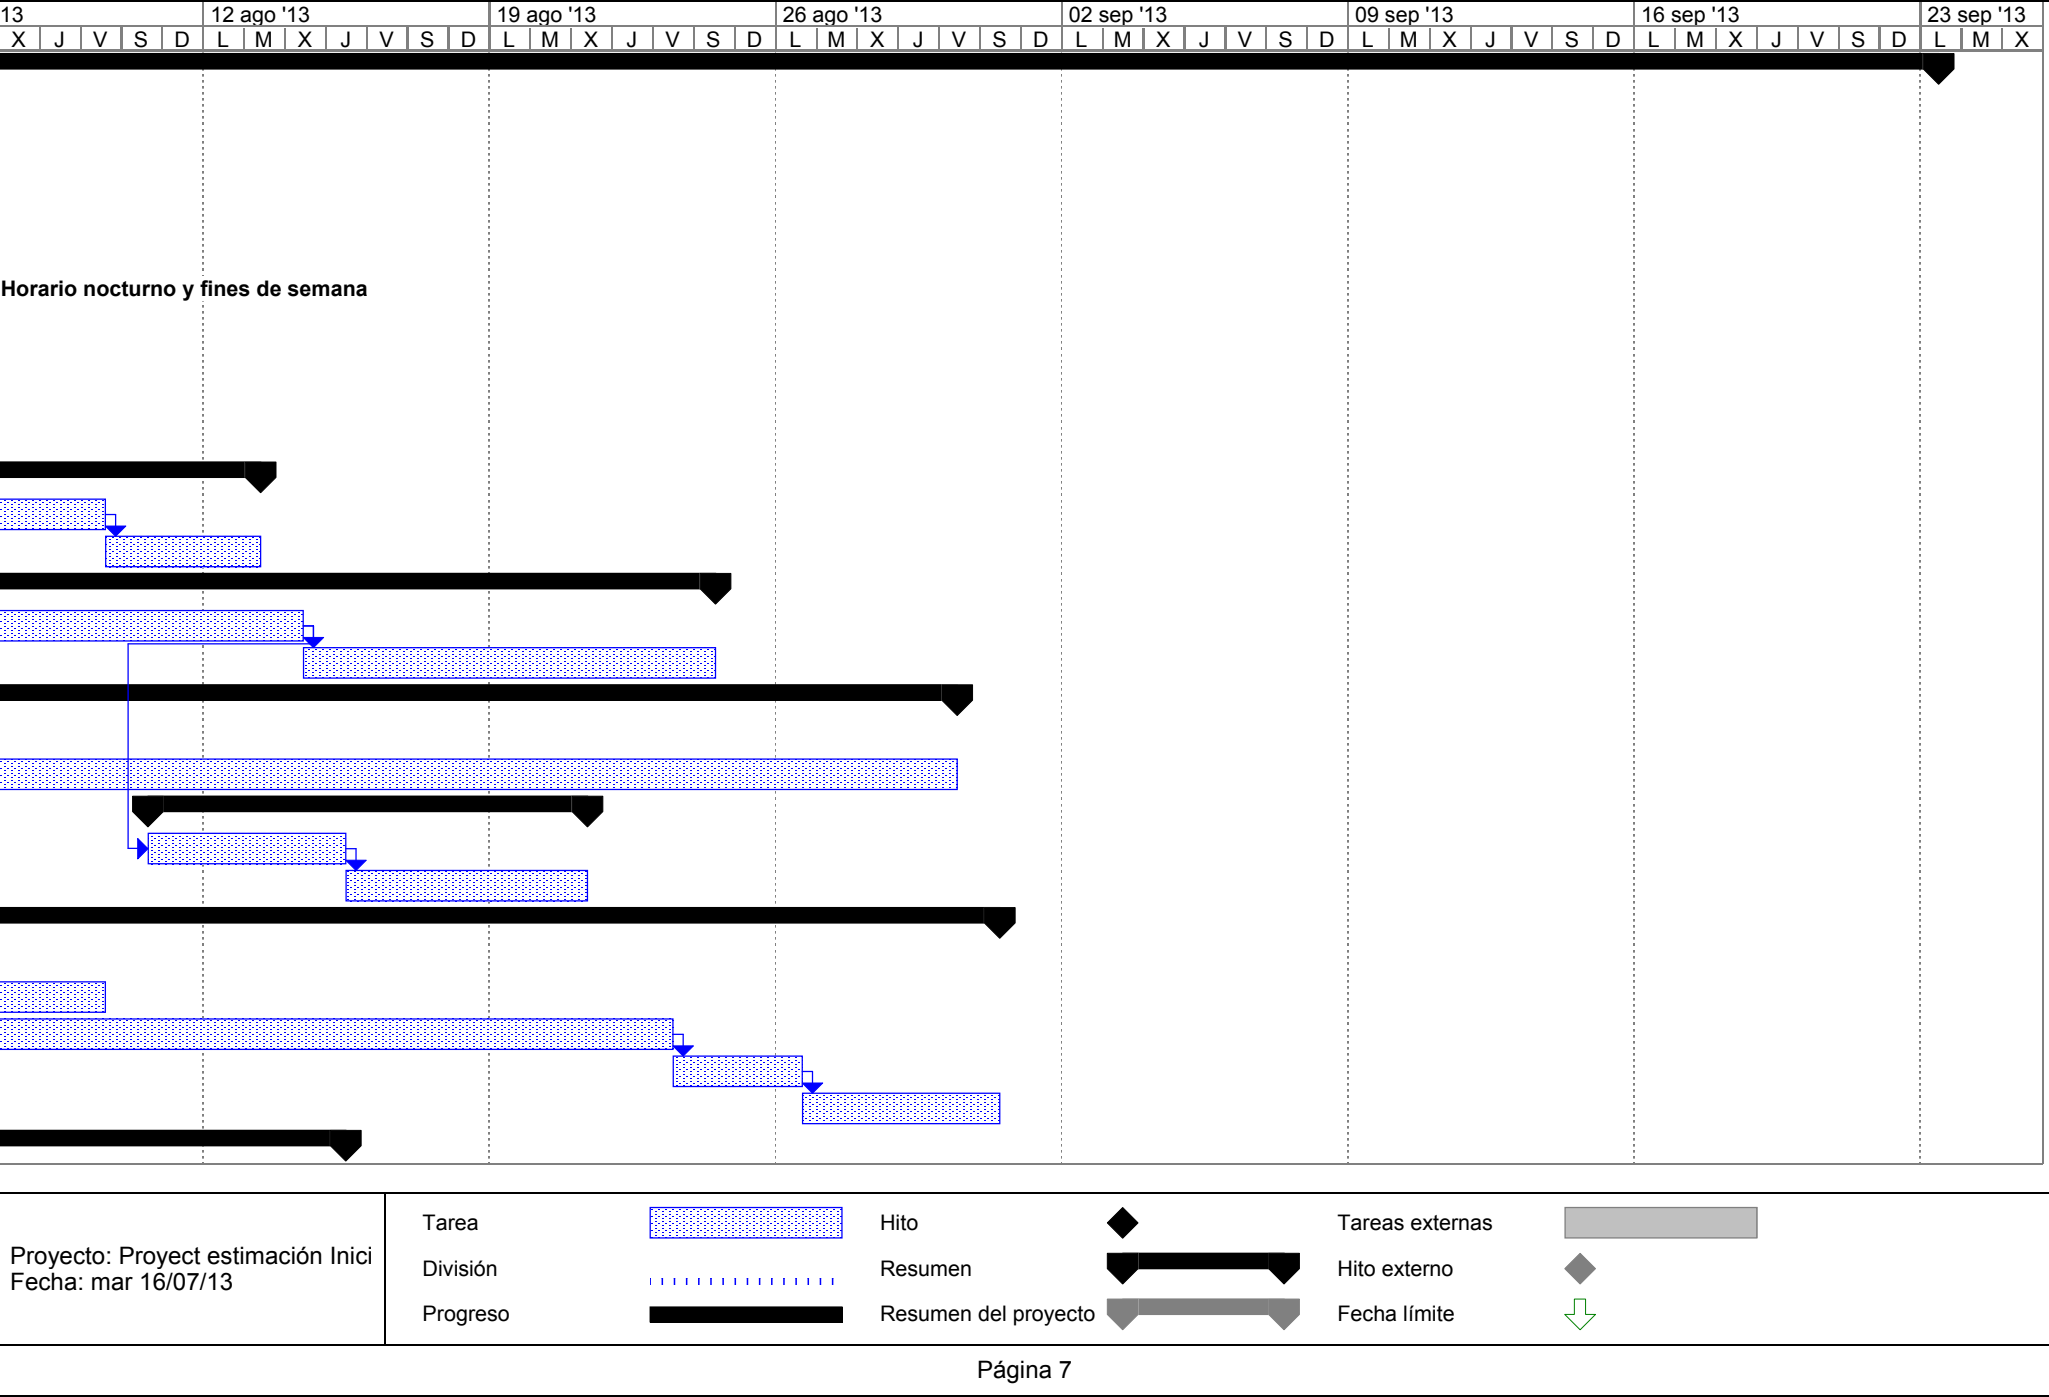


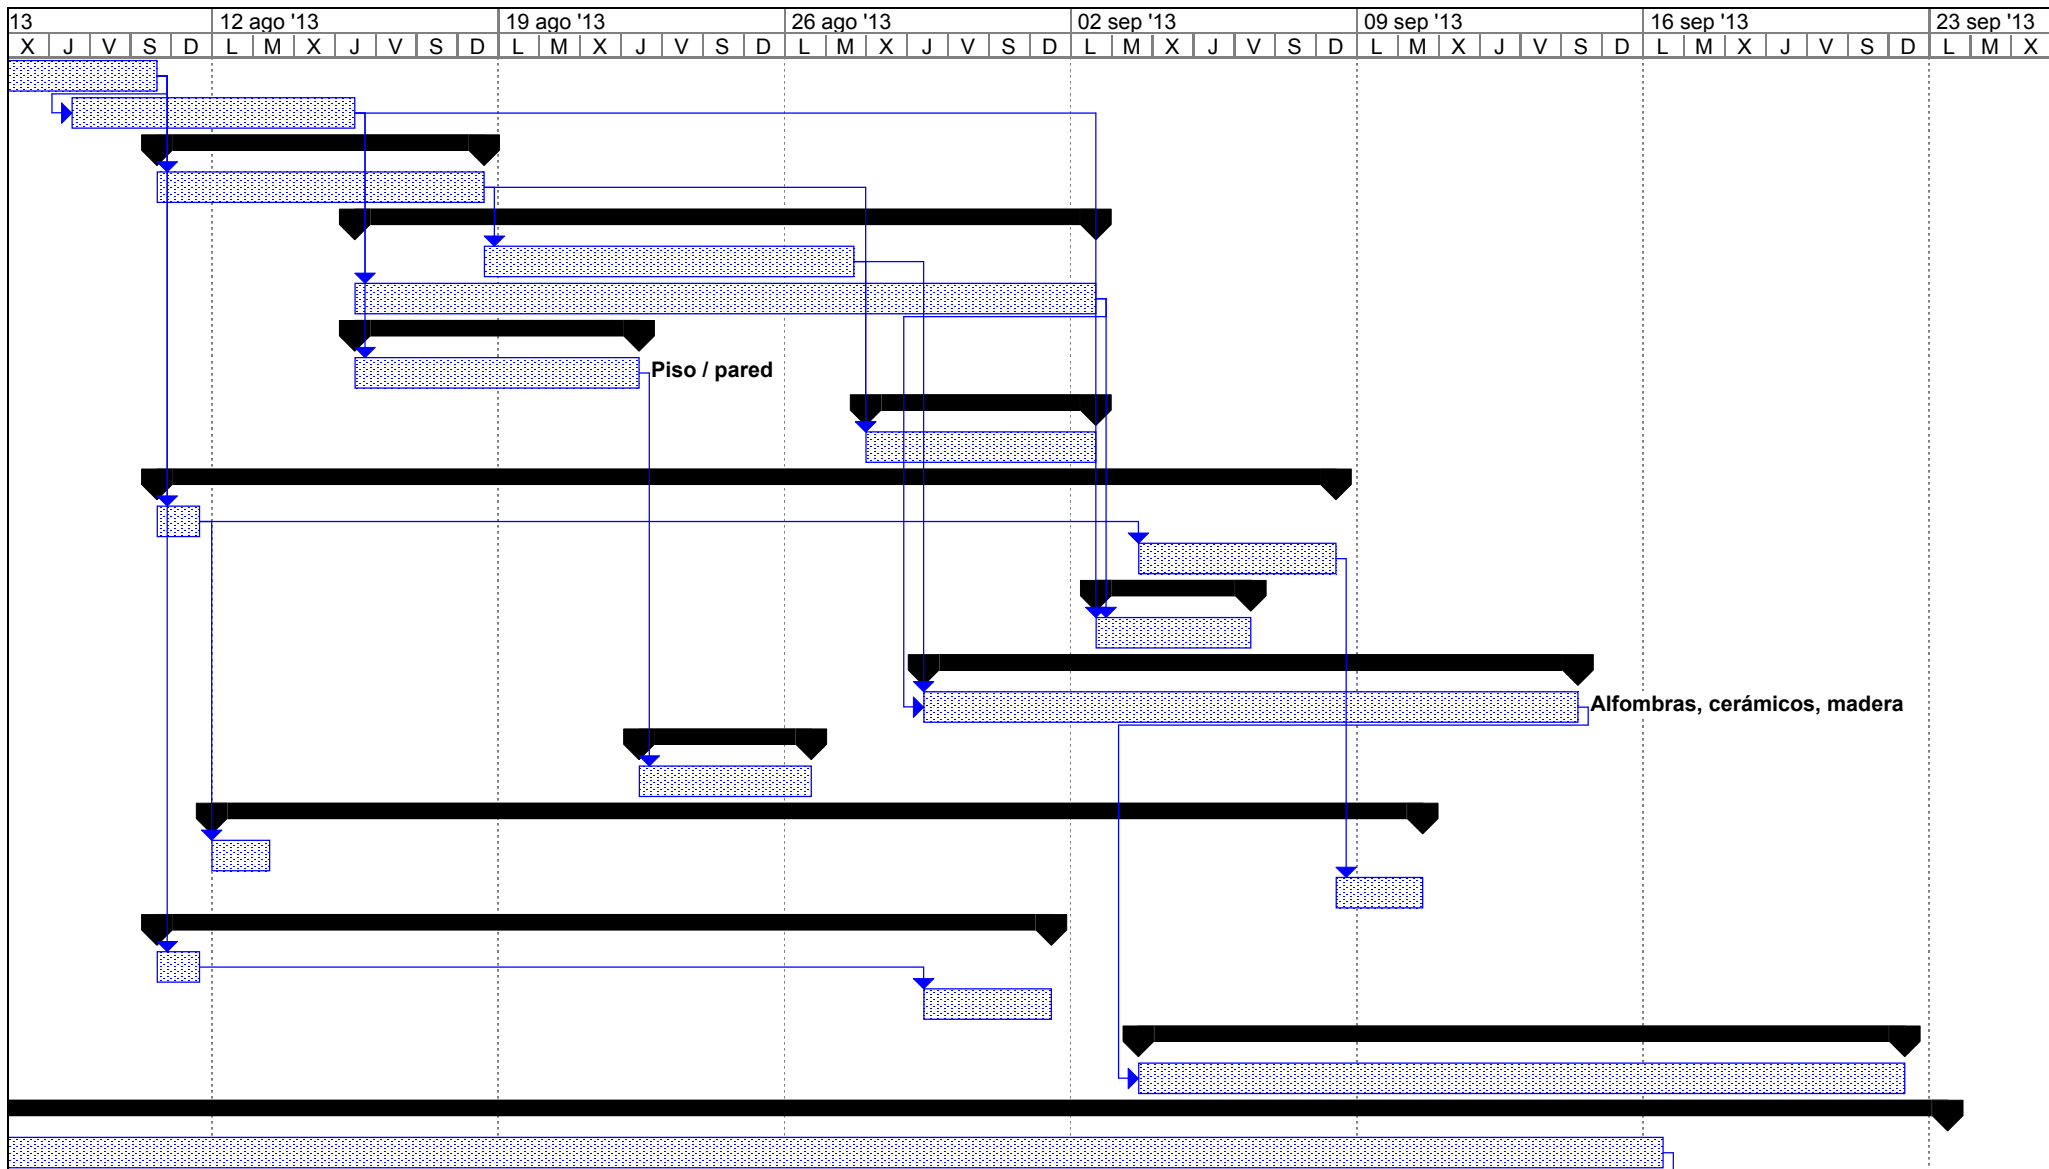

Proyecto: Project estimación Inici Fecha: mar 16/07/13	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

13					12 ago '13					19 ago '13					26 ago '13					02 sep '13					09 sep '13					16 sep '13					23 sep '13		
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		



Proyecto: Project estimación Inici Fecha: mar 16/07/13	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	
