


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeseo	% trabajo completado	% completado
1	Obr: DUPONT	84 días	lun 12/08/13	sáb 12/10/13		0%	22%
2	Inicio de obra	0 días	lun 12/08/13	lun 12/08/13		100%	0%
3	DEMOLICIONES	7 días	lun 12/08/13	lun 19/08/13		100%	100%
6	Descolocación de frentes en cristal Interior	2 días	lun 12/08/13	mar 13/08/13	2	100%	100%
4	Trabajos de demolición de cielorrasos en placa de roca de yeso	3 días	mar 13/08/13	jue 15/08/13	8FC-1 día	100%	100%
5	Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso, espesor promedio 0,10m	3 días	vie 16/08/13	lun 19/08/13	4	100%	100%
47	INSTALACION SANITARIA	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13		0%	0%
48	Instalación sanitaria en coffee (incluido albañilería)	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13	9FC-1 día	0%	0%
49	INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO	4 días	mié 28/08/13	sáb 31/08/13		0%	0%
50	Corrimiento de sprinklers	4 días	mié 28/08/13	sáb 31/08/13	4FC+10 días	0%	0%
36	HERRERIA	5 días	mié 28/08/13	lun 02/09/13		0%	0%
39	Puerta contra incendio F60	2 días	mié 28/08/13	jue 29/08/13	9	0%	0%
37	soporte guías de puertas plegadizas y/o corredizas	3 días	mié 28/08/13	vie 30/08/13	4FC+10 días	0%	0%
38	soporte puerta blindex	2 días	sáb 31/08/13	lun 02/09/13	4,37	0%	0%
7	TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO	19 días	lun 19/08/13	lun 09/09/13		0%	60%
8	Ejecución de estructura	4 días	lun 19/08/13	jue 22/08/13	5FC-1 día	100%	100%
9	Emplacado de 1° cara	4 días	vie 23/08/13	mar 27/08/13	8	100%	100%
10	Emplacado de 2° cara	5 días	lun 02/09/13	vie 06/09/13	9,48,54,55	0%	0%
11	Sobre tabiques	2 días	sáb 07/09/13	lun 09/09/13	10	0%	50%
12	CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO	8 días	mié 11/09/13	jue 19/09/13		0%	25%
13	Ejecución de cielorraso continuo	8 días	mié 11/09/13	jue 19/09/13	10,11,37,3	0%	25%
14	CIELORRASO MODULAR	7 días	vie 20/09/13	vie 27/09/13		0%	0%
15	Armado de nuevos cielorraso modular	4 días	vie 20/09/13	mar 24/09/13	13	0%	0%
16	Nivelación de cielorraso existente	3 días	mié 25/09/13	vie 27/09/13	15	0%	0%
29	PINTURA	20 días	jue 05/09/13	vie 27/09/13		0%	0%
30	Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado	19 días	jue 05/09/13	jue 26/09/13	10FC-2 días	0%	0%
31	Preparación y pintura cielorraso latex común	7 días	vie 20/09/13	vie 27/09/13	13	0%	0%
17	PISOS ALFOMBRADOS	42 días	lun 12/08/13	sáb 28/09/13		0%	83%
18	Definición/Compra de alfombra	10 días	lun 12/08/13	jue 22/08/13		100%	100%
19	Instalación de alfombra modular	2 días	vie 27/09/13	sáb 28/09/13	18FC+30 días,30	0%	0%
26	PISOS TECNICOS	42 días	lun 12/08/13	sáb 28/09/13		0%	0%
27	Definición/Compra de piso técnico	15 días	lun 12/08/13	mié 28/08/13		0%	0%
28	Instalación de piso técnico	2 días	vie 27/09/13	sáb 28/09/13	27FC+15 días,30	0%	0%
32	CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES	29 días	mié 28/08/13	lun 30/09/13		0%	0%
34	Puerta placa	2 días	mié 28/08/13	jue 29/08/13	9	0%	0%
35	Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida	2 días	vie 27/09/13	sáb 28/09/13	30	0%	0%
33	Mueble de cocina bajo	3 días	vie 27/09/13	lun 30/09/13	30	0%	0%
66	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	30 días	mar 27/08/13	lun 30/09/13		0%	0%
68	Instalación de cañerías de nuevo split en DC	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13	9FC-1 día	0%	0%
67	Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout	10 días	mié 28/08/13	sáb 07/09/13	4FC+10 días	0%	0%
69	Instalación de split	3 días	vie 27/09/13	lun 30/09/13	30,68	0%	0%
45	MESADAS	2 días	mar 01/10/13	mié 02/10/13		0%	0%
46	Instalación de mesada Granito NEGRO BRASIL	2 días	mar 01/10/13	mié 02/10/13	33	0%	0%
72	CORTINAS Y PERSIANAS	3 días	lun 30/09/13	mié 02/10/13		0%	0%
73	Instalación de cortinas	3 días	lun 30/09/13	mié 02/10/13	19	0%	0%
74	MUEBLES ESPECIALES	46 días	lun 12/08/13	jue 03/10/13		0%	0%
77	Definición y Compra de Equipamiento Caporaso (COMPRA EL CLIENTE GIULIANI)	10 días	lun 12/08/13	jue 22/08/13		0%	0%
75	Mueble de recepción (mesa y barra coffee)	2 días	lun 30/09/13	mar 01/10/13	19	0%	0%
76	Mueble de guardado	4 días	lun 30/09/13	jue 03/10/13	19	0%	0%
78	Armado de Equipamiento Caporaso	4 días	lun 30/09/13	jue 03/10/13	77FC+30 días,19	0%	0%
20	PISOS DE MADERA / FLOTANTES	47 días	lun 12/08/13	vie 04/10/13		0%	88%
21	Definición/Compra de piso flotante	15 días	lun 12/08/13	mié 28/08/13		100%	100%
22	Instalación de piso flotante	2 días	jue 03/10/13	vie 04/10/13	21FC+30 días,30	0%	0%
23	PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA	47 días	lun 12/08/13	vie 04/10/13		0%	0%
24	Definición/Compra de piso vinílico	15 días	lun 12/08/13	mié 28/08/13		0%	0%
25	Instalación de piso vinílico	2 días	jue 03/10/13	vie 04/10/13	24FC+30 días,30	0%	0%
40	CRISTALES	8 días	lun 30/09/13	mar 08/10/13		0%	0%
41	Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral	4 días	lun 30/09/13	jue 03/10/13	30,19	0%	0%
42	Puerta De cristal	2 días	vie 04/10/13	sáb 05/10/13	41	0%	0%
43	Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con fijaciones en aluminio	1 día	lun 07/10/13	lun 07/10/13	42	0%	0%
44	Revestimiento de cristal en recepción	1 día	mar 08/10/13	mar 08/10/13	43	0%	0%
70	GRAFICA Y SEÑALIZACION	4 días	vie 04/10/13	mar 08/10/13		0%	0%
71	Colocación de vinilos	4 días	vie 04/10/13	mar 08/10/13	41	0%	0%
51	INSTALACION ELECTRICA	51 días	lun 12/08/13	mié 09/10/13		0%	25%
52	Electricidad de obra	3 días	lun 12/08/13	mié 14/08/13	2	100%	100%
53	Colocación de bandejas en piso	10 días	mar 20/08/13	vie 30/08/13	5	100%	100%
54	Colocación de cañerías para piso y en tabiques	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13	9FC-1 día	0%	40%
55	Cañerías Multimedia	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13	9FC-1 día	0%	0%
57	Cableado iluminación	15 días	jue 15/08/13	sáb 31/08/13	52	0%	50%
56	Cañerías vacías dentro de cielorraso para CA	8 días	lun 02/09/13	mar 10/09/13	4,54	0%	0%
58	Cableado tensión común y dedicada	10 días	sáb 31/08/13	mié 11/09/13	53	0%	0%
60	Cableado estructurado	10 días	jue 12/09/13	lun 23/09/13	58	0%	0%
62	Colocación de Face Plate en puestos de trabajo	5 días	vie 27/09/13	mié 02/10/13	30	0%	0%
59	Adecuación de tablero seccional	9 días	mar 24/09/13	jue 03/10/13	58,60	0%	0%
63	Cableado de puestos	4 días	jue 03/10/13	lun 07/10/13	78FC-1 día	0%	0%
61	Armado de racks, patch panels, patch cords	6 días	jue 03/10/13	mié 09/10/13	60FC-1 día,59FC-1	0%	0%
64	INSTALACION CONTROL DE ACCESO	5 días	vie 04/10/13	mié 09/10/13		0%	0%
65	Instalación de control de acceso	5 días	vie 04/10/13	mié 09/10/13	56,41	0%	0%
79	VARIOS	6 días	lun 07/10/13	sáb 12/10/13		0%	15%
80	Detalles terminaciones (Preliminares, zócalos, artefactos de iluminación, limpieza, , ac	6 días	lun 07/10/13	sáb 12/10/13	63FC-1 día	0%	15%



ID			NOMBRE DE LA OBRAS	DURACION	COMIENZO	FIN	PREDECESO	% TRABAJO COMPLETADO	% COMPLETADO
1			OBRAS: DUPONT	54 dias	lun 12/08/13	sab 12/10/13			23%
2			Inicio de obra	0 dias	lun 12/08/13	lun 12/08/13		100%	0%
3			DEMOLICIONES	7 dias	lun 12/08/13	lun 19/08/13		100%	100%
6			Descolocación de frentes en cristal Interior	2 dias	lun 12/08/13	mar 13/08/13	2	100%	100%
4			Trabajos de demolición de cielorrasos en placa de roca de yeso	3 dias	mar 13/08/13	jue 15/08/13	8FC-1 dia	100%	100%
5			Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0.10m	3 dias	vie 16/08/13	lun 19/08/13	4	100%	100%
47			INSTALACION SANITARIA	5 dias	mar 27/08/13	sab 31/08/13		0%	0%
48			Instalación sanitaria en coffee (incluido albañilería)	5 dias	mar 27/08/13	sab 31/08/13	9FC-1 dia	0%	0%
49			INSTALACION EXTINTION DE INCENDIO	4 dias	mié 28/08/13	sab 31/08/13		0%	0%
50			Corrimiento de sprinklers	4 dias	mié 28/08/13	sab 31/08/13	4FC+10 dias	0%	0%
36			HERRERIA	5 dias	mié 28/08/13	lun 02/09/13		0%	0%
39			Puerta contra incendio F60	2 dias	mié 28/08/13	jue 29/08/13	9	0%	0%
37			soporte guías de puertas plegadizas y/o correderas	3 dias	mié 28/08/13	vie 30/08/13	4FC+10 dias	0%	0%
38			soporte puerta blindex	2 dias	sab 31/08/13	lun 02/09/13	4.37	0%	0%
7			TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO	19 dias	lun 19/08/13	lun 09/09/13		0%	63%
8			Ejecución de estructura	4 dias	lun 19/08/13	jue 22/08/13	9FC-1 dia	100%	100%
9			Emplacado de 1ª cara	4 dias	vie 23/08/13	mar 27/08/13	8	100%	100%
10			Emplacado de 2ª cara	5 dias	lun 02/09/13	vie 06/09/13	9.48.54.55	0%	0%
11			Sobre tabiques	2 dias	sab 07/09/13	lun 09/09/13	10	0%	75%
12			CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO	8 dias	mié 11/09/13	jue 19/09/13		0%	50%
13			Ejecución de cielorraso continuo	8 dias	mié 11/09/13	jue 19/09/13	10.11.37.3	0%	50%
14			CIELORRASO MODULAR	7 dias	vie 20/09/13	vie 27/09/13		0%	0%
15			Armado de nuevos cielorraso modular	4 dias	vie 20/09/13	mar 24/09/13	13	0%	0%
16			Nivelación de cielorraso existente	3 dias	mié 25/09/13	vie 27/09/13	15	0%	0%
29			PINTURA	20 dias	jue 05/09/13	vie 27/09/13		0%	0%
30			Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado	19 dias	jue 05/09/13	jue 26/09/13	10FC-2 dias	0%	0%
31			Preparación y pintura cielorraso latex común	7 dias	vie 20/09/13	vie 27/09/13	13	0%	0%
17			PISOS ALFOMBRADOS	42 dias	lun 12/08/13	sab 28/09/13		0%	83%
18			Definición/Compra de alfombra	10 dias	lun 12/08/13	jue 22/08/13		100%	100%
19			Instalación de alfombra modular	2 dias	vie 27/09/13	sab 28/09/13	18FC+30 dias.30	0%	0%
26			PISOS TECNICOS	42 dias	lun 12/08/13	sab 28/09/13		0%	0%
27			Definición/Compra de piso técnico	15 dias	lun 12/08/13	mié 28/08/13		0%	0%
28			Instalación de piso técnico	2 dias	vie 27/09/13	sab 28/09/13	27FC+15 dias.30	0%	0%
32			CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES	29 dias	mié 28/08/13	lun 30/09/13		0%	0%
34			Puerta placa	2 dias	mié 28/08/13	jue 29/08/13	9	0%	0%
35			Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida	2 dias	vie 27/09/13	sab 28/09/13	30	0%	0%
33			Mueble de cocina bajo	3 dias	vie 27/09/13	lun 30/09/13	30	0%	0%
66			INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	30 dias	mar 27/08/13	lun 30/09/13		0%	0%
68			Instalación de cañerías de nuevo split en DC	5 dias	mar 27/08/13	sab 31/08/13	9FC-1 dia	0%	0%
67			Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout	10 dias	mié 28/08/13	sab 07/09/13	4FC+10 dias	0%	0%
69			Instalación de split	3 dias	vie 27/09/13	lun 30/09/13	30.68	0%	0%
45			MESADAS	2 dias	mar 01/10/13	mié 02/10/13		0%	0%
46			Instalación de mesada Granito NEGRO BRASIL	2 dias	mar 01/10/13	mié 02/10/13	33	0%	0%
72			CORTINAS Y PERSIANAS	3 dias	lun 30/09/13	mié 02/10/13		0%	0%
73			Instalación de cortinas	3 dias	lun 30/09/13	mié 02/10/13	19	0%	0%
74			MUEBLES ESPECIALES	46 dias	lun 12/08/13	jue 03/10/13		0%	0%
77			Definición y Compra de Equipamiento Caporaso (COMPRA EL CLIENTE GULIANI)	10 dias	lun 12/08/13	jue 22/08/13		0%	0%
75			Mueble de recepción (mesa y barra coffee)	2 dias	lun 30/09/13	mar 01/10/13	19	0%	0%
76			Mueble de guardado	4 dias	lun 30/09/13	jue 03/10/13	19	0%	0%
78			Armado de Equipamiento Caporaso	4 dias	lun 30/09/13	jue 03/10/13	77FC+30 dias.19	0%	0%
20			PISOS DE MADERA / FLOTANTES	47 dias	lun 12/08/13	vie 04/10/13		0%	88%
21			Definición/Compra de piso flotante	15 dias	lun 12/08/13	mié 28/08/13		100%	100%
22			Instalación de piso flotante	2 dias	jue 03/10/13	vie 04/10/13	21FC+30 dias.30	0%	0%
23			PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA	47 dias	lun 12/08/13	vie 04/10/13		0%	0%
24			Definición/Compra de piso vinílico	15 dias	lun 12/08/13	mié 28/08/13		0%	0%
25			Instalación de piso vinílico	2 dias	jue 03/10/13	vie 04/10/13	24FC+30 dias.30	0%	0%
26			CRISTALES	8 dias	lun 30/09/13	mar 06/10/13		0%	0%
41			Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral	4 dias	lun 30/09/13	jue 03/10/13	30.19	0%	0%
42			Puerta De cristal	2 dias	vie 04/10/13	sab 05/10/13	41	0%	0%
43			Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con fijaciones en aluminio	1 dia	lun 07/10/13	lun 07/10/13	42	0%	0%
44			Revestimiento de cristal en recepción	1 dia	mar 08/10/13	mar 08/10/13	43	0%	0%
70			GRAFICA Y SENALIZACION	4 dias	vie 04/10/13	mar 06/10/13		0%	0%
71			Colocación de vinilos	4 dias	vie 04/10/13	mar 06/10/13	41	0%	0%
51			INSTALACION ELECTRICA	51 dias	lun 12/08/13	mié 09/10/13		0%	26%
52			Electricidad de obras	3 dias	lun 12/08/13	mié 14/08/13	2	100%	100%
53			Colocación de bandejas en piso	10 dias	mar 20/08/13	vie 30/08/13	5	100%	100%
54			Colocación de cañerías para piso y en tabiques	5 dias	mar 27/08/13	sab 31/08/13	9FC-1 dia	0%	65%
55			Cañerías Multimedia	5 dias	mar 27/08/13	sab 31/08/13	9FC-1 dia	0%	0%
57			Cableado iluminación	15 dias	jue 15/08/13	sab 31/08/13	52	0%	50%
56			Cañerías vacías dentro de cielorraso para CA	8 dias	lun 02/09/13	mar 10/09/13	4.54	0%	0%
58			Cableado tensión común y dedicada	10 dias	sab 31/08/13	mié 11/09/13	53	0%	0%
60			Cableado estructurado	10 dias	jue 12/09/13	lun 23/09/13	58	0%	0%
62			Colocación de Face Plate en puestos de trabajo	5 dias	vie 27/09/13	mié 02/10/13	30	0%	0%
59			Adecuación de tablero seccional	9 dias	mar 24/09/13	jue 03/10/13	58.60	0%	0%
63			Cableado de puestos	4 dias	jue 03/10/13	lun 07/10/13	78FC-1 dia	0%	0%
61			Armado de racks, patch panels, patch cords	6 dias	jue 03/10/13	mié 09/10/13	60FC-1 dia.59FC-1 dia	0%	0%
64			INSTALACION CONTROL DE ACCESO	5 dias	vie 04/10/13	mié 09/10/13		0%	0%
65			Instalación de control de acceso	5 dias	vie 04/10/13	mié 09/10/13	56.41	0%	0%
79			VARIOS	6 dias	lun 07/10/13	sab 12/10/13		0%	20%
80			Detalles terminaciones (Preamolinos, zócalos, anclafijos de iluminación, limpieza, accesorios)	6 dias	lun 07/10/13	sab 12/10/13	63FC-1 dia	0%	20%

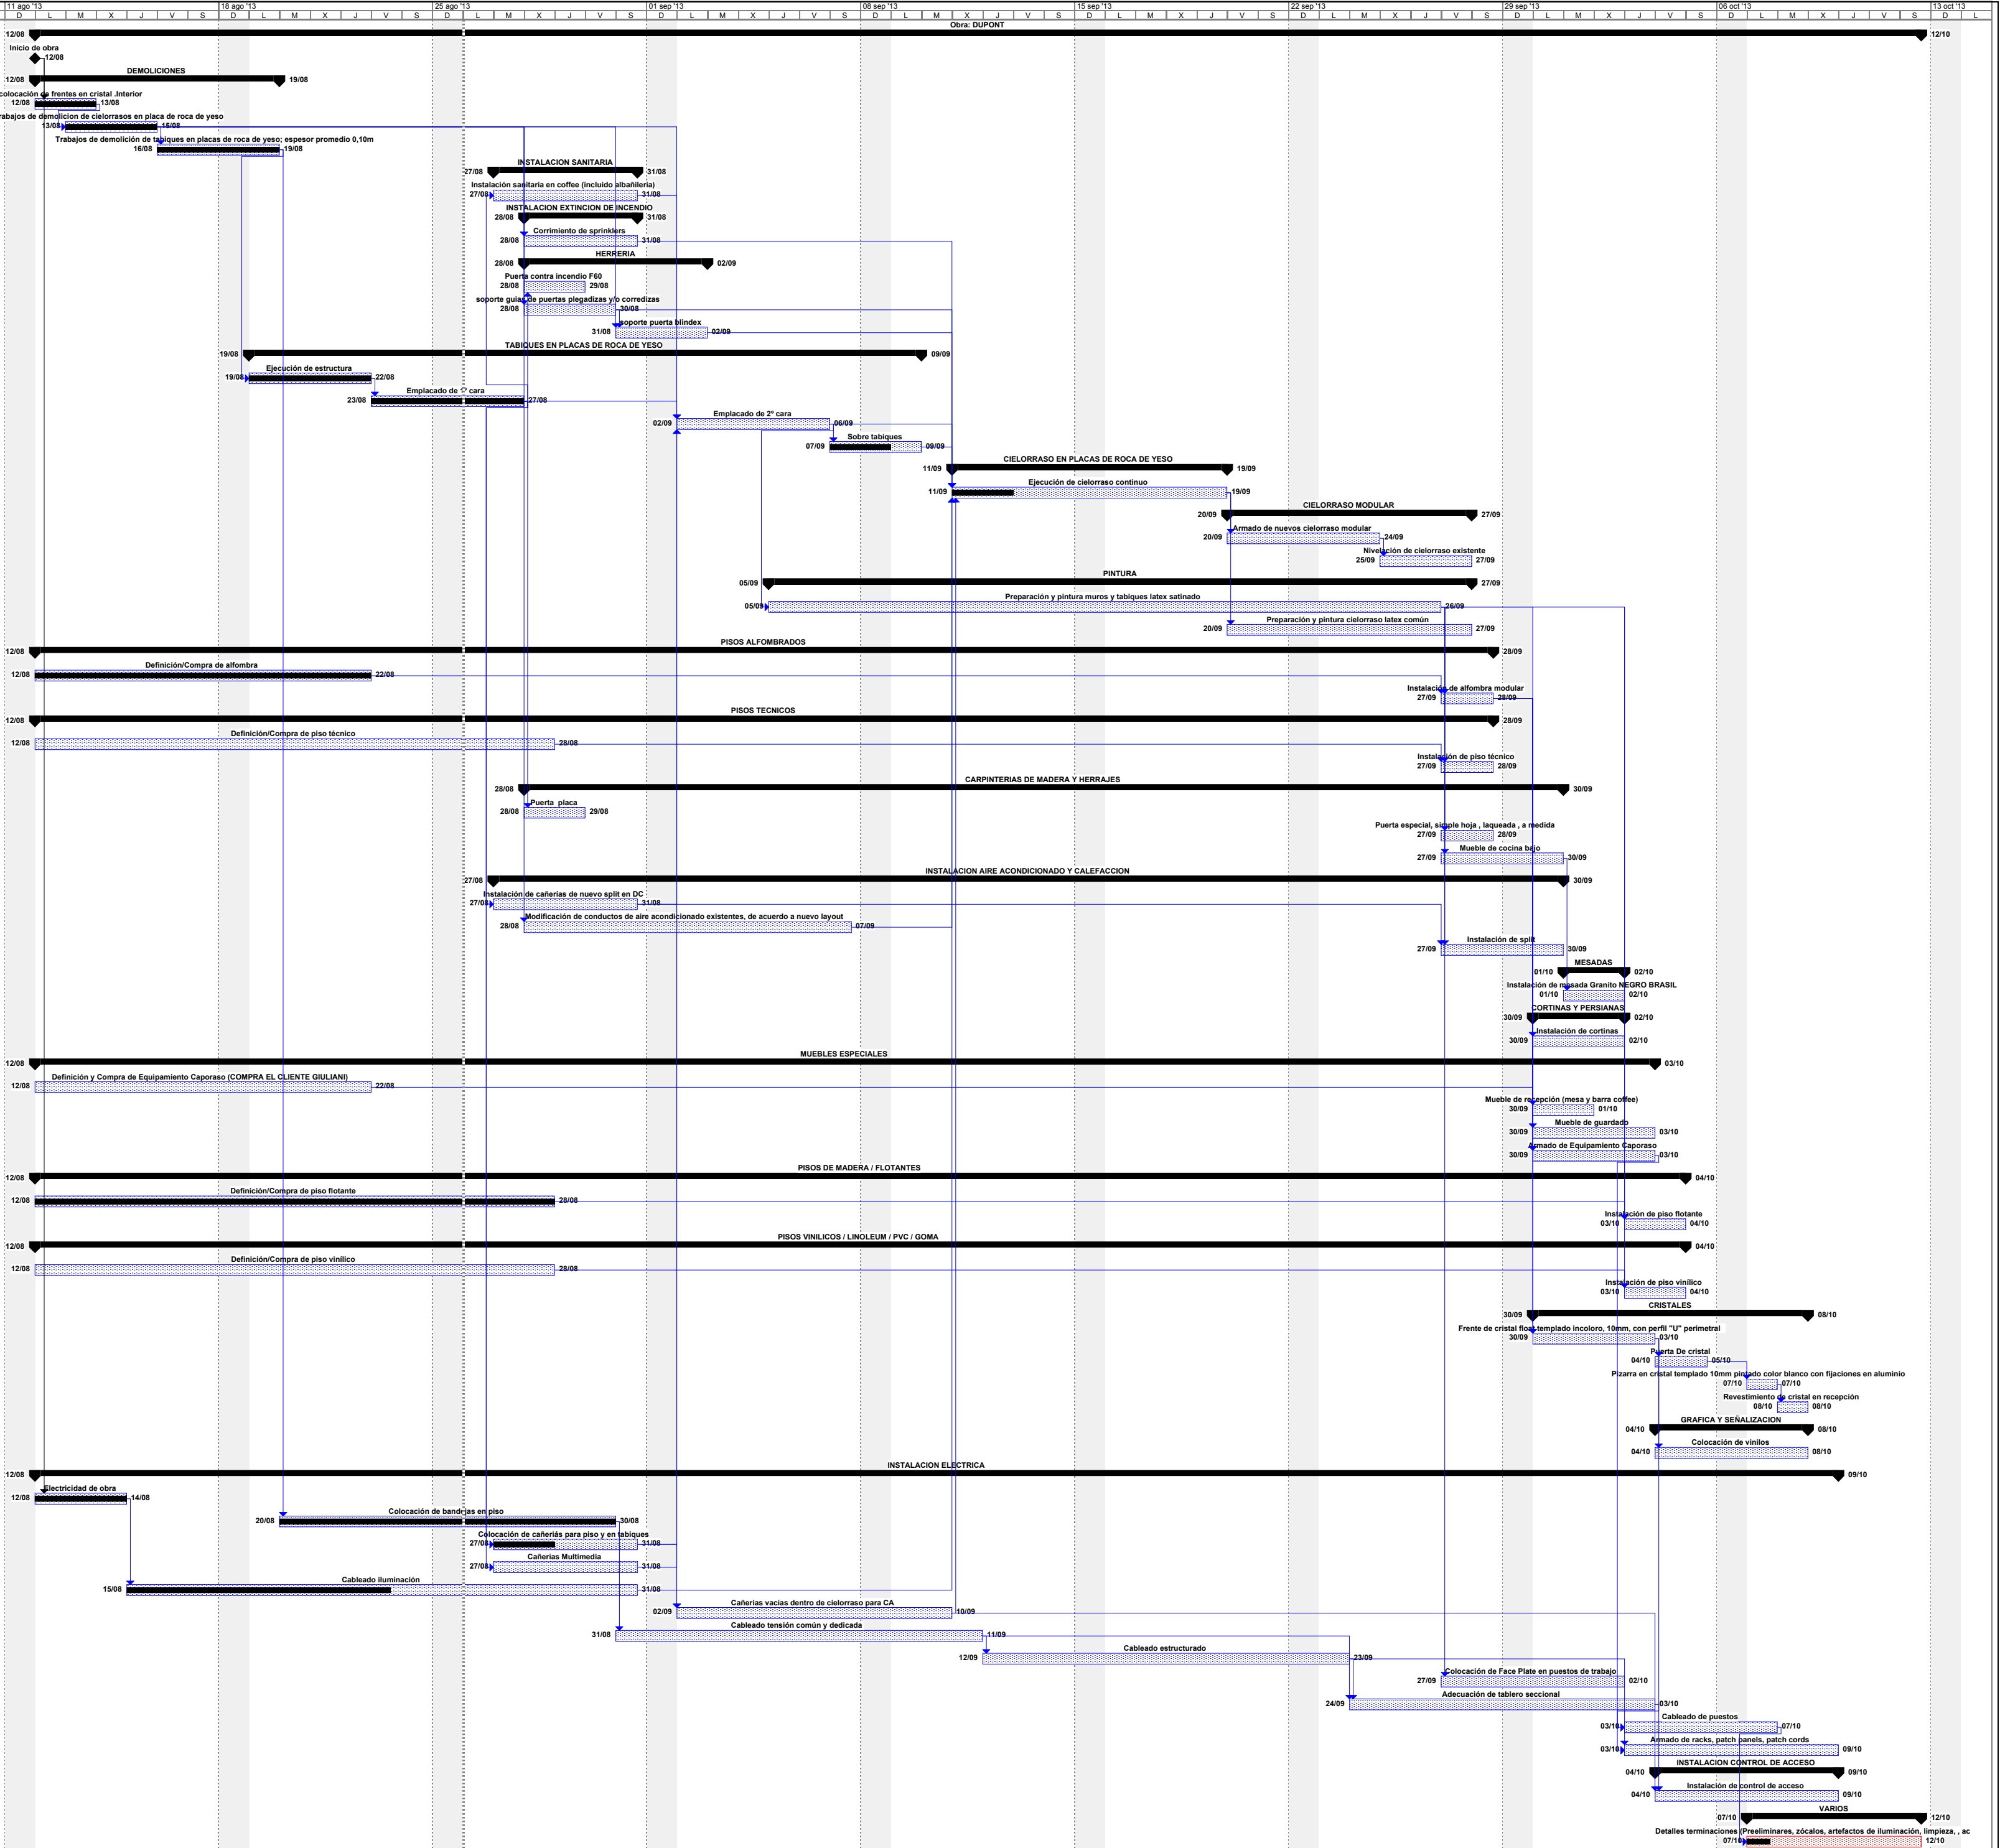
