


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	09 sep '13	16 sep '13	23 sep '13	30 sep '13	07 oct '13	14 oct '13	21 oct '13	28 oct '13
						D L M X J V S D	D L M X J V S D	D L M X J V S D	D L M X J V S D	D L M X J V S D	D L M X J V S D	D L M X J V S D	D L M X J V S D
1		Preliminares	2 días	lun 09/09/13	mié 11/09/13								
2		Replanteo	2 días	lun 09/09/13	mié 11/09/13								
3		Demolicion	6 días	mié 11/09/13	jue 19/09/13								
4		Demolicion de cielorrasos	2 días	jue 12/09/13	sáb 14/09/13								
5		Demolicion de tabiques placa roca de yeso	1,13 días	lun 16/09/13	mié 18/09/13								
6		Retiro de alfombra	2 días	lun 16/09/13	mié 18/09/13								
7		Demolicion de solado ceramico	1 día	vie 13/09/13	sáb 14/09/13								
8		Retiro de puertas	1 día	vie 13/09/13	sáb 14/09/13								
9		Demolicion de vano para colocacion de puerta	1 día	mié 18/09/13	jue 19/09/13								
10		retiro de conductos de aire acondicionado	2 días	lun 16/09/13	mié 18/09/13								
11		Limpieza de Etapa Demolicion	2 días	jue 19/09/13	sáb 21/09/13								
12		Albañileria	7 días	jue 19/09/13	sáb 28/09/13								
13		Reparacion de carpeta	2,13 días	vie 20/09/13	mié 25/09/13								
14		Apertura de Vano y rectificacion	2 días	mié 25/09/13	vie 27/09/13								
15		Contruccion en Seco	10 días	lun 30/09/13	sáb 12/10/13								
16		Tabique de placa roca de yeso 10cm	5 días	lun 30/09/13	sáb 05/10/13								
17		1/2 Tabique de placa roca de yeso 5cm	2 días	lun 30/09/13	mié 02/10/13								
18		Cielorraso de junta tomada	5 días	mar 01/10/13	mar 08/10/13								
19		ejecucion de Refuerzo de madera	2 días	lun 07/10/13	mié 09/10/13								
20		Colocacion de alfombra	2 días	lun 14/10/13	mié 16/10/13								
21		Colocacion de solado vinilico	2 días	lun 14/10/13	mié 16/10/13								
22		Colocacion de Zocalos	1 día	mar 15/10/13	mié 16/10/13								
23		Preparacion y pintado de cielorraso	2 días	mié 16/10/13	vie 18/10/13								
24		Preparacion y pintado de tabiques	2 días	mié 16/10/13	vie 18/10/13								
25		Pintura en cielorrasos	3 días	vie 18/10/13	mié 23/10/13								
26		Pintura en Tabiques	3 días	vie 18/10/13	mié 23/10/13								
27		Pintura en Zocalos	1 día	vie 18/10/13	sáb 19/10/13								
28		Provision y colocacion de vidrios	3 días	mié 23/10/13	sáb 26/10/13								
29		Instalacion electrica	6,13 días	mar 24/09/13	vie 18/10/13								
30		Traslado de Control de acceso	1 día	mié 25/09/13	jue 26/09/13								
31		Provision y Colocacion de Cortinas tipo Roller	2 días	lun 28/10/13	mié 30/10/13								
32		Provision de muebles espaciales	1 día	jue 17/10/13	vie 18/10/13								
33		Limpieza Periodica de Obra	4 días	mié 25/09/13	sáb 19/10/13								
34		Limpieza Final de Obra	2 días	lun 28/10/13	mié 30/10/13								



Proyecto: SANCOR-PTO SUR
Fecha: mié 09/10/13

Tarea
División
Progreso

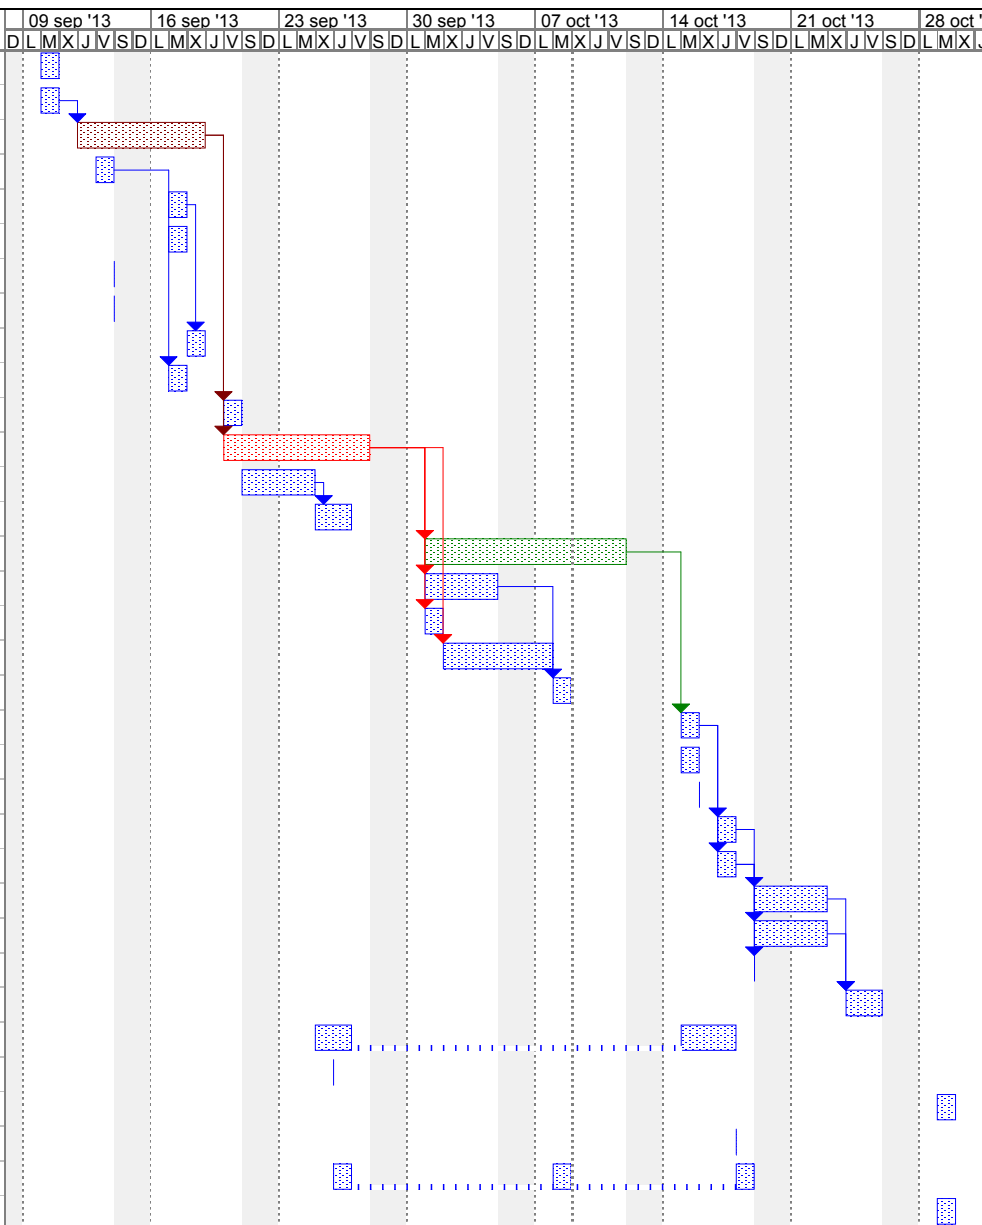

Hito
Resumen
Resumen del proyecto



Tareas externas
Hito externo
Fecha límite

