


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ene '09							12 ene '09							19 ene	
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	
0		Obra Emerson (considerando como inicio el 08-01-09)	55 días	jue 08-01-09	mar 03-03-09	NA															
1		Inicio de obra	0 días	jue 08-01-09	jue 08-01-09																
2		Trabajos preliminares	6 días	jue 08-01-09	mar 13-01-09	NA	 Trabajos preliminares														
3		Demoliciones	6 días	jue 08-01-09	mar 13-01-09	NA	 Demoliciones														
4		Demoliciones en cielos	4 días	jue 08-01-09	dom 11-01-09	08-01	 Demoliciones en cielos														
5		Demoliciones en tabiquerías	2 días	jue 08-01-09	vie 09-01-09	08-01	 Demoliciones en tabiquerías														
6		Retiro de ceramicos existentes en baños	2 días	jue 08-01-09	vie 09-01-09	08-01	 Retiro de ceramicos existentes en ba														
7		Retiro de tabiquerías de vidrio	3 días	jue 08-01-09	sáb 10-01-09	08-01	 Retiro de tabiquerías de vidrio														
8		retiro de alfombra existente	1 día	lun 12-01-09	lun 12-01-09		 retiro de alfombra existente														
9		Retiro de escombros provenientes de demoliciones	2 días	lun 12-01-09	mar 13-01-09		 Retiro de escombros pr														
10		Trazados	1 día	lun 12-01-09	lun 12-01-09		 Trazados														
11		Trabajos en volcometal	23 días	mar 13-01-09	mié 04-02-09	NA															
12		Estructura de tabiques	7 días	mar 13-01-09	lun 19-01-09		 13-01  E														
13		Estructura de Vigas	6 días	mar 20-01-09	dom 25-01-09		 20-01														
14		Emplacado de vigas	5 días	lun 26-01-09	vie 30-01-09		 20-01 														
15		Emplacado de primera cara	5 días	mar 20-01-09	sáb 24-01-09																
16		Emplacado segunda cara	5 días	sáb 31-01-09	mié 04-02-09																
17		Pintura	28 días	mié 14-01-09	mar 10-02-09	NA															
18		Empaste de muros existentes	9 días	mié 14-01-09	jue 22-01-09	14-01															
19		Empaste y huincha de Tabiquería Nueva	8 días	mar 03-02-09	mar 10-02-09																
20		Empaste de vigas	5 días	lun 26-01-09	vie 30-01-09																
21		Lijado y Aparejo	4 días	vie 23-01-09	lun 26-01-09																
22		Pintura de primera mano	6 días	mar 27-01-09	dom 01-02-09																
23		Pintura de segunda mano	6 días	lun 02-02-09	sáb 07-02-09																
24		Pintura de puertas	3 días	jue 05-02-09	sáb 07-02-09																
25		Electricidad y cableado estructurado	38 días	mié 14-01-09	vie 20-02-09	NA															
26		Canalizaciones de iluminación	3 días	mié 14-01-09	vie 16-01-09	14-01	 Canalizacion														
27		Canalizaciones por tabiques nuevos	6 días	dom 25-01-09	vie 30-01-09																

Proyecto: Obra Emerson (conside
Fecha: mar 06-01-09

Tarea



Tarea resumida



Tareas externas



Tarea crítica



Tarea crítica resumida



Resumen del proyecto



Progreso



Hito resumido



Agrupar por síntesis



Hito



Progreso resumido



Fecha límite




Resumen



División



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ene '09							12 ene '09							19 ene	
						M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D	L	M
28		Canalizaciones de fuerza	5 días	sáb 31-01-09	mié 04-02-09																
29		Canalizaciones de cableado estructurado	5 días	sáb 31-01-09	mié 04-02-09																
30		Cableado de iluminación	3 días	sáb 17-01-09	lun 19-01-09																
31		Cableado de fuerzas y cableado estructurado	5 días	jue 05-02-09	lun 09-02-09																
32		Instalación de luminarias	4 días	vie 06-02-09	lun 09-02-09																
33		Instalación de módulos	5 días	mar 10-02-09	sáb 14-02-09																
34		certificación de puntos de Voz y Datos	3 días	mié 18-02-09	vie 20-02-09																
35		trabajos en tablero	2 días	mar 10-02-09	mié 11-02-09																
36		Trabajos en Rack	3 días	dom 15-02-09	mar 17-02-09																
37		Clima	25 días	mié 14-01-09	sáb 07-02-09																
38		Canalizaciones	3 días	mié 14-01-09	vie 16-01-09																
39		Instalación de equipos Fan Coil nuevos	2 días	sáb 17-01-09	dom 18-01-09																
40		instalación de equipos Split	3 días	vie 23-01-09	dom 25-01-09																
41		instalación de ductos nuevos	2 días	sáb 31-01-09	dom 01-02-09																
42		instalación de termostatos nuevos	1 día	sáb 31-01-09	sáb 31-01-09																
43		Reinstalación de termostatos	2 días	sáb 31-01-09	dom 01-02-09																
44		instalación de bombas de condensado	1 día	lun 26-01-09	lun 26-01-09																
45		traslado de difusores	2 días	vie 06-02-09	sáb 07-02-09																
46		instalación de rejillas nuevas y existentes	2 días	vie 06-02-09	sáb 07-02-09																
47		Alcantarillado y Agua Potable	23 días	mié 14-01-09	jue 05-02-09																
48		desarme de lavaplatos existente	2 días	mié 14-01-09	jue 15-01-09																
49		Canalizaciones de agua potable nuevas	2 días	vie 16-01-09	sáb 17-01-09																
50		instalación de artefactos en nueva ubicación	2 días	mié 04-02-09	jue 05-02-09																
51		Detección de incendios	40 días	jue 08-01-09	lun 16-02-09																
52		Realización de ingeniería	6 días	jue 08-01-09	mar 13-01-09																
53		Canalizaciones	4 días	mié 14-01-09	sáb 17-01-09																
54		Cableado	2 días	dom 18-01-09	lun 19-01-09																
55		instalación de detectores nuevos	3 días	vie 13-02-09	dom 15-02-09																

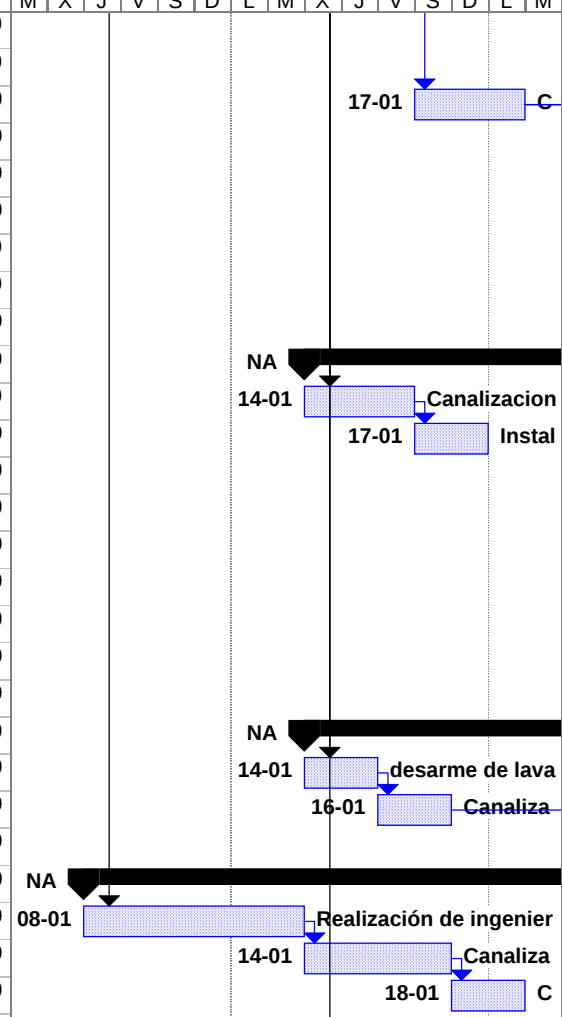

Proyecto: Obra Emerson (conside

Fecha: mar 06-01-09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas


Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ene '09							12 ene '09							19 ene	
						M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D	L	M
56		Conexión con edificio	1 día	lun 16-02-09	lun 16-02-09																
57		Cielo americano	13 días	sáb 31-01-09	jue 12-02-09																
58		instalación de estructura	6 días	sáb 31-01-09	jue 05-02-09																
59		instalación de palmetas	4 días	lun 09-02-09	jue 12-02-09																
60		Pavimentos	21 días	lun 02-02-09	dom 22-02-09																
61		instalación de piso elevado	2 días	lun 02-02-09	mar 03-02-09																
62		instalación de piso vinílico	2 días	lun 02-02-09	mar 03-02-09																
63		Retape de piso vinílicos	1 día	mié 04-02-09	mié 04-02-09																
64		instalación de alfombra	5 días	mié 18-02-09	dom 22-02-09																
65		Guardapolvo	2 días	lun 23-02-09	mar 24-02-09																
66		Instalación de guarda polvo	2 días	lun 23-02-09	mar 24-02-09																
67		Revestimientos	3 días	vie 30-01-09	lun 02-02-09																
68		instalación de cerámica en cafetería	3 días	vie 30-01-09	lun 02-02-09																
69		Tabaquería de Vidrio Aluminio	5 días	mar 10-02-09	dom 15-02-09																
70		Toma de medidas	0 días	mar 10-02-09	mar 10-02-09																
71		instalación de estructura	1 día	dom 15-02-09	dom 15-02-09																
72		instalación de Vidrios	1 día	dom 15-02-09	dom 15-02-09																
73		Puertas	7 días	mié 11-02-09	mar 17-02-09																
74		Reinstalación de puertas existentes	4 días	mié 11-02-09	sáb 14-02-09																
75		Instalación de puertas nuevas	3 días	dom 15-02-09	mar 17-02-09																
76		Control de acceso	2 días	mié 18-02-09	jue 19-02-09																
77		Canalización y Cableado	1 día	mié 18-02-09	mié 18-02-09																
78		instalación y puesta en marcha	1 día	jue 19-02-09	jue 19-02-09																
79		cctv	1 día	mié 18-02-09	mié 18-02-09																
80		Reubicación de cctv	1 día	mié 18-02-09	mié 18-02-09																
81		Cortinas	30 días	mié 14-01-09	jue 12-02-09																
82		Retiro para mantención	1 día	mié 14-01-09	mié 14-01-09																
83		reinstalación de cortinas	2 días	mié 11-02-09	jue 12-02-09																

NA
14-01  Retiro para manten

Proyecto: Obra Emerson (conside Fecha: mar 06-01-09)	Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
	Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
	Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
	Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
	Resumen		División			

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ene '09							12 ene '09							19 ene	
						M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D	L	M
84		Logo corporativo	1 día	mié 11-02-09	mié 11-02-09																
85		Instalación de Logo	1 día	mié 11-02-09	mié 11-02-09																
86		Mobiliario especial	17 días	mié 04-02-09	sáb 21-02-09																
87		toma de medidas	0 días	mié 04-02-09	mié 04-02-09																
88		instslación de muebles especiales	4 días	mié 18-02-09	sáb 21-02-09																
89		Mobiliario de linea	19 días	mar 10-02-09	dom 01-03-09																
90		toma de medidas	0 días	mar 10-02-09	mar 10-02-09																
91		instslación de muebles	3 días	jue 26-02-09	sáb 28-02-09																
92		llegada de sillas	1 día	dom 01-03-09	dom 01-03-09																
93		Limpeza de obra Final	2 días	lun 02-03-09	mar 03-03-09																
94		Limpieza de obra	2 días	lun 02-03-09	mar 03-03-09																
95		Entrega provisoria	0 días	mar 03-03-09	mar 03-03-09																

Proyecto: Obra Emerson (conside
Fecha: mar 06-01-09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen











Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División












Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis


Fecha límite









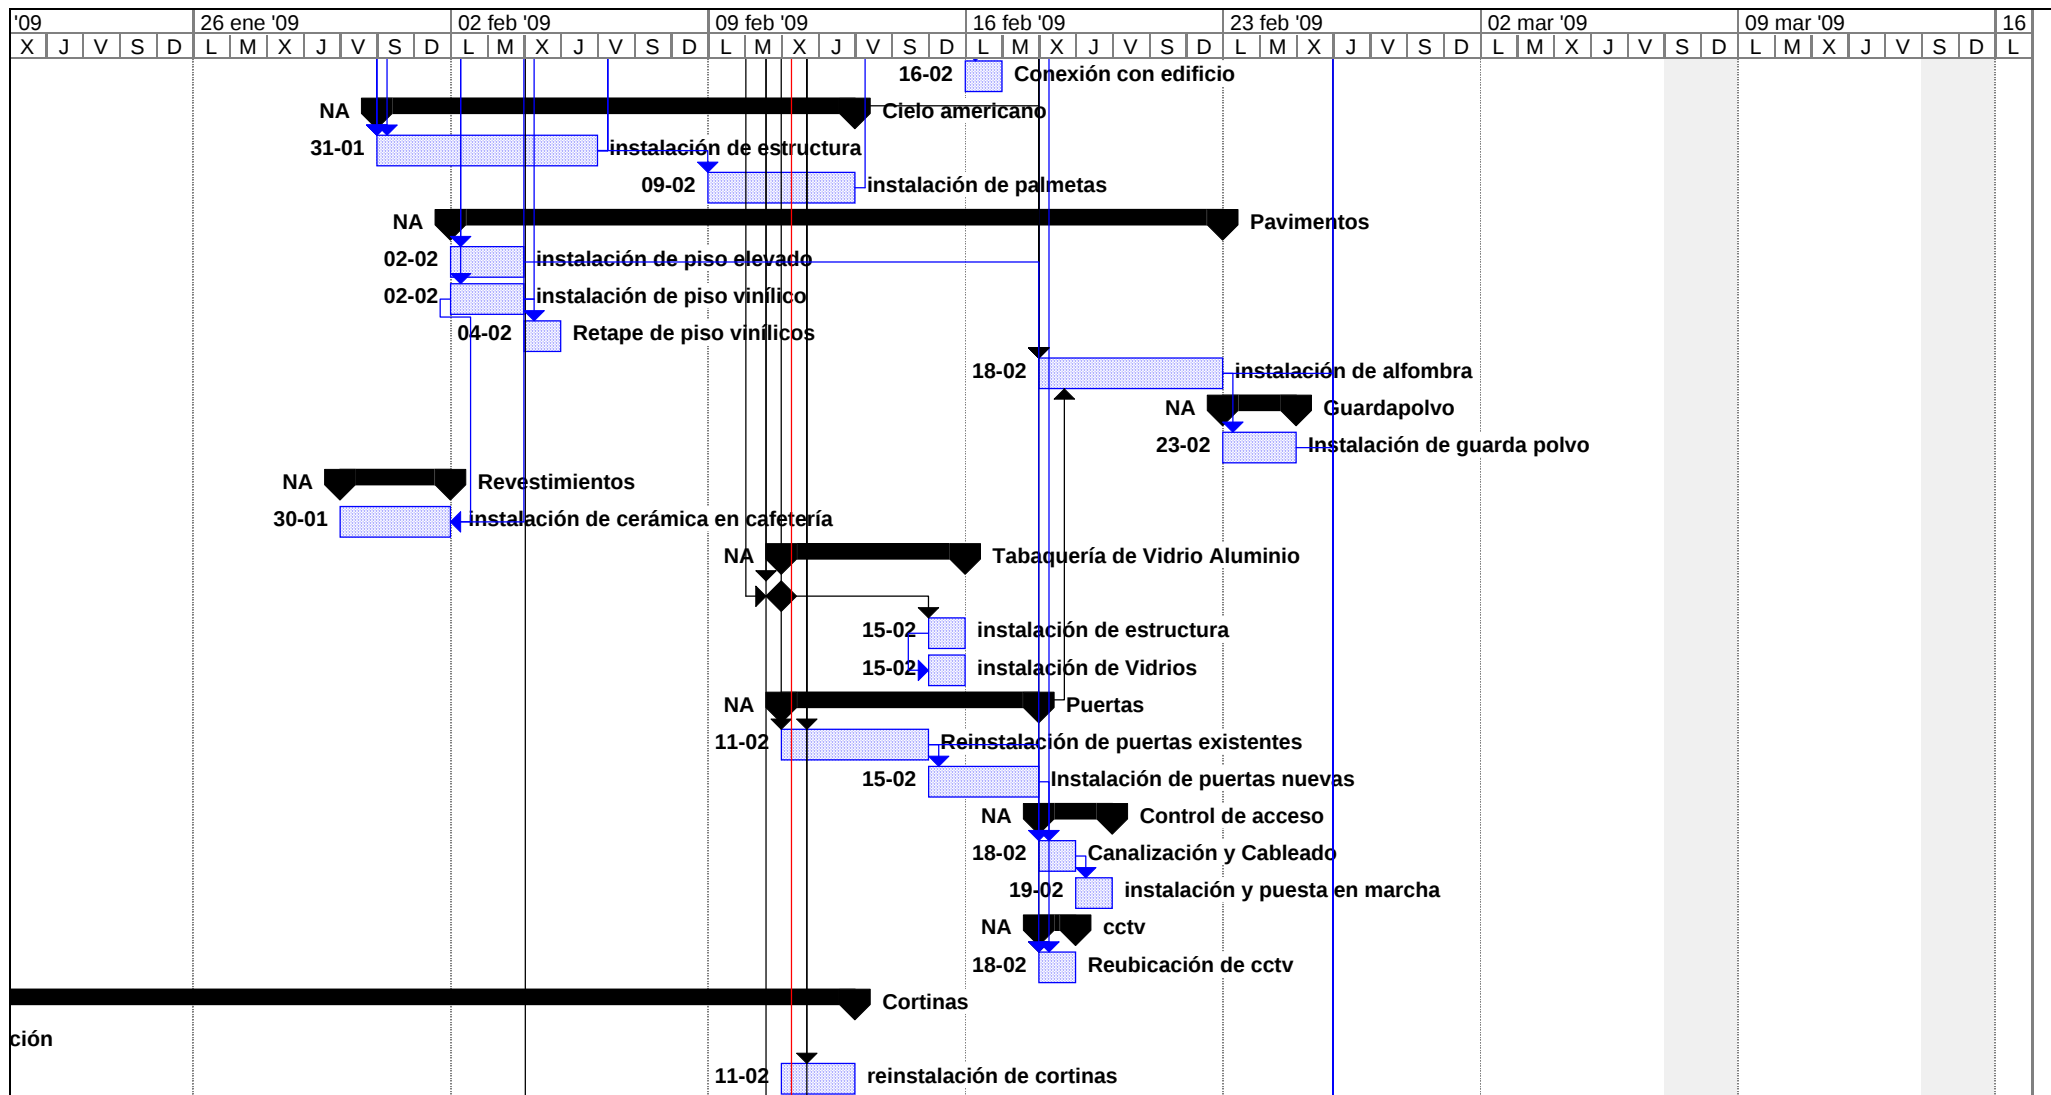

Proyecto: Obra Emerson (conside
Fecha: mar 06-01-09

Tarea



Tarea resumida



Tareas externas



Tarea crítica



Tarea crítica resumida



Resumen del proyecto



Progreso



Hito resumido



Agrupar por síntesis



Hito



Progreso resumido



Fecha límite



Resumen



División



