




Id		MoNombre de tarea de tare	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado																								
								may '17	22 may '17	29 may '17	05 jun '17	12 jun '17	19 jun '17	26 jun '17	03 jul '17	10 jul '17	17 jul '17	24 jul '17	31 jul '17	07 ago '17	14 ago '17	21 ago '17	28 ago '17	04 sep '17	11 sep '17	18 sep '17	25 sep '17				
								M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V S D
104		Obra baños 2º	43,6 días	mié 02/08/17	jue 21/09/17		49%																								
105	✓	Desmonte de artefactos	2 días	mié 02/08/17	jue 03/08/17	102,66	100%																								
106	✓	Demolicion de ceramicos pisos y revestimientos	7 días	vie 04/08/17	vie 11/08/17	105,67	100%																								
107	✓	Instalación sanitaria (modificacion según anexo)	4 días	sáb 12/08/17	mié 16/08/17	68,106	100%																								
108		Albañilería (revoques)	8 días	mié 23/08/17	vie 01/09/17	107,69	90%																								
109		Carpetas bajo solados	3 días	vie 01/09/17	mar 05/09/17	108	70%																								
110		Colocaciones de Revestimientos cerámicos	7 días	vie 01/09/17	sáb 09/09/17	108	0%																								
111		Colocaciones de pisos cerámicos	5 días	sáb 09/09/17	vie 15/09/17	110,109	0%																								
112		Instalación eléctrica	4 días	vie 01/09/17	mié 06/09/17	108	50%																								
113		Medición mesadas	0 días	lun 28/08/17	lun 28/08/17	74	0%																								
114		Colocacion mesadas	3 días	mié 06/09/17	sáb 09/09/17	110CC+4 días	0%																								
115		Instalación sanitaria (colocación de artefactos)	2 días	vie 15/09/17	lun 18/09/17	111,114	0%																								
116		Pintura sobre muros, cielorrasos y carpinterías existentes	5 días	vie 15/09/17	jue 21/09/17	111	0%																								
117		Obra oficina 2º	41 días	mié 02/08/17	lun 18/09/17		33%																								
118	✓	Demolición de mobiliario 2º	4 días	mié 02/08/17	sáb 05/08/17	102	100%																								
119	✓	Desmonte instalación eléctrica bajo piso	10 días	jue 03/08/17	lun 14/08/17	103	100%																								
120	✓	Desmonte de frentes vidriados	2 días	lun 07/08/17	mar 08/08/17	118	100%																								
121	✓	Demolición de tabiques de yeso 2º	3 días	mié 09/08/17	vie 11/08/17	120	100%																								
122	✓	Armado estructura Tabiques de roca de yeso	5 días	lun 14/08/17	vie 18/08/17	121FC+1 día	100%																								
123	✓	Canalizaciones en tabiques	3 días	jue 17/08/17	sáb 19/08/17	122FC-2 días	100%																								
124		Emplacado y masillado tabiques	5 días	lun 21/08/17	vie 25/08/17	123,122	95%																								
125		Frentes vidriados de oficina + paños fijos	5 días	sáb 26/08/17	jue 31/08/17	124	0%																								
126		Pintura sobre muros, cielorrasos y carpjnterías existentes	20 días	lun 21/08/17	mar 12/09/17	124CC	0%																								
127		Instalación eléctrica (bajo piso tecnico)	5 días	mar 15/08/17	sáb 19/08/17	119,80	90%																								
128		Cableado estructurado	5 días	mié 16/08/17	lun 21/08/17	127FC-4 días	0%																								
129		Cierre piso tecnico y nivelacion	2 días	mar 22/08/17	mié 23/08/17	127,128	0%																								
130		Readecuacion instalacion detecccion de incendio	5 días	sáb 26/08/17	jue 31/08/17	124	0%																								
131		Alfombra	4 días	lun 28/08/17	jue 31/08/17	129FC+3 días	0%																								
132		Entrega de mobiliario de LINEA	0 días	mié 30/08/17	mié 30/08/17	131FC-2 días	0%																								
133		Armado de equipamiento operativo	6 días	jue 31/08/17	mié 06/09/17	132FC+1 día	0%																								
134		Equipamiento / cableado	8 días	jue 07/09/17	vie 15/09/17	133	0%																								
135		Certificacion de puestos	2 días	sáb 16/09/17	lun 18/09/17	134	0%																								
136		Grafica	5 días	jue 07/09/17	mar 12/09/17	125FC+5 días	0%																								
137		Limpieza final	7 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	134FC-6 días,126FC-7 días	0%																								
138		Terminaciones y ajustes	5 días	mié 13/09/17	lun 18/09/17	134FC-3 días	0%																								
139		Entrega provisoria piso 2º	0 días	lun 18/09/17	lun 18/09/17	138	0%																								
140		Entrega Provisoria ETAPA 2 (16 septiembre)	0 días	lun 18/09/17	lun 18/09/17	100,139	0%																								

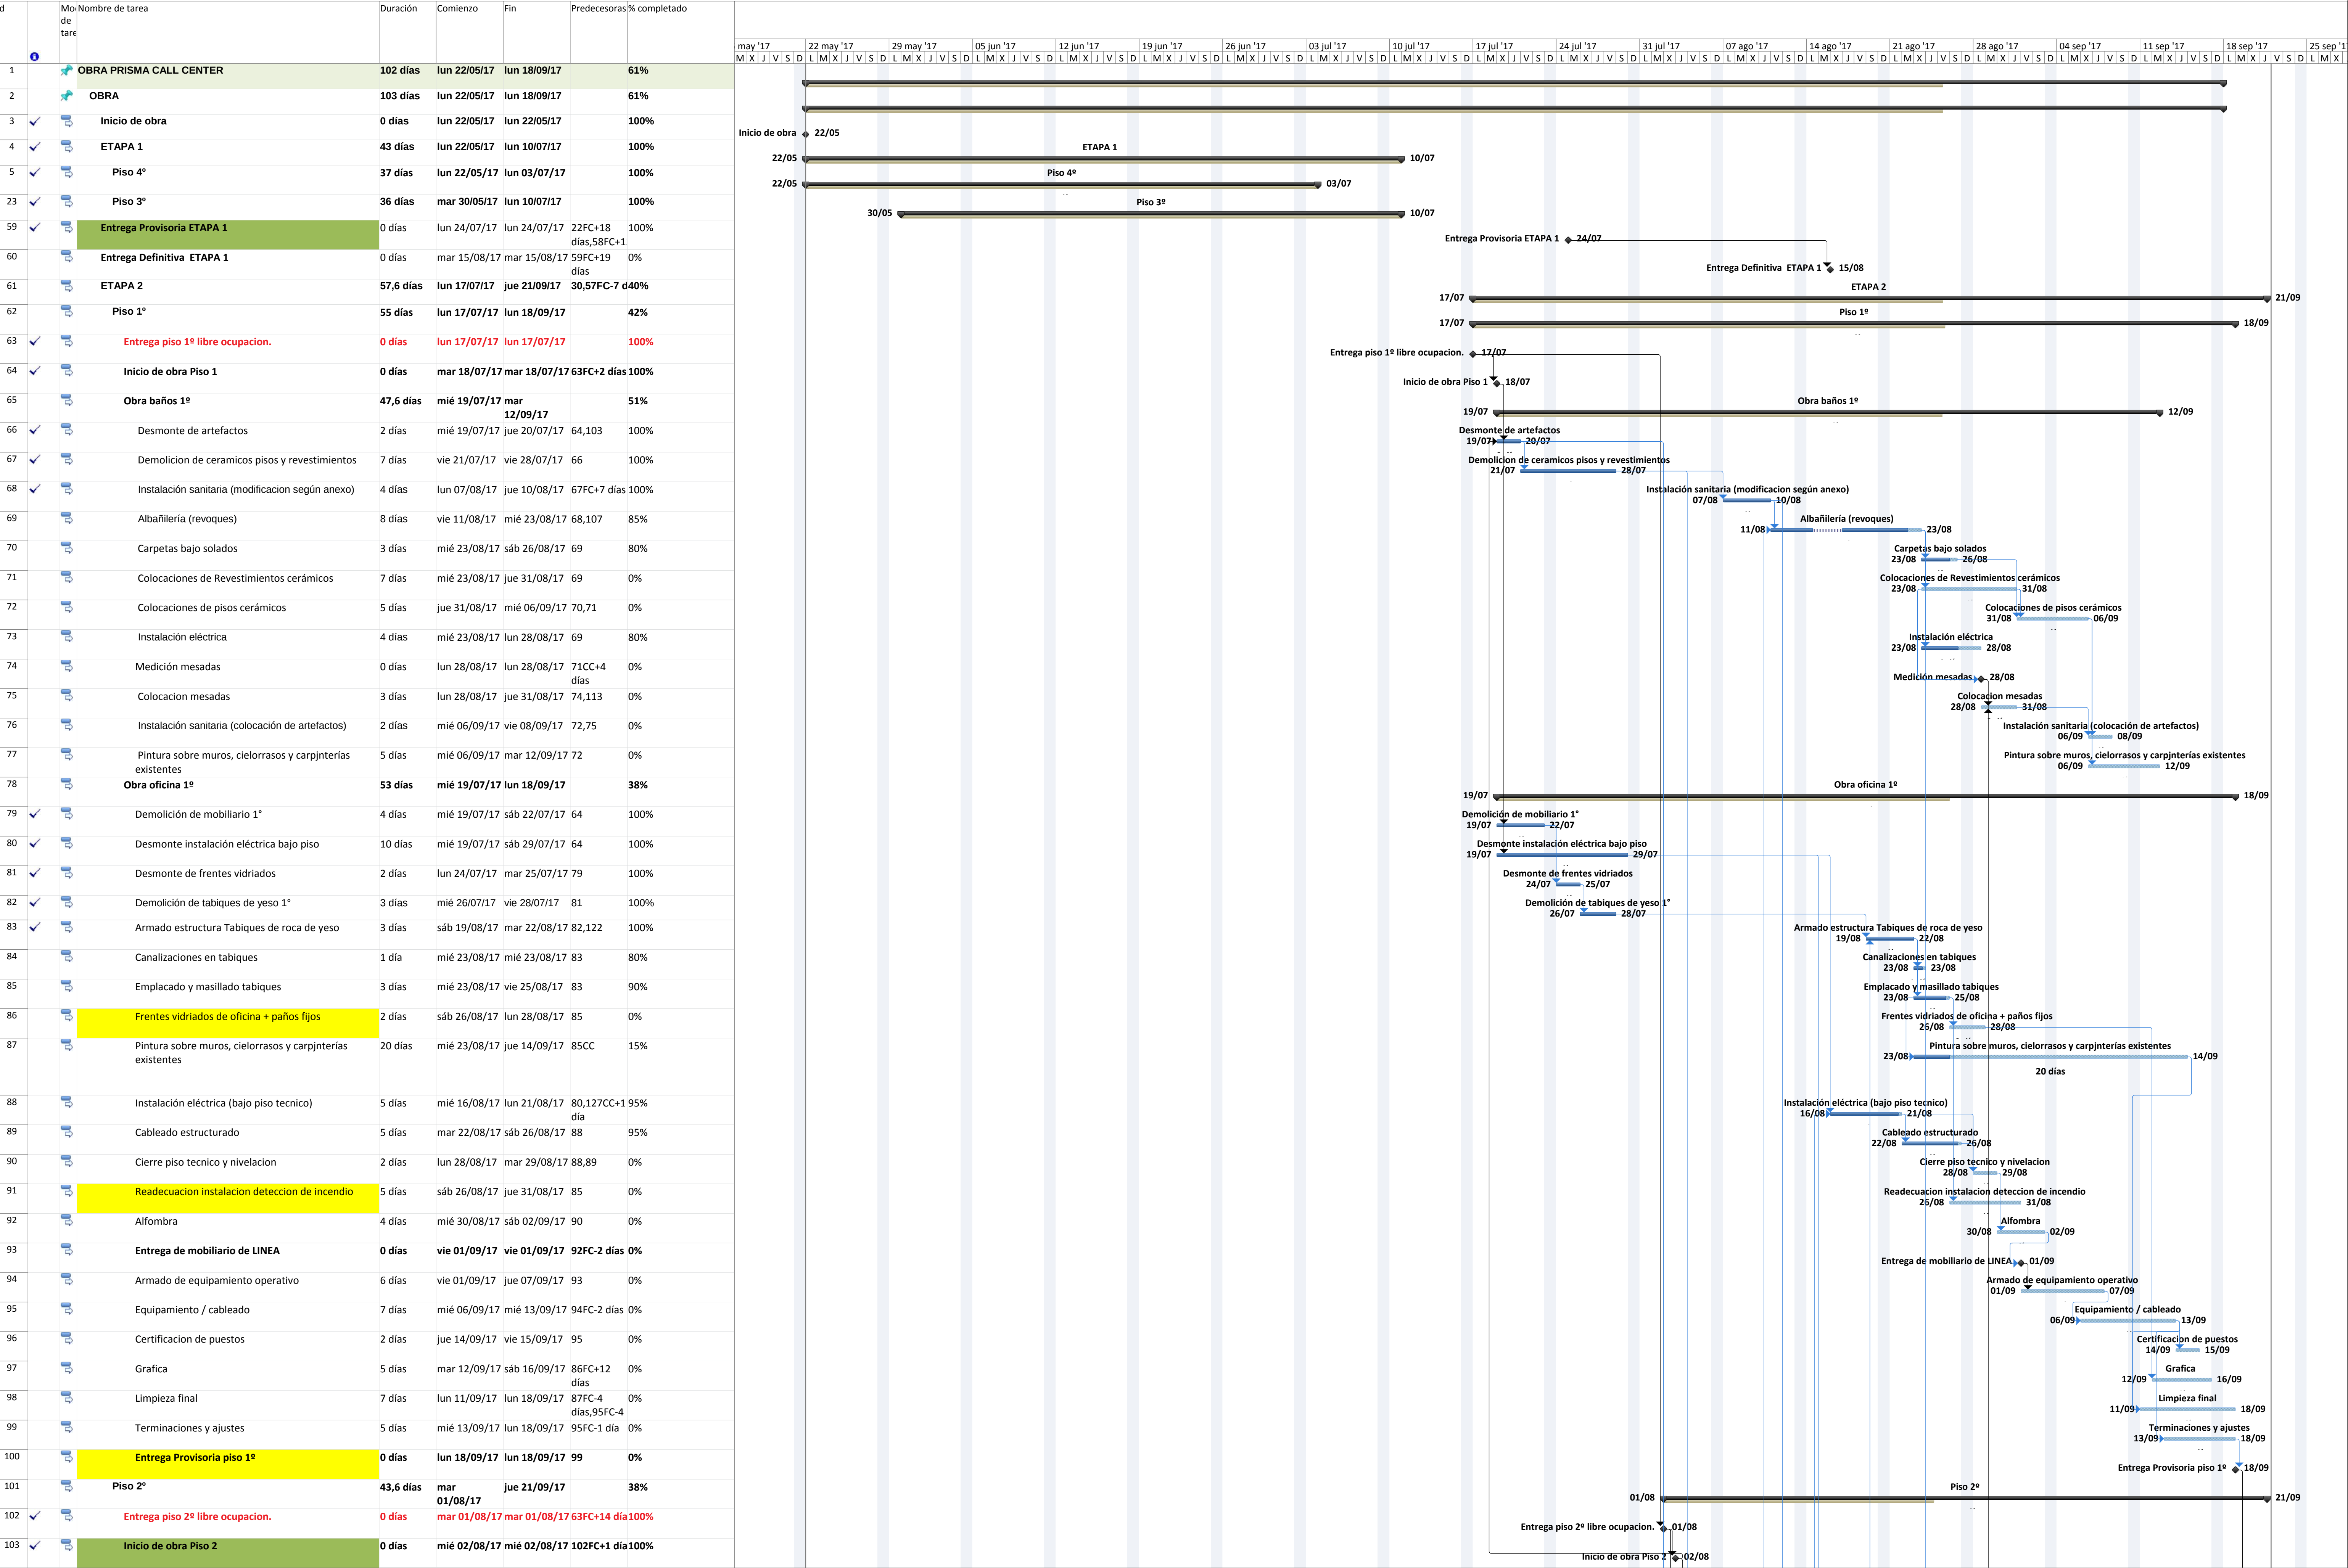
