


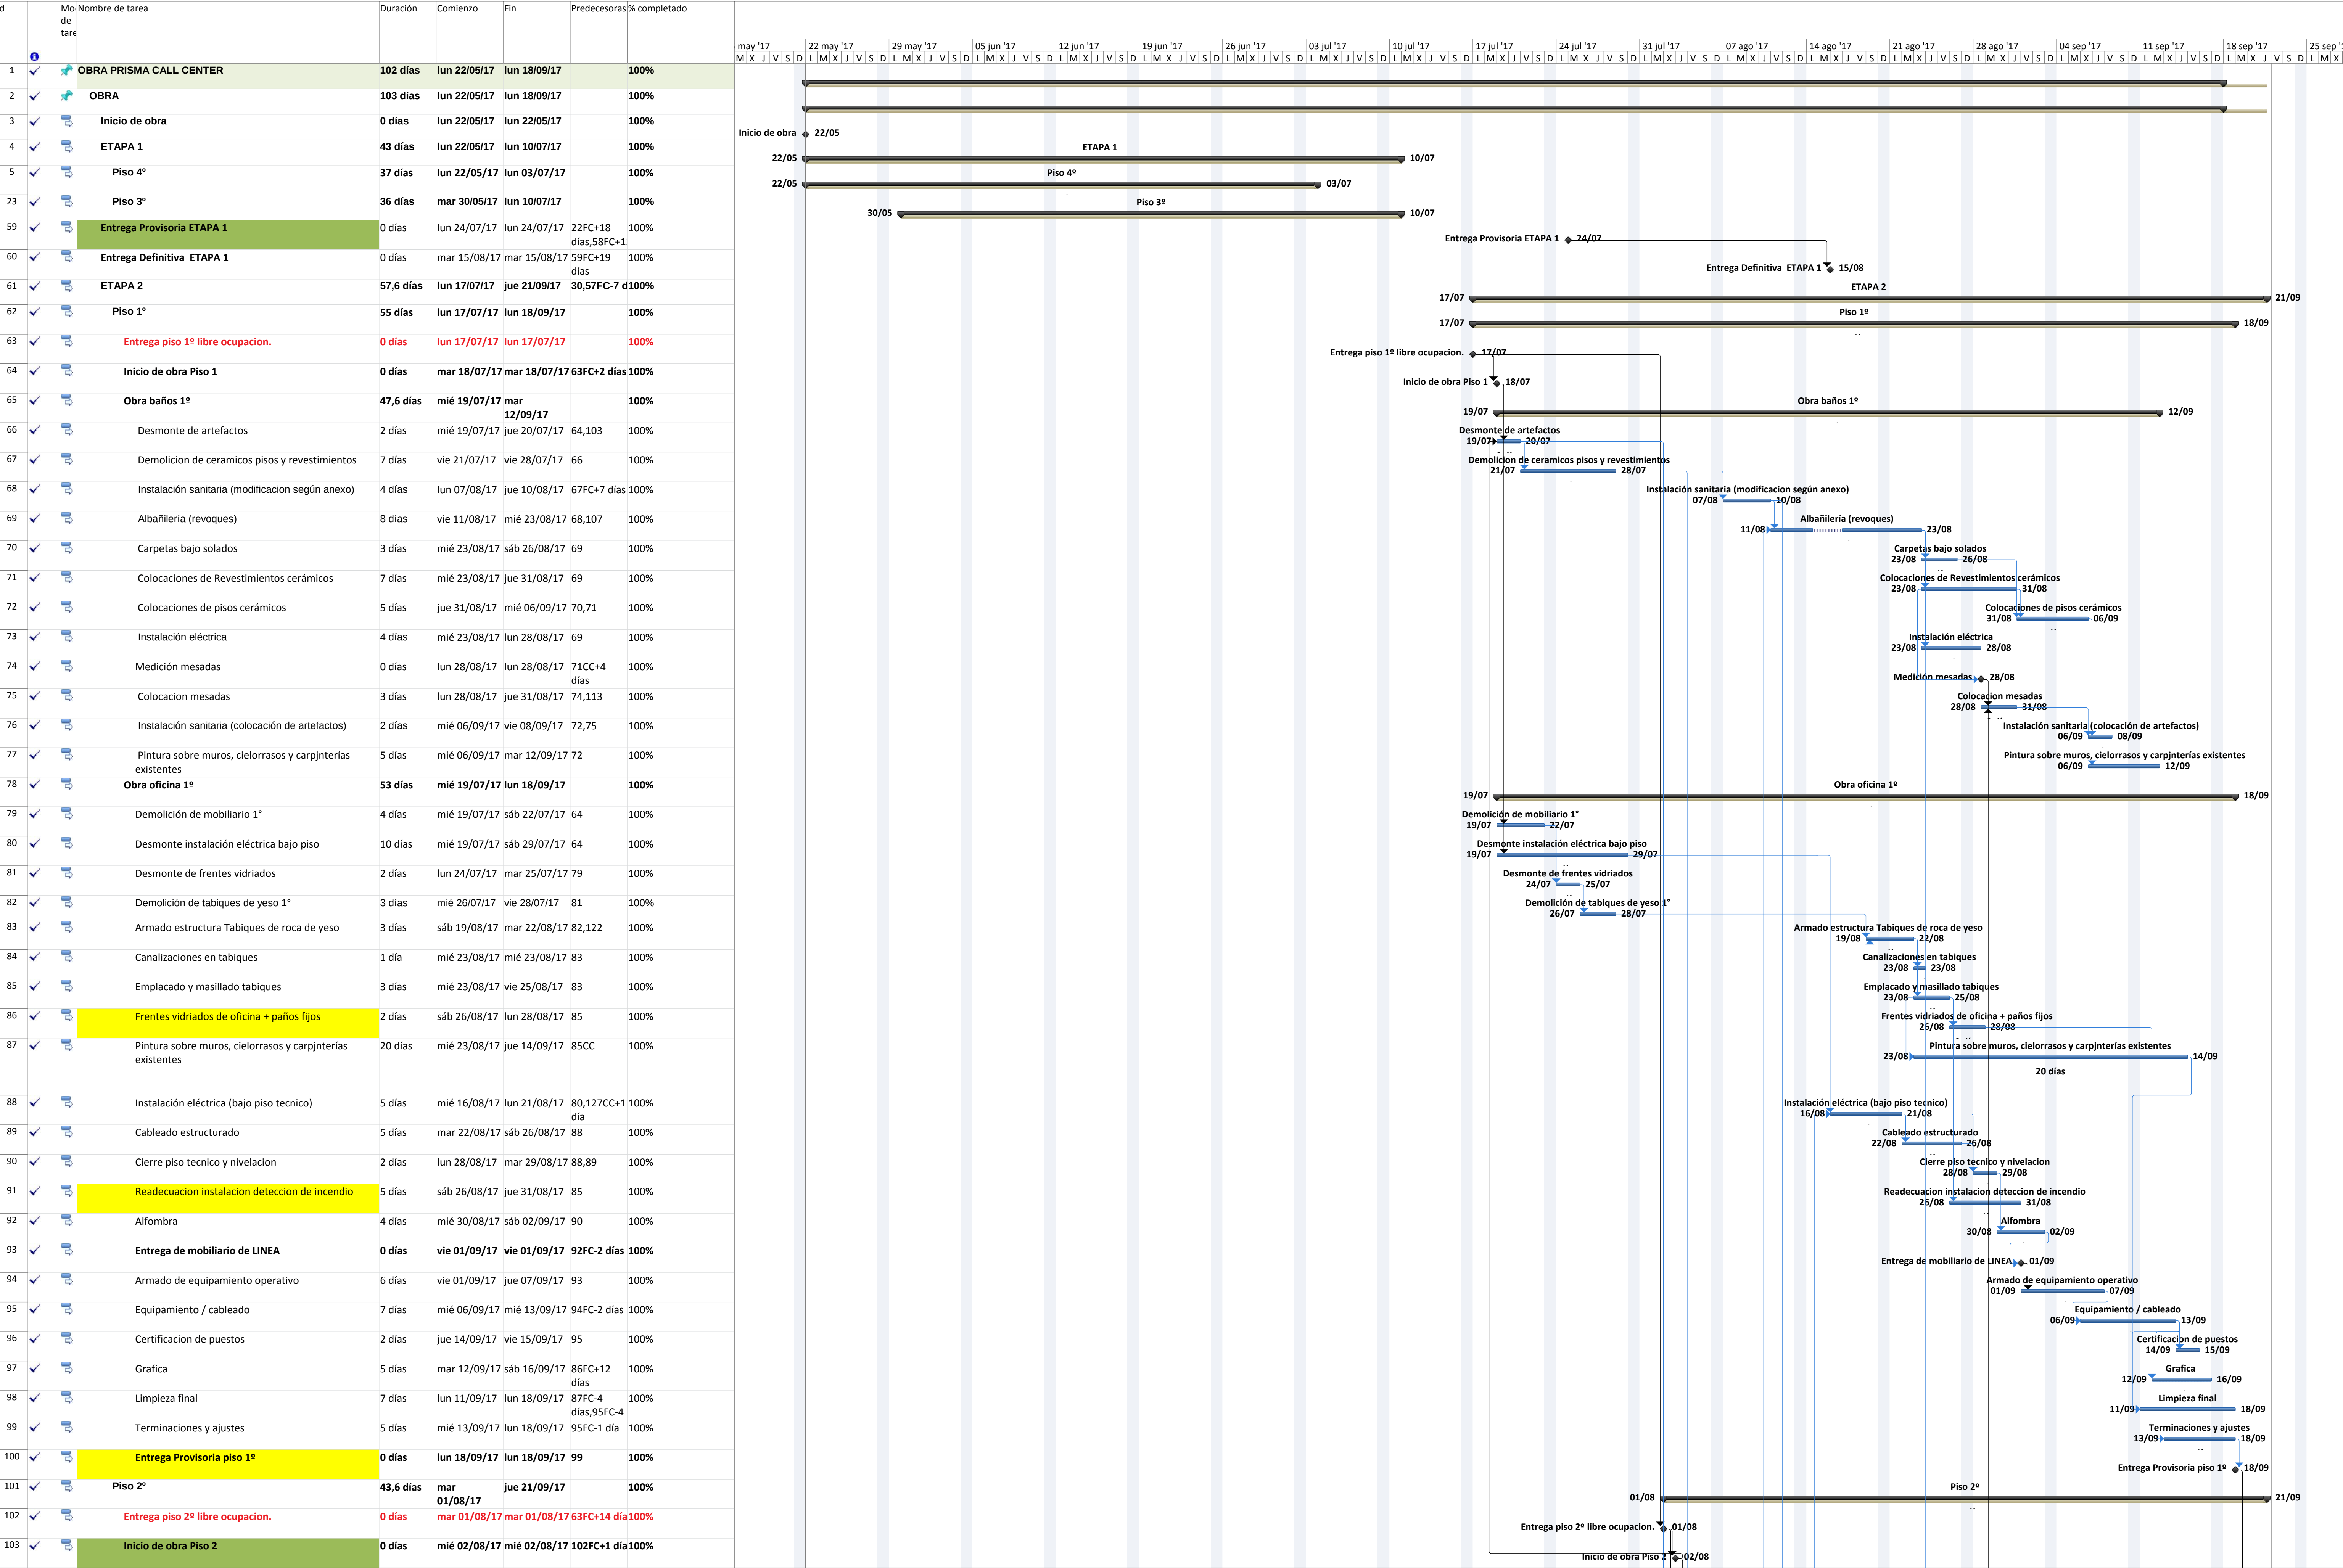

Id	Mo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado																											
								may '17	22 may '17	29 may '17	05 jun '17	12 jun '17	19 jun '17	26 jun '17	03 jul '17	10 jul '17	17 jul '17	24 jul '17	31 jul '17	07 ago '17	14 ago '17	21 ago '17	28 ago '17	04 sep '17	11 sep '17	18 sep '17	25 sep '17							
104	✓	Obra baños 2º	43,6 días	mié 02/08/17	jue 21/09/17		100%	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
105	✓	Desmonte de artefactos	2 días	mié 02/08/17	jue 03/08/17	102,66	100%																											
106	✓	Demolicion de ceramicos pisos y revestimientos	7 días	vie 04/08/17	vie 11/08/17	105,67	100%																											
107	✓	Instalación sanitaria (modificacion según anexo)	4 días	sáb 12/08/17	mié 16/08/17	68,106	100%																											
108	✓	Albañilería (revoques)	8 días	mié 23/08/17	vie 01/09/17	107,69	100%																											
109	✓	Carpetas bajo solados	3 días	vie 01/09/17	mar 05/09/17	108	100%																											
110	✓	Colocaciones de Revestimientos cerámicos	7 días	vie 01/09/17	sáb 09/09/17	108	100%																											
111	✓	Colocaciones de pisos cerámicos	5 días	sáb 09/09/17	vie 15/09/17	110,109	100%																											
112	✓	Instalación eléctrica	4 días	vie 01/09/17	mié 06/09/17	108	100%																											
113	✓	Medición mesadas	0 días	lun 28/08/17	lun 28/08/17	74	100%																											
114	✓	Colocacion mesadas	3 días	mié 06/09/17	sáb 09/09/17	110CC+4 días	100%																											
115	✓	Instalación sanitaria (colocación de artefactos)	2 días	vie 15/09/17	lun 18/09/17	111,114	100%																											
116	✓	Pintura sobre muros, cielorrasos y carpjnterías existentes	5 días	vie 15/09/17	jue 21/09/17	111	100%																											
117	✓	Obra oficina 2º	41 días	mié 02/08/17	lun 18/09/17		100%																											
118	✓	Demolición de mobiliario 2º	4 días	mié 02/08/17	sáb 05/08/17	102	100%																											
119	✓	Desmonte instalación eléctrica bajo piso	10 días	jue 03/08/17	lun 14/08/17	103	100%																											
120	✓	Desmonte de frentes vidriados	2 días	lun 07/08/17	mar 08/08/17	118	100%																											
121	✓	Demolición de tabiques de yeso 2º	3 días	mié 09/08/17	vie 11/08/17	120	100%																											
122	✓	Armado estructura Tabiques de roca de yeso	5 días	lun 14/08/17	vie 18/08/17	121FC+1 día	100%																											
123	✓	Canalizaciones en tabiques	3 días	jue 17/08/17	sáb 19/08/17	122FC-2 días	100%																											
124	✓	Emplacado y masillado tabiques	5 días	lun 21/08/17	vie 25/08/17	123,122	100%																											
125	✓	Frentes vidriados de oficina + paños fijos	5 días	sáb 26/08/17	jue 31/08/17	124	100%																											
126	✓	Pintura sobre muros, cielorrasos y carpjnterías existentes	20 días	lun 21/08/17	mar 12/09/17	124CC	100%																											
127	✓	Instalación eléctrica (bajo piso tecnico)	5 días	mar 15/08/17	sáb 19/08/17	119,80	100%																											
128	✓	Cableado estructurado	5 días	mié 16/08/17	lun 21/08/17	127FC-4 días	100%																											
129	✓	Cierre piso tecnico y nivelacion	2 días	mar 22/08/17	mié 23/08/17	127,128	100%																											
130	✓	Readecuacion instalacion detecccion de incendio	5 días	sáb 26/08/17	jue 31/08/17	124	100%																											
131	✓	Alfombra	4 días	lun 28/08/17	jue 31/08/17	129FC+3 días	100%																											
132	✓	Entrega de mobiliario de LINEA	0 días	mié 30/08/17	mié 30/08/17	131FC-2 días	100%																											
133	✓	Armado de equipamiento operativo	6 días	jue 31/08/17	mié 06/09/17	132FC+1 día	100%																											
134	✓	Equipamiento / cableado	8 días	jue 07/09/17	vie 15/09/17	133	100%																											
135	✓	Certificacion de puestos	2 días	sáb 16/09/17	lun 18/09/17	134	100%																											
136	✓	Grafica	5 días	jue 07/09/17	mar 12/09/17	125FC+5 días	100%																											
137	✓	Limpieza final	7 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	134FC-6 días,126FC-7 días	100%																											
138	✓	Terminaciones y ajustes	5 días	mié 13/09/17	lun 18/09/17	134FC-3 días	100%																											
139	✓	Entrega provisoria piso 2º	0 días	lun 18/09/17	lun 18/09/17	138	100%																											
140	✓	Entrega Provisoria ETAPA 2 (16 septiembre)	0 días	lun 18/09/17	lun 18/09/17	100,139	100%																											

Obra baños 2º

21/09

02/08

Desmonte de artefactos 02/08 03/08

Demolicion de ceramicos pisos y revestimientos 04/08 11/08

Instalación sanitaria (modificacion según anexo) 12/08 16/08

Albañilería (revoques) 23/08 01/09

Carpetas bajo solados 01/09 05/09

Colocaciones de Revestimientos cerámicos 01/09 09/09

Colocaciones de pisos cerámicos 09/09 15/09

Instalación eléctrica 01/09 06/09

Medición mesadas 28/08

Colocacion mesadas 06/09 09/09

Instalación sanitaria (colocación de artefactos) 15/09 18/09

Pintura sobre muros, cielorrasos y carpjnterías existentes 15/09 21/09

Obra oficina 2º

18/09

Demolicion de mobiliario 2º 02/08 05/08

Desmonte instalación eléctrica bajo piso 03/08 14/08

Desmonte de frentes vidriados 07/08 08/08

Demolicion de tabiques de yeso 2º 09/08 11/08

Armado estructura Tabiques de roca de yeso 14/08 18/08

Canalizaciones en tabiques 17/08 19/08

Emplacado y masillado tabiques 21/08 25/08

Frentes vidriados de oficina + paños fijos 26/08 31/08

Pintura sobre muros, cielorrasos y carpjnterías existentes 21/08 12/09

20 días

Instalación eléctrica (bajo piso tecnico) 15/08 19/08

Cableado estructurado 16/08 21/08

Cierre piso tecnico y nivelacion 22/08 23/08

Readecuacion instalacion detecccion de incendio 26/08 31/08

Alfombra 28/08 31/08

Entrega de mobiliario de LINEA 30/08

Armado de equipamiento operativo 31/08 06/09

Equipamiento / cableado 07/09 15/09

Certificación de puestos 16/09 18/09

Grafica 07/09 12/09

Limpieza final 11/09 18/09

Terminaciones y ajustes 13/09 18/09

Entrega provisoria piso 2º 18/09

Entrega Provisoria ETAPA 2 (16 septiembre) 18/09

