

Fecha Reporte	26/10/2018
Proyecto	ALIX PARTNERS - Nuevas oficinas
Ubicación	Av. Corrientes 1750 piso 11
Contacto Cliente:	Sebastián Blaustein

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las nuevas oficinas cuentan con un open office con 18 puestos operativos , area de coffe y cocina, 2 áreas colaborativas, 1 sala de reunion para 4 personas ,1 sala de reunión para 6 personas, 1 laboratorio y baños existentes.-

FOTOS Y DESCRIPCION



ACCESO DE OBRA + CARTELERIA



CANALIZACION DE ILUMINACION + ARMADO DE ESTRUCTURA DE CIELORRASO DESMONTABLE



ARMADO DE CAJON CORTINERO + ESTRUCTURA DE CIELORRASO DESMONTABLE



CAÑERÍAS VACÍAS EN TABIQUES DE DURLOCK + EMPLAQUE DE UNA CARA




CABLEADO DE ILUMINACIÓN EN CIELORRASO



ARMADO DE TABIQUES + REFUERZOS DE MADERA EN CARPINTERÍAS



ARMADO DE CIELORRASO DESMONTABLE Y JUNTA TOMADA DURLOCK

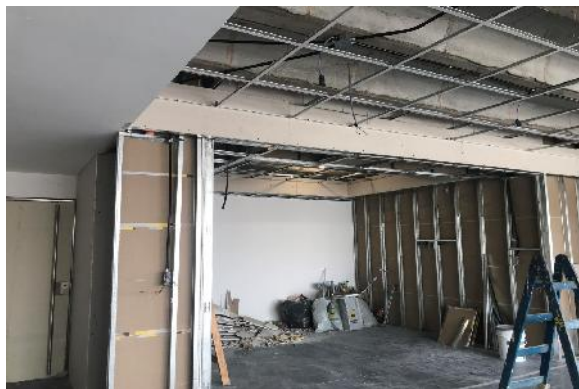

ARMADO DE TABIQUES Y CIELORRASO DE DURLOCK



CAÑERÍA VACÍA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS + CABLEADO DE ILUMINACION

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Canalización y cableado de iluminación
2	Canalización y cableado de tomas de servicio
3	Canalización de termostatos
4	Armado de estructura cieloraso y tabiques + refuerzos de madera
5	Emplaque de una cara durlock
6	Masillado en una cara durlock
7	Replanteo de instalación de AA
8	SE SUGIERE COMEZAR CON LAS PRUEBAS DE EQUIPOS DE AIRE EXISTENTES Y COMPLETAR LA INSTALACION CON SUS TERMOSTATOS.

REPORTE SEMANAL



INFORME 01



TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Colocación de aislación acústica	Contract
2	Canalización de detección de incendio	Contract
3	Medición de cortinas	Contract
4	Colocación de refuerzos de madera	Contract
5	Cierre de tabiques 2 placa	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	SOLICITUD DE NUEVO MEDIDOR	18/10/2018	Se sugiere iniciar trámite de Medidor para poder llegar a probar en tiempo las instalaciones	ALIX PARTNERS
2	DEFINICION DE SILLAS ALTAS Y OPERATIVAS	02/10/2018	Se deben seleccionar las sillas por su tiempo de entrega de 50 días	ALIX PARTNERS
3	CALADOS CAJAS NYTEC + PORTAMONITOR	02/10/2018	Contract pasara presupuesto de calados en mesas y portamonitor Hafele	CONTRACT
4	REUNION CON PERSONAL DE CCTV + C ACCESO	30/10/2018	Definición con el proveedor de cctv y control de acceso	ALIX PARTNERS - CONTRACT
5	MODELO DE DESTRUCTORA DE PAPEL	02/10/2018	Alix debe presentar el modelo de la destructora de papel para comenzar con los muebles	ALIX PARTNERS
6	TOMAS MULTINORMAS	26/10/2018	En la proxima reunion se hablara del requerimiento de tomas universales.	ALIX PARTNERS/CONTRACT
7	LOGOS Y GRAFICAS DEFINIR	10/10/2018	Definir vinilos. Grafica y lugar donde se coloca el cartel del piso 12	ALIX PARTNERS
8	DEFINICIONES EN COFFEE	02/10/2018	Ver definiciones de mesadas y lavavajillas	ALIX PARTNERS

AVANCE DE OBRA

