

REPORTE SEMANAL



INFORME 04



Fecha Reporte	16/11/2018
Proyecto	ALIX PARTNERS - Nuevas oficinas
Ubicación	Av. Corrientes 1750 piso 11
Contacto Cliente:	Sebastian Blaustein

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las nuevas oficinas cuentan con un open office con 18 puestos operativos , area de coffe y cocina, 2 áreas colaborativas, 1 sala de reunion para 4 personas ,1 sala de reunión para 6 personass, 1 laboratorio y baños existentes.-

STATUS PROYECTO


FOTOS Y DESCRIPCION




PREPARACION DE TABIQUES




PREPARACION DE TABIQUES

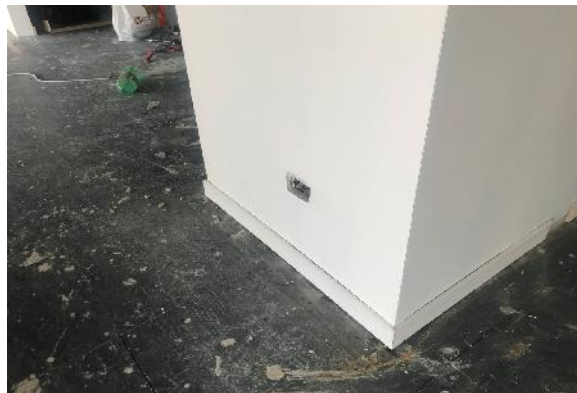



PREPARACION DE TABIQUES + COLOCACION DE ZOCALOS

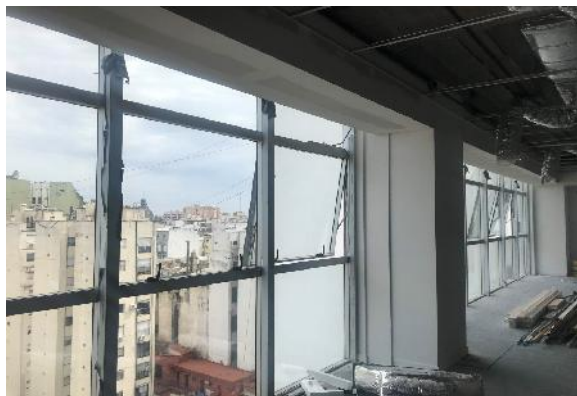



PREPARACION DE TABIQUES Y CIELORRASOS

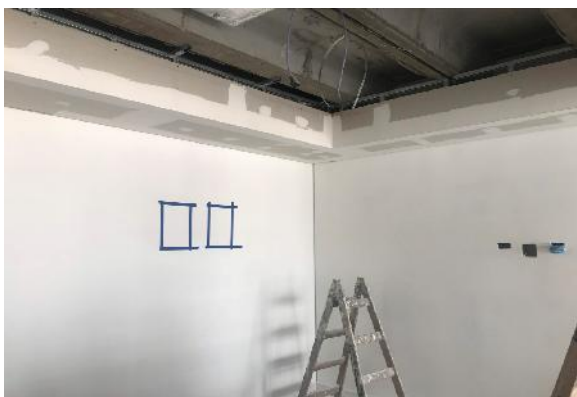

PREPARACION DE TABIQUES Y CIELORRASOS

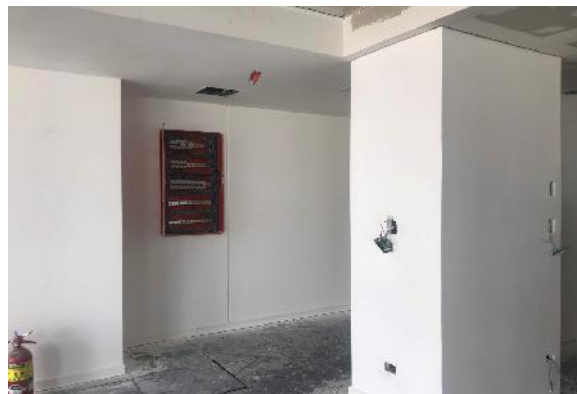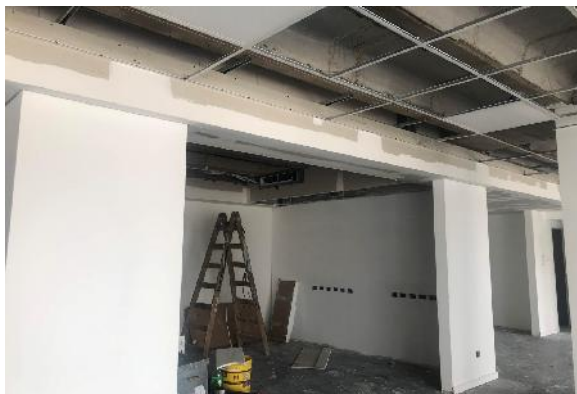

PREPARACION DE TABIQUES Y CIELORRASOS

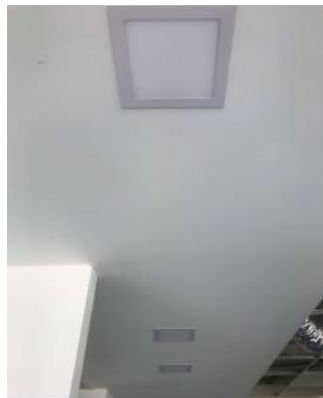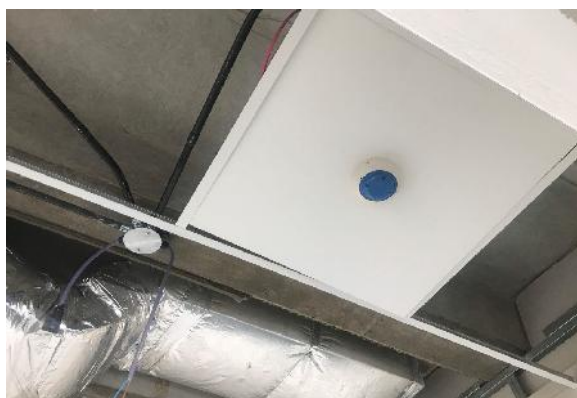

COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION + COLOCACION DE DETECTORES DE INCENDIO



COLOCACION DE EQUIPOS Y CONDUCTOS DE AA



COLOCACION DE EQUIPOS Y CONDUCTOS DE AA



COLOCACION DE CONDENSADORA EN TERRAZA



COLOCACION DE CONDENSADORA EN TERRAZA

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Calados en piso tecnico para cableado de puestos
2	Cableado de tensión y cableado estructurado
3	Preparación de tabiques para pintar
4	Colocación de equipos de AA
5	Colocación de zocalos
6	Masillado en una cara durlock
7	Colocación de conductos de AA
8	SE COMENZARON LAS TAREAS DE REVISION DE EQUIPOS DE AA EXISTENTES - SE PIDE UN INFORME FINAL DE LA INSTALACION

REPORTE SEMANAL



INFORME 04



TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Preparación de tabiques para pintar	Contract
2	Preparación de cielorrasos para pintar	Contract
3	Drenajes de equipos de AA	Contract
4	Muestrar de colores	Contract
5	Instalación sanitaria de agua caliente	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	SOLICITUD DE NUEVO MEDIDOR	18/10/2018	Se sugiere iniciar trámite de Medidor para poder llegar a probar en tiempo las instalaciones - Alix llamará al gestor Ruben Katz - Guillermo Pintos envío email a Alix con datos del negocio	ALIX PARTNERS
2	DEFINICION DE SILLAS ALTAS Y OPERATIVAS	02/10/2018	Se deben elegir las sillas por su tiempo de entrega de 50 días. Las comparará Alix	ALIX PARTNERS
3	CALADOS CAJAS NYTEC + PORTAMONITOR	02/10/2018	Contract pasara presupuesto de calados en mesas y portamonitor Hafele - DEFINIR PARA PODER COMPRAR. Se entregará portamonitor en piso 12 - Contract recomienda que nytec realice los calados de las cajas e mesas.	CONTRACT
4	REUNION CON PERSONAL DE CCTV + C ACCESO + AP	30/10/2018	Las camaras y ap son POE . Contract se reunirá con proveedor en obra. Se aguarda plano del proveedor. Chequeado en obra las canalizaciones.	ALIX PARTNERS - CONTRACT
5	MODELO DE DESTRUCORA DE PAPEL	02/10/2018	Alix presento el modelo de la destructora de papel para comenzar con los muebles, se ajustara el plano del muebel a esa medida. Definir altura de la destructora de papel. Alix definio colocar la mas alta	ALIX PARTNERS - CONTRACT
6	TOMAS MULTINORMAS	26/10/2018	Contract revisara la manera de poder colocarlos en cajas de muebles operativos - 6 y 8 bastidores. Se aprueban 6 bastidores por puestos con tomas normales y multinormas. SE	ALIX PARTNERS
7	LOGOS Y GRAFICAS DEFINIR	10/10/2018	Definir vinilos. Grafica y lugar donde se coloca el cartel del piso 12. Alix confirma que no se colocara logo con refuerzos en pared.	ALIX PARTNERS

AVANCE DE OBRA

