


Fecha Reporte	07/12/2018
Proyecto	ALIX PARTNERS - Nuevas oficinas
Ubicación	Av. Corrientes 1750 piso 11
Contacto Cliente:	Sebastian Blaustein

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las nuevas oficinas cuentan con un open office con 18 puestos operativos , area de coffe y cocina, 2 áreas colaborativas, 1 sala de reunion para 4 personas ,1 sala de reunión para 6 personas, 1 laboratorio y baños existentes.-

STATUS PROYECTO


FOTOS Y DESCRIPCION

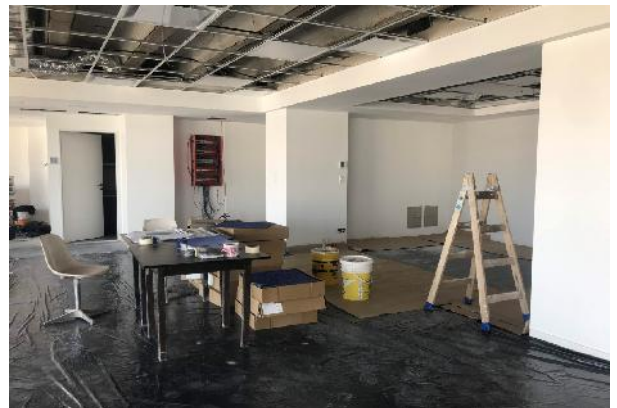

COLOCACION DE ALFOMBRA



PREPARACION DE TABIQUES + COLOCACION DE ZOCALOS + ALFOMBRA

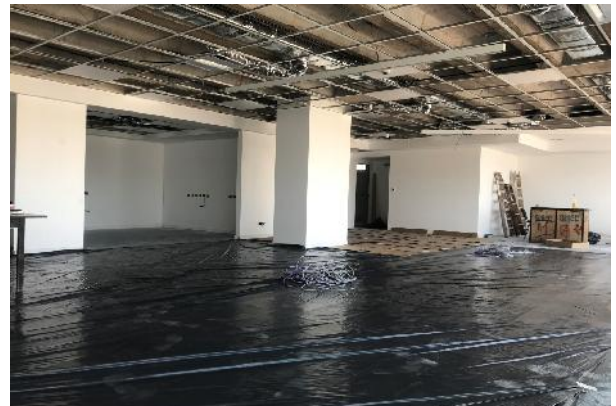

COLOCACION DE ALFOMBRA



COLOCACION DE ALFOMBRA



PREPARACION DE TABIQUES Y CIELORRASOS



COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION + CRISTALES BLANCOS

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Preparación de cielorrasos para pintar
2	Cableado de tensión y cableado estructurado
3	Preparación de tabiques para pintar
4	Drenajes de equipos de AA y colocacion de termostatos
5	Colocaciòn de zocalos + alfombra
6	Armado de rack
7	SE COMENZARON LAS TAREAS DE REVISION DE EQUIPOS DE AA EXISTENTES - SE PIDE UN INFORME FINAL DE LA INSTALACION

REPORTE SEMANAL



INFORME 06



TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Vinculacion fibra piso 11 y 12 faltan los utp	Contract
2	Pintura en tabiques y cielorrasos	Contract
3	Alfombrado y piso vinílico	Contract
4	Muestra de colores . Definicion	Contract
5	Instalación sanitaria de agua caliente + lavavajillas	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	SOLICITUD DE NUEVO MEDIDOR	18/10/2018	Se sugiere iniciar trámite de Medidor para poder llegar a probar en tiempo las instalaciones - Alix llamará al gestor Ruben Katz - Guillermo Pintos envió email a Alix con datos del proceso. Nos reunimos en obra y el gestor recomienda colocar un medidor T2 solo para el piso 11 ya que no hay espacio físico para realizar pilar para un T3. SE INICIO EL TRAMITE	ALIX PARTNERS
2	CALADOS CAJAS NYTEC + PORTAMONITOR	02/10/2018	Contract pasara presupuesto de calados en mesas y portamonitor Hafele - DEFINIR PARA PODER COMPRAR. Se entregará portamonitor en piso 12 - Contract recomienda que nytec realice los calados de las cajas e mesas.	CONTRACT
3	REUNION CON PERSONAL DE CCTV + C ACCESO + AP	30/10/2018	Las camaras y ap son POE . Contract se reunirá con proveedor en obra. Se aguarda plano del proveedor. Chequeado en obra las canalizaciones. SE AGUARDA PLANO DEL PROVEEDOR. Reunión en obra viernes 14 a las 10 hs.-	ALIX PARTNERS - CONTRACT
4	TOMAS MULTINORMAS	26/10/2018	Contract revisara la manera de poder colocarlos en cajas de muebles operativos - 6 y 8 bastidores. Se aprueban 6 bastidores por puestos con tomas normales y multinormas. SE adjunto plano de puestos.	ALIX PARTNERS
5	DEFINICIONES EN COFFEE	02/10/2018	Ver definiciones de mesadas y lavavajillas - Contract presentara plano. Contract presentara presupuesto adicional. DEFINIR LAVAVAJILLA MUEBLE NUEVO. Alix compra el lavavajillas de 6 cubiertos y se entrega en obra la semana proxima.	ALIX PARTNERS

AVANCE DE OBRA

