


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	17 jun '13			
								D	L	M	X
1		Inicio	86 días	jue 27/06/13	jue 03/10/13						
2		Aprobación del presupuesto	1 día	jue 27/06/13	vie 28/06/13		Autorización de ingreso al ed				
3		Coordinación de inicio de obra	4 días	vie 28/06/13	mar 02/07/13	2					
4		ART / SeH	5 días	lun 01/07/13	dom 07/07/13	3FC-1 día	Pedido de documentación a				
5		Inicio de obra	1 día	dom 07/07/13	lun 08/07/13	4	Replanteos / Inicio de trabajc				
6		Demoliciones	30 días	lun 08/07/13	dom 11/08/13						
7		Total del piso	30 días	lun 08/07/13	dom 11/08/13	5	Horario nocturno y fines de s				
8		Albañilería	17 días	jue 18/07/13	mié 07/08/13						
9		Canalizaciones Grales	10 días	jue 18/07/13	mar 30/07/13	7FC-21 días					
10		Contrapisos + carpetas	10 días	mar 23/07/13	sáb 03/08/13	9FC-6 días					
11		Revoques	7 días	mar 30/07/13	mié 07/08/13	10FC-4 días					
12		instalaciones/Canalizaciones Sanitarias	9 días	sáb 03/08/13	mar 13/08/13						
13		Tendido de cañerías y prueba hidráulica	6 días	sáb 03/08/13	sáb 10/08/13	10					
14		Tapado	3 días	sáb 10/08/13	mar 13/08/13	13					
15		instalaciones/Canalizaciones Electricas	16 días	dom 11/08/13	jue 29/08/13						
16		Canalizaciones	7 días	dom 11/08/13	lun 19/08/13	7					
17		Cableado	9 días	lun 19/08/13	jue 29/08/13	16					
18		instalaciones/Canalizaciones Baja Tensión	35 días	vie 26/07/13	mié 04/09/13						
19		Canalizaciones	10 días	vie 26/07/13	mié 07/08/13	7FC-14 días					
20		Cableado + Armado de racks y certificaciones	25 días	mié 07/08/13	mié 04/09/13	19					
21		instalaciones/Canalizaciones Seguridad	9 días	vie 16/08/13	lun 26/08/13						
22		Canalizaciones	4 días	vie 16/08/13	mar 20/08/13	16FC-3 días					
23		Cableado	5 días	mar 20/08/13	lun 26/08/13	22					
24		instalaciones/Canalizaciones Aire acondicionado	34 días	lun 29/07/13	jue 05/09/13						
25		Fabricación de ductos	10 días	lun 29/07/13	vie 09/08/13	7FC-12 días					
26		Montaje de conductos	5 días	vie 09/08/13	jue 15/08/13	25					
27		Entrega de los equipos	15 días	dom 11/08/13	mié 28/08/13	7;8					
28		Montaje con las cañerías de cobre: 3 días.	3 días	mié 28/08/13	dom 01/09/13	27					
29		Montaje de equipos, Puesta en marcha y regulación	4 días	dom 01/09/13	jue 05/09/13	28					
30		Tabiquería	8 días	dom 11/08/13	mar 20/08/13						

Proyecto: Project inicial obra prov
Fecha: jue 21/11/13

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto




Fecha límite



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	17 jun '13			
								D	L	M	X
31		Estructura + Emplacado	4 días	dom 11/08/13	vie 16/08/13	7					
32		Emplacado + terminaciones	6 días	mié 14/08/13	mar 20/08/13	31FC-2 días					
33		Cielorrasos	7 días	vie 16/08/13	sáb 24/08/13						
34		Continuos, cajones, gargantas	7 días	vie 16/08/13	sáb 24/08/13	31					
35		Pintura	16 días	mar 20/08/13	dom 08/09/13						
36		Cielorrasos/ Losas	8 días	sáb 24/08/13	lun 02/09/13	34					
37		Tabiquerías	16 días	mar 20/08/13	dom 08/09/13	32					
38		Revestimientos	6 días	mar 20/08/13	mar 27/08/13						
39		Colocación ceramicos/Porcellanato	6 días	mar 20/08/13	mar 27/08/13	32	Piso / pared				
40		Artefactos Iluminación	5 días	lun 02/09/13	dom 08/09/13						
41		Colocación de artefactos	5 días	lun 02/09/13	dom 08/09/13	36;34					
42		Frente de oficinas	25 días	vie 16/08/13	vie 13/09/13						
43		Replanteo	1 día	vie 16/08/13	sáb 17/08/13	31					
44		Colocación	4 días	lun 09/09/13	vie 13/09/13	43FC+20 días					
45		Carpinterías	3 días	dom 08/09/13	mié 11/09/13						
46		Colocación	3 días	dom 08/09/13	mié 11/09/13	32;37					
47		Solados	14 días	mar 03/09/13	jue 19/09/13						
48		Colocación	14 días	mar 03/09/13	jue 19/09/13	36FC-2 días;37FC	Alfombras, cerámicos, made				
49		Artefactos sanitarios	4 días	mar 27/08/13	dom 01/09/13						
50		Colocación, empastinado, terminaciones	4 días	mar 27/08/13	dom 01/09/13	39					
51		Grafica	26 días	sáb 17/08/13	lun 16/09/13						
52		Replanteo	1 día	sáb 17/08/13	dom 18/08/13	43					
53		Colocación	2 días	vie 13/09/13	lun 16/09/13	44					
54		Cortinas	19 días	vie 16/08/13	vie 06/09/13						
55		Replanteo	1 día	vie 16/08/13	sáb 17/08/13	31					
56		Colocación	3 días	mar 03/09/13	vie 06/09/13	55FC+15 días					
57		Mobiliario	16 días	lun 09/09/13	vie 27/09/13						
58		Armado	16 días	lun 09/09/13	vie 27/09/13	48FC-9 días					
59		Limpieza	76 días	lun 08/07/13	jue 03/10/13						
60		Diaria	70 días	lun 08/07/13	jue 26/09/13	5					

Proyecto: Proyect inicial obra prov
Fecha: jue 21/11/13

Tarea




Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto



Fecha límite



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	17 jun '13			
								D	L	M	X
61		Final	6 días	jue 26/09/13	jue 03/10/13	60					

Proyecto: Project inicial obra prov

Fecha: jue 21/11/13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

ago '13							19 ago '13							26 ago '13							02 sep '13							09 sep '13							16 sep '13							23 sep '13							30 sep '13													
M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D	

orario nocturno y fines de semana[113%]

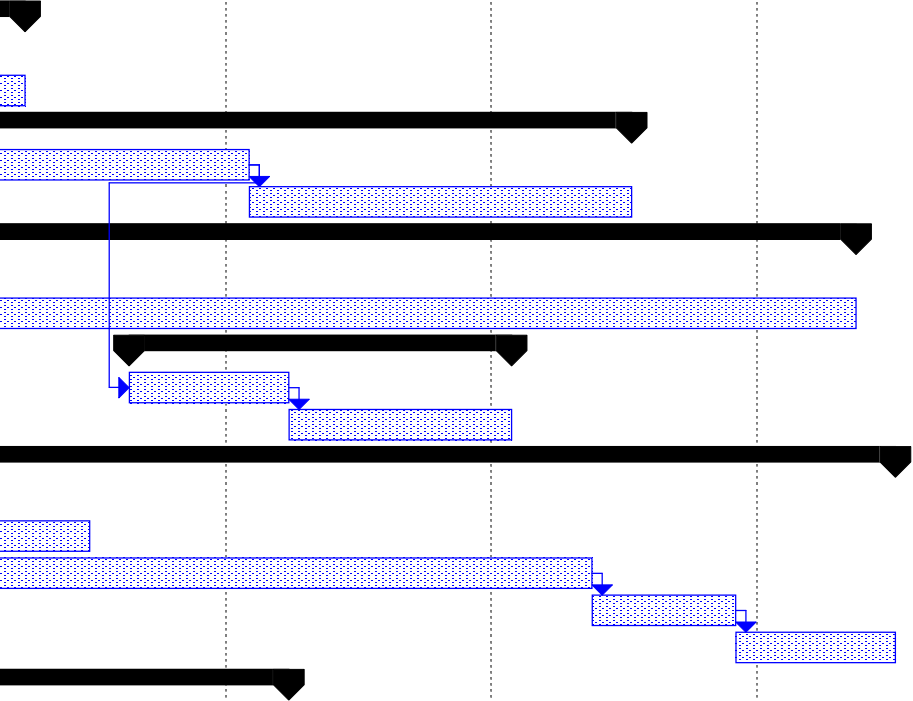

Proyecto: Project inicial obra prov Fecha: jue 21/11/13	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

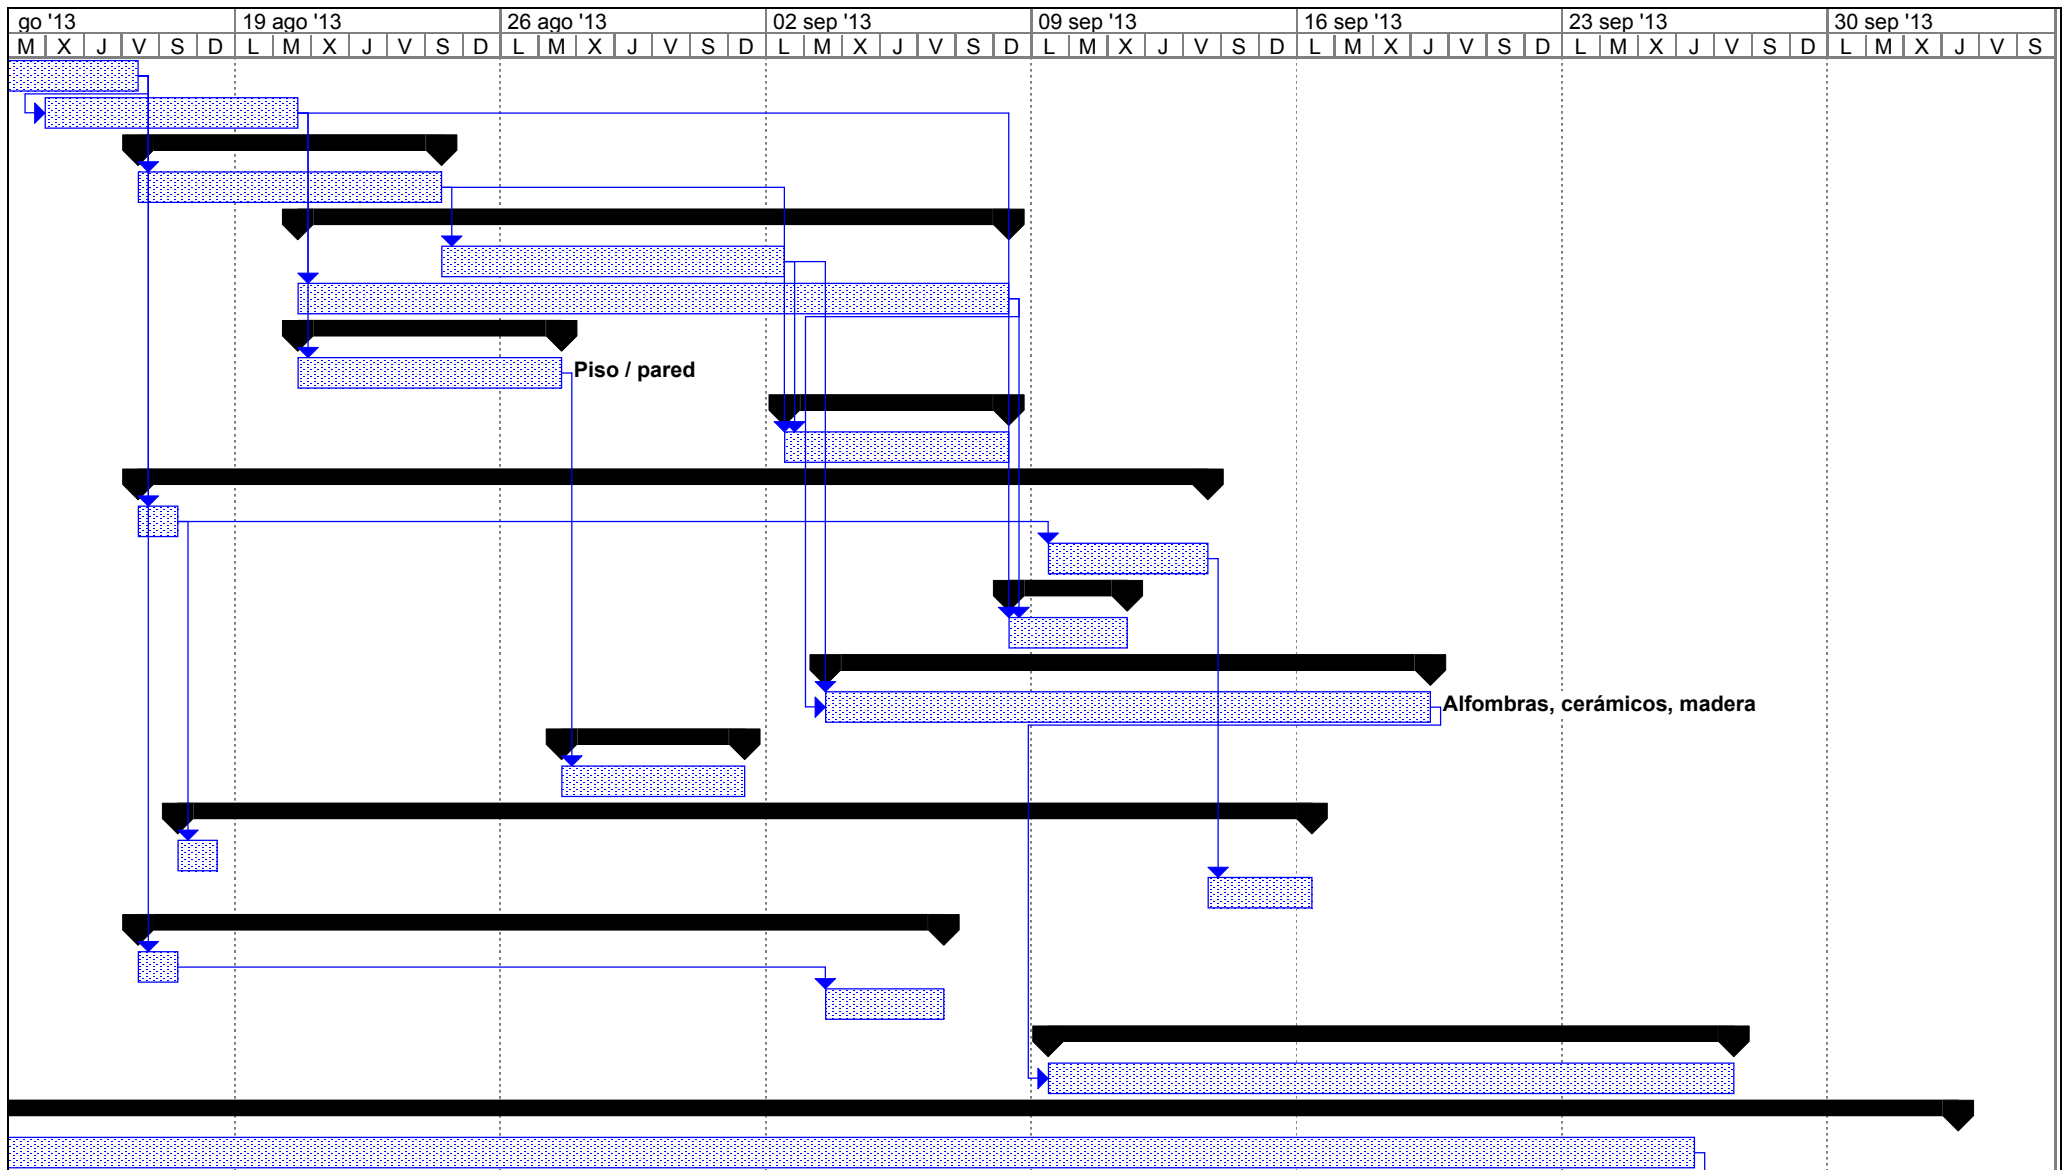

Proyecto: Project inicial obra prov
 Fecha: jue 21/11/13

Tarea
 División
 Progreso

Hito
 Resumen
 Resumen del proyecto

Tareas externas
 Hito externo
 Fecha límite

go '13							19 ago '13							26 ago '13							02 sep '13							09 sep '13							16 sep '13							23 sep '13							30 sep '13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Proyecto: Project inicial obra prov

Fecha: jue 21/11/13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
