


INFORME 2		REPORTE INICIAL DE OBRA		contract workplaces	
Fecha Reporte 26/08/2016				La Fármaco ARGENTINA	
PROYECTO		LA FARMACO			
UBICACIÓN		Arias 1639 - Piso 5 - CABA			
Contacto Cliente:		Nicolas Fernandez Cel: +54 9 011 4726 5100			
Superficie		500 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Nuevas oficinas.					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
  					
Tabiquería y Cielorraso: estructura para tabiquería y cielorraso durlock.					
   					
Piso Técnico: instalación y nivelación. Instalación Eléctrica: cañerías y bocas de iluminación en cielorraso. Canalizaciones por bandejas bajo piso técnico.					
  					
Instalacion Termomecanica: equipos existentes, interferencias con tabiqueria.					
    					
Instalación de desagüe y alimentación de agua fría y caliente para sanitario. Pase en losa (no se cortan hierros).					
3) TEMAS CRITICOS					
Item	Detalle				Responsable
	Instalación Termomecánica: pendiente de entrega de planos para su aprobación.				Geoclima
	Instalacion Cableado Estructurado: no se definen modelos de equipos de WiFi, portero, telefonía.				La Fármaco
4) HITOS Y DEADLINES (Open Space)					
Status	Rubros	Inicio	Final	Comentarios	Responsable
	Inicio de Obra	12/08/2016	12/08/2016	100%	
	Alfombra, compra	17/08/2016	18/08/2016	100%	
	Piso de madera, compra	12/08/2016	--	No se compra por demoras en colocación de piso técnico.	Muresco
	Tabiquería, replanteo	22/08/2016	23/08/2016	75%	
	Tabiquería, pase de instalaciones-Cierre	29/08/2016			
	Tabiquería, traspaso a pintura	05/09/2016			
	Mobiliario de línea	12/09/2016			
	Cielorraso, cierre cielorraso continuo	14/09/2016			
	Cielorraso, cierre cielorraso desmontable	14/09/2016			
	Piso Técnico, nivelación final	29/08/2016			
	Cristales, medición	31/08/2016			
	Carpintería de madera, medición	31/08/2016	25/08/2016	Se toman medidas de lo ejecutado, resto se respeta carpintero	Berrone
	Mesada de baño, medición	31/08/2016			
	Artefactos de iluminación, provisión	07/09/2016			
	Data Center, recepción	13/09/2016			
	AA, prueba de estanqueidad	13/09/2016			

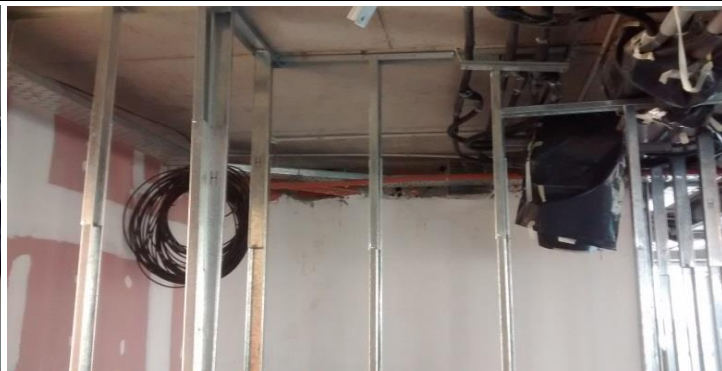
