

R E P O R T E S E M A N A L

INFORME 5

contract
workplaces


Fecha Reporte	22/11/2016
Proyecto	TUTEUR PB
Ubicación	Encarnacion Ezcurra 365 PB
Contacto Cliente:	Alberdo Bordigoni

DESCRIPCION DEL PROYECTO


Obra Remodelacion PB
El proyecto contempla 220m2

AVANCE HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE

FOTOS Y DESCRIPCION

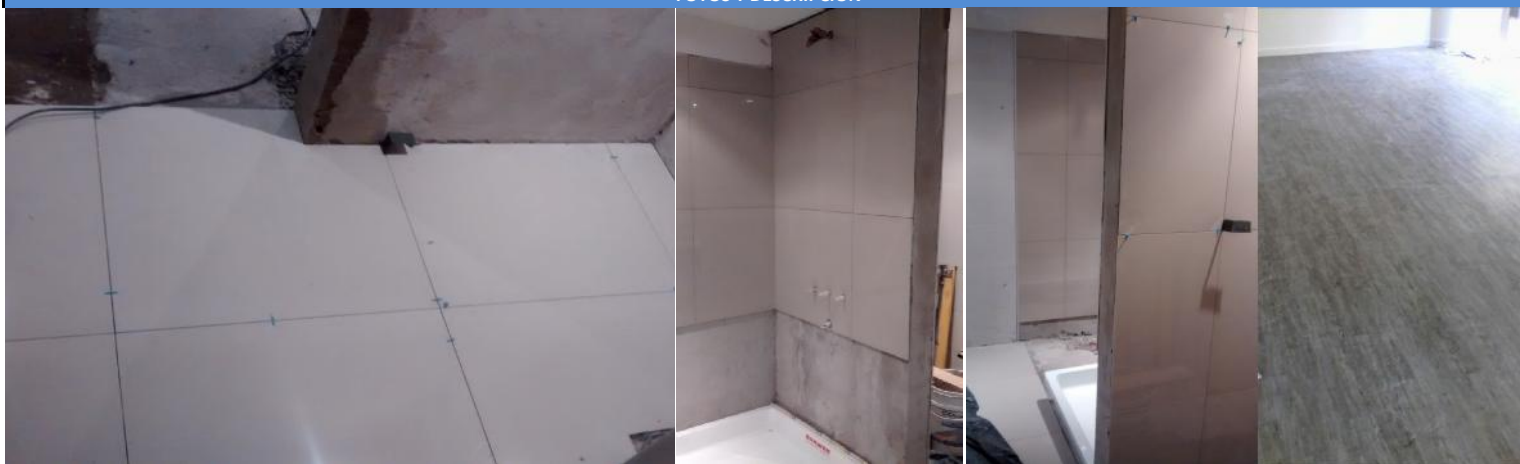

Pisos y revestimientos

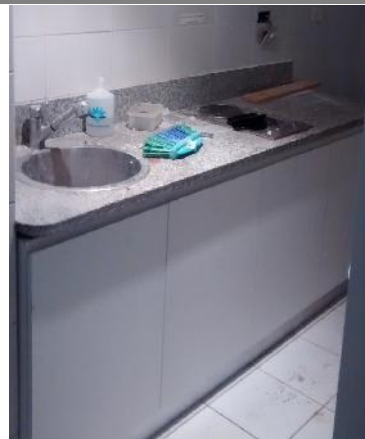


Muebles a medida



Colocación de luminarias



Colocacion rociadores

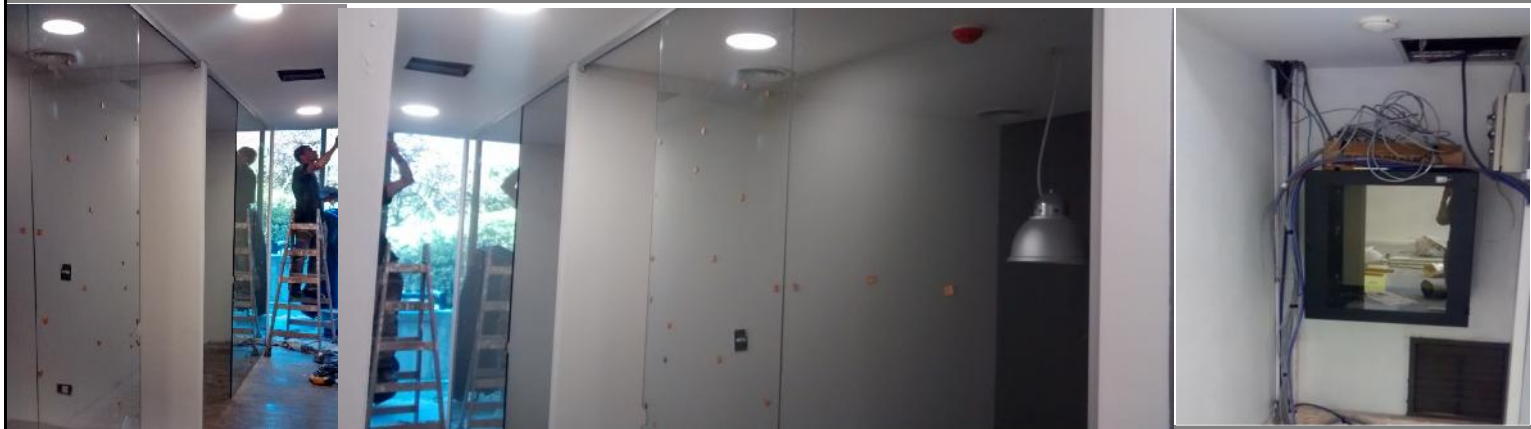

Colocacion de cristales - Armado de Rack

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item Status	Rubros	Detalle		Comentarios	Responsable
		inicio	final		
	colocacion de alfombra	30-nov	30-nov		
	mesada coffee	24-nov	24-nov		
	colocacion de artefacto de iluminacion	28-nov	28-nov		
	grafica	03-dic	03-dic		
	muebles especiales	24-nov	26-nov		
	mapara baños	03-dic	03-dic		

R E P O R T E S E M A N A L

INFORME 5



baño privado	24-nov	26-nov
pintura final	26-nov	29-nov
tareas electricas	23-nov	01-dic

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable

AVANCE DE OBRA

SEMANA	PREVISTO	REAL
0	0%	0%
1	14%	5%
2	26%	13%
3	37%	24%
4	79%	65%
5	93%	80%
6	100%	0%

