



Fecha Reporte	07/01/2016
Proyecto	ADP
Ubicación	C. Pellegrini 719 pisos 2 y 3
Contacto Cliente:	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nuevas oficinas para ADP. Edificio entre medianeras a estrenar. Dos pisos divisibles unificados, superficie util 880m2, con cielorraso completo y piso tecnico. El proyecto es de Open Space, abierto hacia el frente con divisones de durlock contra la medianera para privados y salas. Piso 2: Open Space, sala de training, sala de reunion, 2 phone booth, Data center y cafeteria. Piso 3: Recepcion, presidencia, sala de directorio, salas de reunión, 2 phone booth.


FOTOS Y DESCRIPCION DE TAREAS REALIZADAS - Pisos 2° y 3°

02-01-17, DIA 14

Replanteo de Bocas en tabiques divisores (Dalux). ARSEC Ausente.

03-01-17, DIA 15



SIN ACTIVIDAD. Contratistas ARSEC y DALUX ausentes

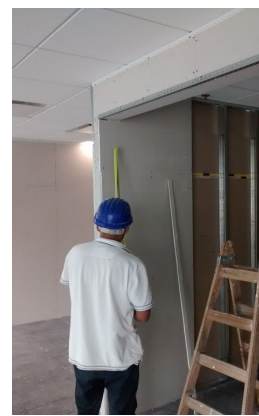

04-01-17, DIA 16

Piso 3- Emplacado de 1° cara (Arsec). Dalux ausente.

Piso 2- Colocacion de aislación acustica, emplacado de 2° cara y colocacion de cantoneras en vanos. (Arsec).

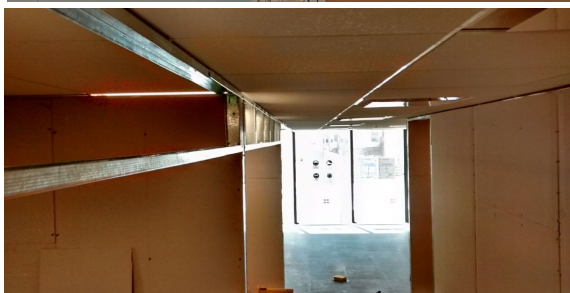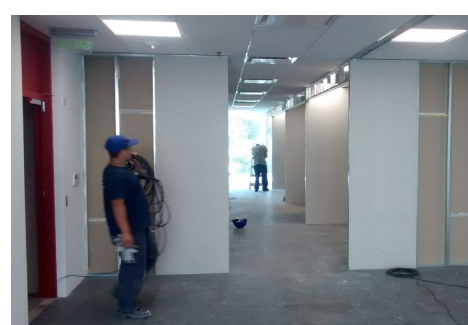

05-01-17, DIA 17

Piso 3- Armado de estructura de dinteles. (Arsec)

Piso 2- Instalacion de cajas y conductos electricos en tabiques divisores. Instalacion de bandejas pasacables bajo piso tecnico. (Dalux)



Piso 3- Emplacado de dinteles y vanos. (Arsec)




06-01-17, DIA 18
Piso 2 y 3- Demolicion de division en paso de servicio.
(Corel)



Piso 3- Instalacion de bandejas pasacable bajo piso tecnico.



Piso 3- Armado de dinteles y emplacado de vanos para medicion de vidrios. (Arsec)

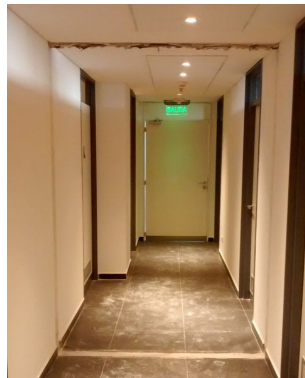

07-01-17, DIA 19
Pisos 2 y 3- Retiro de escombros. (Corel)



Piso 3- Canalizaciones para cableado bajo piso tecnico. (Dalux)
