

FECHA 10/02/16

LUGAR CONTRACT

CLIENTE GBT

OBRA NUEVAS OFICINAS – PISO 20, WTC FZ

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Diego Lepore	GBT	diego.lepore@grupobiotoscana.com
Carolina Capouyá	CONTRACT	ccapouya@contract.com.uy

 1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
Requisitos IT Cotizar	UPS 5-6 KVA monofásica Rack 42U – 600 x 1000 de profundidad Patch cords de 5 pies para el rack
Requerimientos para el rack	Ventiladores y turbinas en el rack Mueble con puertas caladas El rack debe contar con rueditas Las instalaciones sanitarias deben estar lo más alejadas posible del rack.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

FECHA 10/02/16

LUGAR CONTRACT

CLIENTE GBT

OBRA NUEVAS OFICINAS – PISO 20, WTC FZ

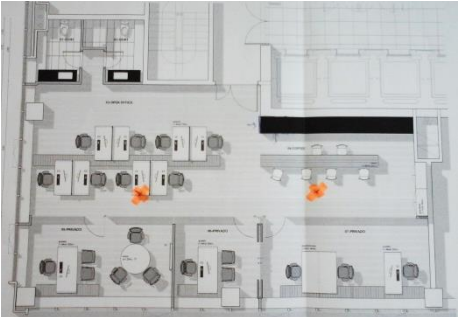
INTEGRANTES

EMPRESA

EMAIL

Diego Lepore	GBT	diego.lepore@grupobiotoscana.com
Carolina Capouyá	CONTRACT	ccapouya@contract.com.uy

● **1- TEMA/S DEFINIDOS**

TEMA	DEFINIDO
Otras indicaciones	Se dejará previsión para dos access points POE de acuerdo a ubicación indicada en el plano. Se ubicación puede variar dado que se deber verificar la interferencia con el diseño del cielorraso. 

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.
