

RELEVAMIENTO

TUTEUR

Relevamiento al 20-10-16

contract
workplaces

Fecha Reporte	20/10/2015
Proyecto	REMODELACION PB
Ubicación	Encarnación Ezcurra 365, PB
Contacto Cliente:	Alberto Bordigoni

DESCRIPCION

Relevamiento de PB

FOTOS Y DESCRIPCION



Fancolis: Falta reja de terminación en uno de ellos, en líneas generales los que sí poseen se encuentran despintadas y flojas.



Faltan rejillas en cielorraso, falta ajuste y pintura de las existentes.



Artefactos de iluminación a reutilizar manchados con pintura.

RELEVAMIENTO

TUTEUR

Relevamiento al 20-10-16

contract
workplaces

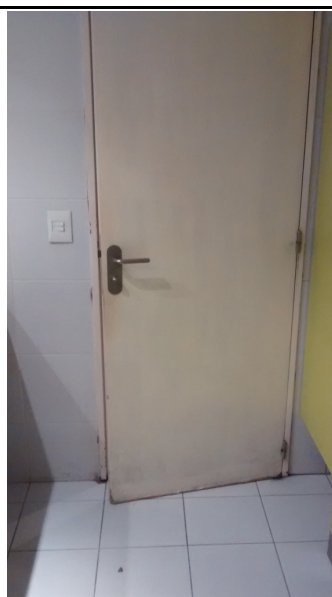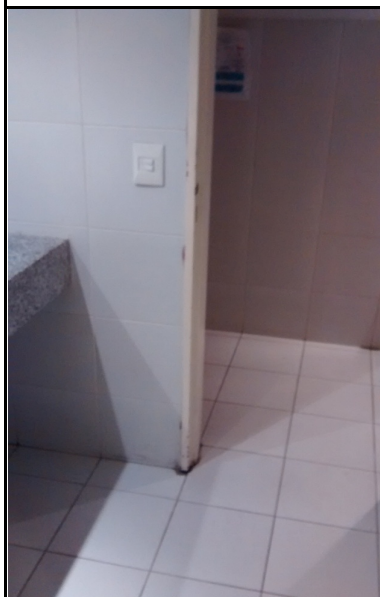

Puertas de baño con óxido, cerradura floja. Hoja hinchandas por humedad.




Se observa una tapa suelta de inodoro y la otra en mal estado.

óxido en mesada de cuarto de limpieza.



Cartel de emergencia no funciona.



Cerradura de acceso principal en mal estado, falta completar herraje

RELEVAMIENTO		
TUTEUR Relevamiento al 20-10-16 		
RESUMEN		
It	Local/Rubro	Comentarios
1,00	LOCALES SANITARIOS	Falta 1 tapa de válvula de pared Puertas en estado de deterioro óxido en mesada tapas de inodoros en estado de deterioro cerradura de acceso principal al sector, floja.
2,00	GENERAL	Falta de reja de terminacion en fancoil , ajuste y pintura de las existentes Se observa humedad en paredes 1 cartel de salida no se encuentra en funcionamiento No hay matafuegos Artefactos existentes de iluminación a reutilizar, se encuentran manchados con pintura
